

Inhoudsopgave

220714 crm_department_output_11174	3
220718 20220718 Tijdregistraties 21-084 Dantumadiel BVC en ondersteuning 2021-2022 (01-03-2022 tm 30-06-2022)	8
220718 20220718 Tijdregistraties NEF bvc en ondersteuning (2021-12-07 tm 2022-06-30)	13
220718 Diverse ondersteuning boombeheer	17
220722 22086 Dantumadiel ondersteuning boombeheer (1 maart tm 30 juni 2022)	18
220722 Factuur uitgevoerde werkzaamheden Helder groen advies	19
220808 Afronden deelopdrachten	20
220831 20220706123647058	22
220831 20220715140307846	27
220831 FW_ Afronden deelopdrachten	30
220907 20220906 Verslag BV03 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel (Frisia)	34
220907 Verslag BV03 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024	36
220915 2e Termijn Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024	38
220915 RE_ 2e Termijn Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024	44
220927 20220927132212416	47
220927 RE_ termijn Dantemadiel	48
221005 20221005082802793	50
221005 FW_ Aangepaste mail Dantumadiel	57
221010 20221010 Termijnstaat 2 ondertekend	59
221010 RE_ Aangepaste mail Dantumadiel	66
221213 20221213 Termijnstaat 3 ondertekend	68
230109 20221222 Verslag BV04 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel (Frisia)	74
230109 FW_ Verslag BV 4_ deelopdracht gebied West_ Digitree	77
230119 RE_ Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023	81
230214 20230314093917320	83
230214 FW_ Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023	87
230214 image003	92
230221 4e Termijn Gemeente Dantumadiel_ onderhoud bomen 2022-2024	93
230222 20230222 Verslag BV05 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel (Frisia)	95
230222 Verslag BV 5	98
230309 20230309 Termijnstaat ondertekend	99
230309 RE_ Termijnstaat 1502_22 Gem Dantumadiel onderhoud bomen 2022-2024	105
230314 getekend exemplaar notulen bouwvergadering	107
230413 FW_ Week update t_m week 14	108
230420 20230420132934408	120
230420 getekend exemplaar bouwvergadering	124
230428 20230428 Termijnstaat 5 ondertekend	125
230428 RE_ 5e termijn onderhoud bomen met bijlage	131
230612 veldbeoordeling uitgevoerd werk Frisia	133

230615 20230615084542924	134
230615 getekende notulen	136
230623 20230623 Termijnstaat 6 ondertekend	137
230623 RE_ 6e Termijn 1502_22 Gemeente Dantumadiel_ onderhoud bomen 2022-2024	143

FRISIA BERGUM

Pagina 1 van 5

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 13 juli 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		A	G	in termijn	tm termijn		
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)						
10	BEGELEIDINGSSNOEI						
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	5,00	V			
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	7,00	V			
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	3,00	V			
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V			
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V			
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V			
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	64,00	V			
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	5,00	V			
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V			
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	154,00	V			
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	159,00	V			
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	1,00	V			
11	ONDERHOUDSSNOEI						
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.						
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V			
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V			
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V			
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V			
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V			
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	2,00	V			
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)						
20	BEGELEIDINGSSNOEI						
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4,00	V	2,00	2,00	
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V	12,00	12,00	
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107,00	V	50,00	50,00	
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	104,00	V	80,00	80,00	
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	34,00	V	23,00	23,00	
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3,00	V			

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 2 van 5

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 13 juli 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		A	G	in termijn	tm termijn		
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	195,00	V	90,00	90,00	
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	248,00	V	93,00	93,00	
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	91,00	V	66,00	66,00	
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V	16,00	16,00	
21	ONDERHOUDSSNOEI						
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.						
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V	10,00	10,00	
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	14,00	V	12,00	12,00	
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	60,00	V	40,00	40,00	
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	141,00	V	112,00	112,00	
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	58,00	V	53,00	53,00	
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	9,00	V	9,00	9,00	
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)						
30	BEGELEIDINGSSNOEI						
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	2,00	V			
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	5,00	V			
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	1,00	V			
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	64,00	V			
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	199,00	V			
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	132,00	V			
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	94,00	V			
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	14,00	V			
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V			
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	253,00	V			
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	176,00	V			
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V			
31	ONDERHOUDSSNOEI						
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.						
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	4,00	V			
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	2,00	V			
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	24,00	V			
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	89,00	V			

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 3 van 5

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 13 juli 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
						in termijn	tm termijn		
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	114,00	V					
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	21,00	V					
4	REGISTRATIE 2022-2024								
40	OPNAME BOOMKENMERKEN								
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.								
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei).	st	4.029,00	V		668,00	668,00		[REDACTED]
5	WERK ALGEMENE AARD 2022-2024								
50	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA								
5010	Inventariseren flora en fauna verkennend								
501010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	V					
501020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V					
5011	Inventariseren flora en fauna soortspecifiek								
501110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	15,00	V					
501120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	15,00	V					
5012	Markeren flora- en faunaplaatsen								
501210	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V					
501220	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V					
6	VERKEERSMAATREGELEN 2022-2024								
60	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK								
6010	Toepassen verkeersmaatregelen								
601010	Toepassen afzetting (2022)	eur	600,00	N					
601020	Toepassen afzetting (2023)	eur	600,00	N		368,86	368,86		[REDACTED]
601030	Toepassen afzetting (2024)	eur	941,75	N					
61	VERKEERSREGELAAR								
6101	Bevoegde verkeersregelaars								
610110	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2022).	eur	500,00	N					
610120	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2023).	eur	500,00	N					
610130	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2024).	eur	500,00	N					
7	PRAKTIJKDAG								
70	PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS								
7010	Afstemming ETW's en ETT's								
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V					
8	INZETTEN 2022-2024								
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V					
	SUBTOTAAL								[REDACTED]

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 4 van 5

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 13 juli 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
910010	Aanvoerkosten	100,00	N		14,99	14,99	[REDACTED]	[REDACTED]
910020	Afvoerkosten	100,00	N		14,99	14,99	[REDACTED]	[REDACTED]
910030	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
910040	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
910050	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
919980	Overige eenmalige kosten	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
919990	Korting	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
929990	Uitvoeringskosten	975,00	N		146,14	146,14	[REDACTED]	[REDACTED]
939990	Algemene kosten	550,00	N		82,44	82,44	[REDACTED]	[REDACTED]
949990	Winst en risico	500,00	N		74,94	74,94	[REDACTED]	[REDACTED]
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	131,03	N				[REDACTED]	[REDACTED]
	SUBTOTAAL						[REDACTED]	[REDACTED]

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 5 van 5

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 13 juli 2022

AANNEMINGSSOM:	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM TOT TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN TOT TERMIJN	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN	€	
DEZE TERMIJN EXTRA DECLARATIES	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN EXTRA DECLARATIES T/M TERMIJN	€	
BTW % 21,00 IN TERMIJN		13.073,20 = €

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum : ____ / ____ / ____

Naam toezichthouder : _____

Handtekening toezichthouder : _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum : 13 / 07 / 2022

Naam uitvoerder : _____

Handtekening uitvoerder : _____

**Tijdregistraties 1 maart - 30 juni 20
21-084 Dantumadiel BVC en Ondersteur**

Datums	Uren	Naam
23-03-2022	0,25	[Redacted]
03-05-2022	1	[Redacted]
11-05-2022	4	[Redacted]
11-05-2022	2,5	[Redacted]
11-05-2022	1	[Redacted]
11-05-2022	1,5	[Redacted]
13-05-2022	1	[Redacted]
13-05-2022	0,5	[Redacted]
17-05-2022	2,75	[Redacted]
19-05-2022	1	[Redacted]
20-05-2022	8,5	[Redacted]
23-05-2022	3,75	[Redacted]
25-05-2022	0,5	[Redacted]
25-05-2022	0,25	[Redacted]
30-05-2022	0,5	[Redacted]
31-05-2022	0,25	[Redacted]
02-06-2022	0,5	[Redacted]
02-06-2022	1	[Redacted]
06-06-2022	0,25	[Redacted]
10-06-2022	0,5	[Redacted]
13-06-2022	0,5	[Redacted]
13-06-2022	1	[Redacted]
14-06-2022	3,5	[Redacted]
15-06-2022	0,25	[Redacted]
22-06-2022	0,5	[Redacted]
28-06-2022	5	[Redacted]
29-06-2022	0,5	[Redacted]
30-06-2022	1,25	[Redacted]
	44	

Taak

Bestekken

Directie toezicht

Directie toezicht

Overleggen

Bestandsbeheer

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Directie toezicht

Notitie
Controle inschrijfstaat
Opstellen agenda start overleg
Start overleg
Voor-, en startoverleg
Aanmaken deelopdracht 1, mail inlog aannemer
Uitwerken verslag start overleg
Maken communicatie voorstel en aanpassen verslag
Doornemen verslag, info digitree inzake gebruikerovereenkomst, mail aannemer inlog Digitree
Maken agenda, intekenlijst en presentatie praktijkdag
Doornemen pva en maken mail
Praktijkdag Damwoude
Uitwerken verslag praktijkdag, aanvullen app groep
Nalopen verslag Dantumadeel
Regelen certificaten ETW Dantumadiel, contact over voortgang
Check upload gegevens, mail praktijkdag
Voorbeeld weekrapport
Doornemen aangeleverde weekstaat en aangepaste planning, overleg met CK
Doornemen mail ivm planning en weekrapport
Bijwerken mail
Maken voorstel planning
Reactie vraag [REDACTED], linden Broeksterwald
Versturen stukken en maken planning
Rondgang uitgevoerd boomonderhoud Damwoude samen met [REDACTED], mail i.v.m. niet snoeien Amerika
Certificaten praktijkdag, contact [REDACTED]
Mail Pius
Vorbereiden controle termijn 1, veld controle, overleg met snoeiers, overleg met [REDACTED] over behoud of
Opstellen en mailen agenda
Mail bevindingen beoordeling termijn 1, uitzoeken gegevens

kap bomen uit opdracht aannemer.

Tijdregistraties 7 december 2021 - 30 juni 2022

Tijdregistraties voor het project: NEF BVC en ondersteuning 2021

Datums	Uren	Naam	Project
20-01-2022	0,5		NEF BVC en ondersteuning 2021
10-02-2022	7		NEF BVC en ondersteuning 2021
14-06-2022	1,5		21-014 NEF BVC en ondersteuning 2021
30-06-2022	1,25		21-014 NEF BVC en ondersteuning 2021
	10,25		

Klant

Gemeente Noardeast Fryslân

Gemeente Noardeast Fryslân

Gemeente Noardeast Fryslân

Gemeente Noardeast Fryslân

Taak

Overleggen

Overleggen

Veldopname

Rapportage

Notitie

Check aangeleverde mutaties in Digitree, afspraak plannen voor overleg

Administratief beoordelen geüploade gegevens, veldbeoordeling uitgevoerd werk, overleg met [REDACTED] (

Beoordelen Amerikaanse eik Kollumerzwaag

Mail bevindingen Amerikaanse eik Sparrewei Kollumerzwaag, upload gegevens, check nieuwe inspectiegegeve

op werf Dokkum, veldbezoek met [REDACTED] in Anjum e.o.

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:41:57

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Mon, 18 Jul 2022 16:49:51

Verzonden: Mon, 18 Jul 2022 16:49:17

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Diverse ondersteuning boombeheer

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[20220718 Tijdregistraties NEF bvc en ondersteuning \(2021-12-07 tm 2022-06-30\).xlsx](#); [20220718 Tijdregistraties 21-084 Dantumadiel BVC en ondersteuning 2021-2022 \(01-03-2022 tm 30-06-2022\).xlsx](#);

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Hallo [REDACTED],

Even een paar vraagjes. We hebben nog wat uurtjes open staan. Zie bijlagen. Graag je akkoord.

Daarnaast ligt de vraag nog bij jou vwb opname van de monumentale bomen (kosten, criteria, hoe om te gaan met aanvullingen). Of komt dat later nog eens en had je eerst genoeg aan de geschatte E 10,- per boom ?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
European Tree Technician

Heldergroen advies
Bezoekadres: Vaart NZ 50, 9401 GN Assen

Groentechnisch specialist

Postadres: Stedelaan 1, 9408 HE Assen

[REDACTED] [@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)

[REDACTED] [@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl) www.heldergroenadvies.nl



Gemeente Dantumadiel
t.a.v. afdeling crediteurenadministratie
Postbus 22
9104 ZG Damwâld

Telefoon [REDACTED]
[REDACTED]
E-mail [REDACTED]@heldergroenadvies.nl
Internet www.heldergroenadvies.nl
Adres Stedelaan 1, 9408 HE ASSEN

KvK 78403650
BTW [REDACTED]
Bank [REDACTED]
BIC [REDACTED]

Factuur

Datum 22-07-2022
Project 21-084 Opname bomen en ondersteuning bestek Dantumadiel
Uw kenmerk
Factuurnummer 22086

Omschrijving		Totaal
Inzake in overleg met en voor de [REDACTED] uitgevoerde werkzaamheden voor Dantumadiel volgens onze offerte van 12 november 2021 en mondelinge opdracht van de [REDACTED], ondersteuning 1 maart - 30 juni 2022, 44 uur	€	[REDACTED]
	Totaal excl BTW	€
	BTW 21%	€
	Totaal te betalen	€

Wij verzoeken u vriendelijk het totale bedrag binnen 30 dagen over te maken o.v.v. het factuurnummer.



Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:42:45

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Fri, 22 Jul 2022 16:11:36

Verzonden: Fri, 22 Jul 2022 16:09:20

Aan: [Factuur Dantumadiel](#)

Cc: [REDACTED]

Onderwerp: Factuur uitgevoerde werkzaamheden Heldergroen advies

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[22086 Dantumadiel ondersteuning boombeheer \(1 maart tm 30 juni 2022\).pdf](#);

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden voor het ondersteuning van het boombeheer in Dantumadiel.

Mocht u hier vragen en/of opmerkingen over hebben dan kunt u contact opnemen met Heldergroen advies via telefoonnummer 06-15431234.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
European Tree Technician

Groentechnisch specialist

[REDACTED]
[REDACTED]@heldergroenadvies.nl

Heldergroen advies
Bezoekadres: Vaart NZ 50, 9401 GN Assen

Postadres: Stedelaan 1, 9408 HE Assen

[REDACTED]@heldergroenadvies.nl

www.heldergroenadvies.nl



Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:43:47

Van: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Mon, 8 Aug 2022 07:41:43

Verzonden: Mon, 8 Aug 2022 07:41:28

Aan: [redacted]

Cc: [redacted] | [Heldergroen advies](#) [redacted]

Onderwerp: Afronden deelopdrachten

Urgentie: Normal


Precisie: None

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Goedemorgen [redacted]

Ik ben bezig met de voorbereiding van de veldcontrole van het uitgevoerde werk in Dantumadiel voor zowel deelopdracht 1 als 2.

In deelopdracht 1 zijn een drietal bomen (nog) niet gemuteerd, het gaat om onderstaande bomen zou je willen kijken waarom deze nog openstaan?

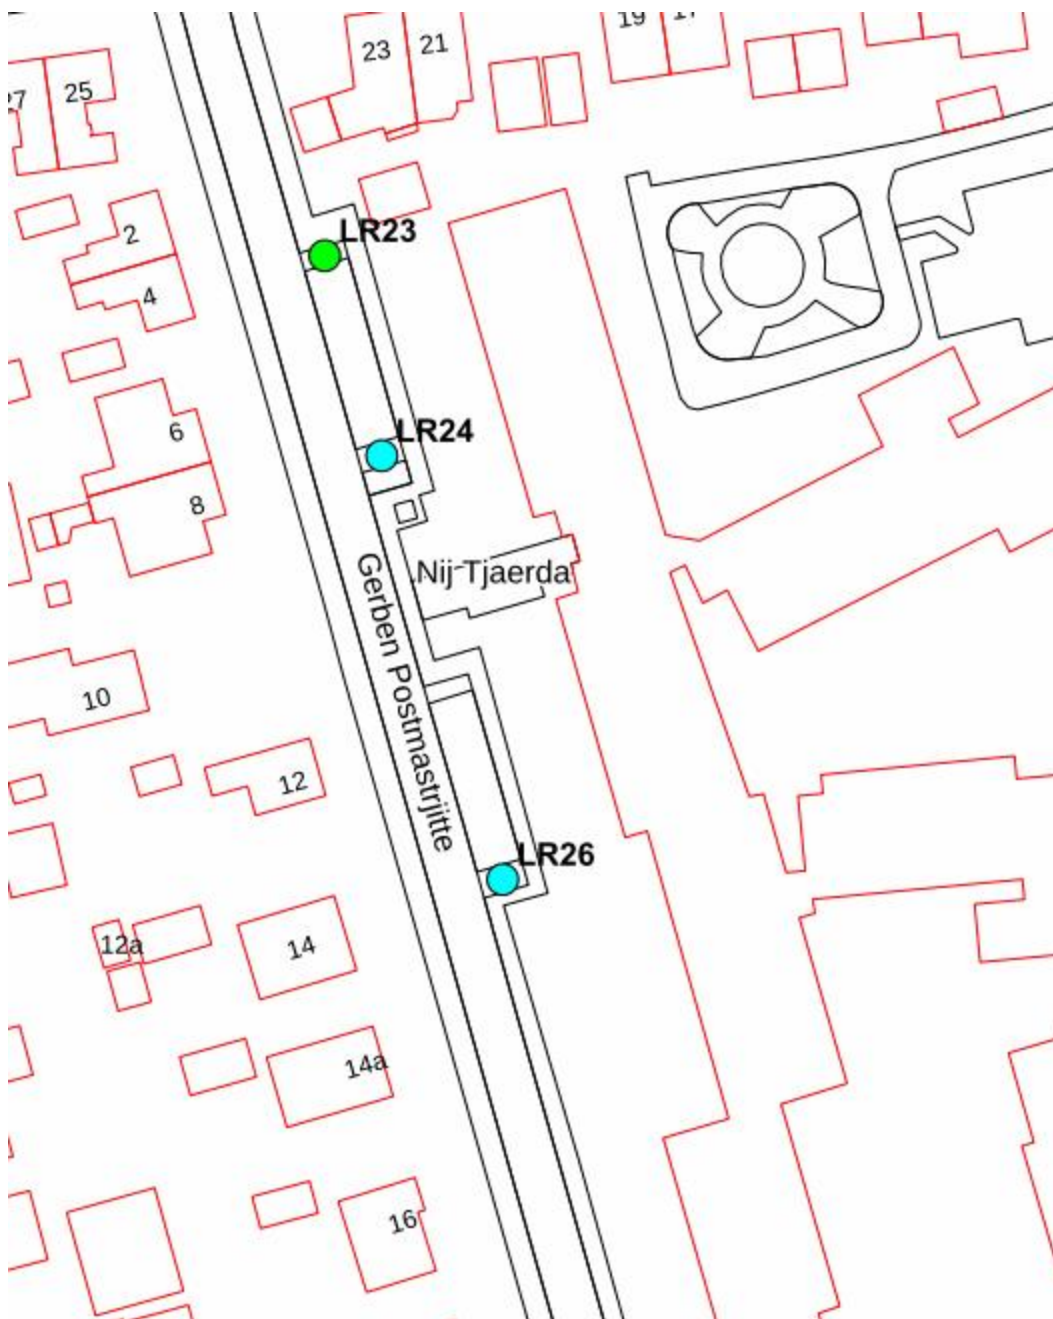

De mutaties voor alle bomen in deelopdracht 2 zijn doorgevoerd.

Zou je mij een bericht willen doen zodra de 3 openstaande bomen in deelopdracht 1 wel gemuteerd zijn, dan kan ik de veldcontrole uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

██████████
Toezichthouder
██████████
██████████@heldergroenadvies.nl

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
██████████@heldergroenadvies.nl
www.heldergroenadvies.nl



CHECKLIST Flora- en Faunawet: algemene zorg



*Terreinrichters
en boveniers*

Locatie: Damstermadiel


Werkzaamheden: groeien

Te sparen elementen: ¹⁾	Locaties gemarkeerd		niet gemarkeerde locaties	
	op kaart	in het terrein	Algemene zorg is verantw. koper	
Horstbomen ²⁾				
Bomen met holen				
Bomen/struiken met nesten				
Mierenhopen				
Dassenburchten				
Jeneverbesbomen				
Grafheuvels				
Vogels van rode lijst: ³⁾				
-				
-				
-				
Vogels van bijlage 1 Vogelrichtlijn: ³⁾				
-				
-				
-				
Andere soorten die bescherming behoeven (planten, dieren, vogels)				
Uit te voeren exploitatiewerkzaamheden ⁴⁾	Jaarrond werken mogelijk	Niet in de periode		voor de vakken
Uitdunsnoei	ja / nee	van	tot	
Rooien bomen	ja / nee			
Muur beplanting	ja / nee			
Maaien bermen	ja / nee			
Overig: <u>groeien</u>	ja / <u>nee</u>	<u>1503</u>	<u>15 07</u>	


Bijzonderheden:

Opdrachtnemer:

d.d.: 23 06 2012

naam: 

plaats: Damstermadiel

handtekening: 

- 1) Nestbomen niet vellen, tijdens werk voldoende afstand houden met velling en/of sleepwerk
- 2) Bij bewoonde roofvogelhorsten wordt binnen een straal van 50-75 m geen velling uitgevoerd in de broedtijd
- 3) Bij aanwezigheid van deze vogels wordt de planning van de velling daarop afgestemd. Van belang is of het gaat om biotoop of broedplek
- 4) Bij het aangeven van de mogelijkheid (en evt. beperking) om werkzaamheden jaarrond uit te voeren is er rekening mee gehouden dat : de aangegeven elementen worden gespaard;
 - : in het algemeen wat geringere kans op nestverstoring is in:
 - populier en ander loofhoutopstanden vóór 1 mei,
 - opstanden zonder ondergroei;
 - : en dat er in het algemeen een wat grotere kans op nestverstoring is in:
 - opstandsranden met struikvormende soorten,
 - opstanden met ondergroei.

CHECKLIST Flora- en Faunawet: algemene zorg

Locatie: De Dambuadje


Werkzaamheden: Snoeien

Te sparen elementen: ¹⁾	Locaties gemarkeerd		niet gemarkeerde locaties	
	op kaart	in het terrein	Algemene zorg is verantw. koper	
Horstbomen ²⁾				
Bomen met holen				
Bomen/struiken met nesten				
Mierenhopen				
Dassenburchten				
Jeneverbesbomen				
Grafheuvels				
Vogels van rode lijst: ³⁾				
-				
-				
-				
Vogels van bijlage 1 Vogelrichtlijn: ³⁾				
-				
-				
-				
Andere soorten die bescherming behoeven (planten, dieren, vogels)				
.....				
.....				
Uit te voeren exploitatiewerkzaamheden ⁴⁾	Jaarrond werken mogelijk	Niet in de periode		voor de vakken
Uitdunsnoei	ja / nee	van	tot	
Rooien bomen	ja / nee			
Muur beplanting	ja / nee			
Maaien bermen	ja / nee			
Overig: <u>Snoeien</u>	ja / <u>nee</u>	<u>15 03</u>	<u>15 07</u>	<u>Nesten in Bomen</u>

Bijzonderheden:

Opdrachtnemer:

d.d.: 20-06-22

naam: 

plaats: Dambuadje

handtekening: 

- 1) Nestbomen niet vellen, tijdens werk voldoende afstand houden met velling en/of sleepwerk
- 2) Bij bewoonde roofvogelhorsten wordt binnen een straal van 50-75 m geen velling uitgevoerd in de broedtijd
- 3) Bij aanwezigheid van deze vogels wordt de planning van de velling daarop afgestemd. Van belang is of het gaat om biotoop of broedplek
- 4) Bij het aangeven van de mogelijkheid (en evt. beperking) om werkzaamheden jaarrond uit te voeren is er rekening mee gehouden dat : de aangegeven elementen worden gespaard;
 - : in het algemeen wat geringere kans op nestverstoring is in:
 - populier en ander loofhoutopstanden vóór 1 mei,
 - opstanden zonder ondergroei;
 - : en dat er in het algemeen een wat grotere kans op nestverstoring is in:
 - opstandsranden met struikvormende soorten,
 - opstanden met ondergroei.

CHECKLIST Flora- en Faunawet: algemene zorg

Locatie: Dantumadiel

Werkzaamheden: Snoei


Te sparen elementen: ¹⁾	Locaties gemarkeerd		niet gemarkeerde locaties	
	op kaart	in het terrein	Algemene zorg is verantw. koper	
Horstbomen ²⁾				
Bomen met hopen				
Bomen/struiken met nesten				
Mierenhopen				
Dassenburchten				
Jeneverbesbomen				
Grafheuvels				
Vogels van rode lijst: ³⁾				
-				
-				
-				
Vogels van bijlage 1 Vogelrichtlijn: ³⁾				
-				
-				
-				
Andere soorten die bescherming behoeven (planten, dieren, vogels)				
.....				
.....				
Uit te voeren exploitatiewerkzaamheden ⁴⁾	Jaarrond werken mogelijk	Niet in de periode		voor de vakken
Uitdunsnoei	ja / nee	van	tot	
Rooien bomen	ja / nee			
Muur beplanting	ja / nee			
Maaien bermen	ja / nee			
Overig: <u>Snoeien</u>	ja / <u>nee</u>	<u>15 03</u>	<u>15 07</u>	<u>nest in boom</u>

Bijzonderheden:

- JA 2023

Opdrachtnemer:

d.d.: 27 06 2022

naam: 

plaats: Dantumadiel

handtekening: 

- 1) Nestbomen niet vellen, tijdens werk voldoende afstand houden met velling en/of sleepwerk
- 2) Bij bewoonde roofvogelhorsten wordt binnen een straal van 50-75 m geen velling uitgevoerd in de broedtijd
- 3) Bij aanwezigheid van deze vogels wordt de planning van de velling daarop afgestemd. Van belang is of het gaat om biotoop of broedplek
- 4) Bij het aangeven van de mogelijkheid (en evt. beperking) om werkzaamheden jaarrond uit te voeren is er rekening mee gehouden dat : de aangegeven elementen worden gespaard;
 - : in het algemeen wat geringere kans op nestverstoring is in:
 - populier en ander loofhoutopstanden vóór 1 mei,
 - opstanden zonder ondergroei;
 - : en dat er in het algemeen een wat grotere kans op nestverstoring is in:
 - opstandsranden met struikvormende soorten,
 - opstanden met ondergroei.

CHECKLIST Flora- en Faunawet: algemene zorg



*Terreinrichters
en hoveniers*

Locatie: Dontamadriel

Werkzaamheden: Snoeien

Te sparen elementen: ¹⁾	Locaties gemarkeerd		niet gemarkeerde locaties	
	op kaart	in het terrein	Algemene zorg is verantw. koper	
Horstbomen ²⁾				
Bomen met holen				
Bomen/struiken met nesten				
Mierenhopen				
Dassenburchten				
Jeneverbesbomen				
Grafheuvels				
Vogels van rode lijst: ³⁾				
-				
-				
-				
Vogels van bijlage 1 Vogelrichtlijn: ³⁾				
-				
-				
-				
Andere soorten die bescherming behoeven (planten, dieren, vogels)				
Uit te voeren exploitatiewerkzaamheden ⁴⁾	Jaarrond werken mogelijk	Niet in de periode		voor de vakken
Uitdunsnoei	ja / nee	van	tot	
Rooien bomen	ja / nee			
Muur beplanting	ja / nee			
Maaien bermen	ja / nee			
Overig: <u>Snoeien</u>	ja / <u>nee</u>	<u>15 03</u>	<u>15 07</u>	

Bijzonderheden:

Opdrachtnemer:

d.d.: 4-30-06-22

naam: [REDACTED]

plaats: Dontamadriel

handtekening: _____

- 1) Nestbomen niet vellen, tijdens werk voldoende afstand houden met velling en/of sleepwerk
- 2) Bij bewoonde roofvogelhorsten wordt binnen een straal van 50-75 m geen velling uitgevoerd in de broedtijd
- 3) Bij aanwezigheid van deze vogels wordt de planning van de velling daarop afgestemd. Van belang is of het gaat om biotoop of broedplek
- 4) Bij het aangeven van de mogelijkheid (en evt. beperking) om werkzaamheden jaarrond uit te voeren is er rekening mee gehouden dat : de aangegeven elementen worden gespaard;
 - : in het algemeen wat geringere kans op nestverstoring is in:
 - populier en ander loofhoutopstanden vóór 1 mei,
 - opstanden zonder ondergroei;
 - : en dat er in het algemeen een wat grotere kans op nestverstoring is in:
 - opstandsranden met struikvormende soorten,
 - opstanden met ondergroei.

CHECKLIST Flora- en Faunawet: algemene zorg



*Terreinrichters
en boveniers*

Locatie: Dantumadiel


Werkzaamheden: Snoeien

Te sparen elementen: ¹⁾	Locaties gemarkeerd		niet gemarkeerde locaties	
	op kaart	in het terrein	Algemene zorg is verantw. koper	
Horstbomen ²⁾				
Bomen met holen				
Bomen/struiken met nesten				
Mierenhopen				
Dassenburchten				
Jeneverbesbomen				
Grafheuvels				
Vogels van rode lijst: ³⁾				
-				
-				
-				
Vogels van bijlage 1 Vogelrichtlijn: ³⁾				
-				
-				
-				
Andere soorten die bescherming behoeven (planten, dieren, vogels)				
.....				
.....				
Uit te voeren exploitatiewerkzaamheden ⁴⁾	Jaarrond werken mogelijk	Niet in de periode		voor de vakken
Uitdunsnoei	ja / nee	van	tot	
Rooien bomen	ja / nee			
Muur beplanting	ja / nee			
Maaien bermen	ja / nee			
Overig: <u>graaia</u>	ja / <u>nee</u>	<u>1503</u>	<u>1507</u>	

Bijzonderheden:

Opdrachtnemer:

d.d.: 1-07-22

naam: 

plaats: Broekste wijk

handtekening: 

- 1) Nestbomen niet vellen, tijdens werk voldoende afstand houden met velling en/of sleepwerk
- 2) Bij bewoonde roofvogelhorsten wordt binnen een straal van 50-75 m geen velling uitgevoerd in de broedtijd
- 3) Bij aanwezigheid van deze vogels wordt de planning van de velling daarop afgestemd. Van belang is of het gaat om biotoop of broedplek
- 4) Bij het aangeven van de mogelijkheid (en evt. beperking) om werkzaamheden jaarrond uit te voeren is er rekening mee gehouden dat : de aangegeven elementen worden gespaard;
 - : in het algemeen wat geringere kans op nestverstoring is in:
 - populier en ander loofhoutopstanden vóór 1 mei,
 - opstanden zonder ondergroei;
 - : en dat er in het algemeen een wat grotere kans op nestverstoring is in:
 - opstandsranden met struikvormende soorten,
 - opstanden met ondergroei.

CHECKLIST Flora- en Faunawet: algemene zorg



*Terreinrichters
en boveniers*

Locatie: Dontzmadiel

Werkzaamheden: Snijden

Te sparen elementen: ¹⁾	Locaties gemarkeerd		niet gemarkeerde locaties	
	op kaart	in het terrein	Algemene zorg is verantw. koper	
Horstbomen ²⁾				
Bomen met hollen				
Bomen/struiken met nesten				
Mierenhopen				
Dassenburchten				
Jeneverbesbomen				
Grafheuvels				
Vogels van rode lijst: ³⁾				
-				
-				
-				
Vogels van bijlage 1 Vogelrichtlijn: ³⁾				
-				
-				
-				
Andere soorten die bescherming behoeven (planten, dieren, vogels)				
.....				
.....				
Uit te voeren exploitatiewerkzaamheden ⁴⁾	Jaarrond werken mogelijk	Niet in de periode		voor de vakken
Uitdunsnoei	ja / nee	van	tot	
Rooien bomen	ja / nee			
Muur beplanting	ja / nee			
Maaien bermen	ja / nee			
Overig: <u>snijden</u>	ja / <u>nee</u>	<u>1503</u>	<u>1507</u>	

Bijzonderheden:

Opdrachtnemer:

d.d.: februari naam: _____

plaats: 1102 2022 handtekening: _____

- 1) Nestbomen niet vellen, tijdens werk voldoende afstand houden met velling en/of sleepwerk
- 2) Bij bewoonde roofvogelhorsten wordt binnen een straal van 50-75 m geen velling uitgevoerd in de broedtijd
- 3) Bij aanwezigheid van deze vogels wordt de planning van de velling daarop afgestemd. Van belang is of het gaat om biotoop of broedplek
- 4) Bij het aangeven van de mogelijkheid (en evt. beperking) om werkzaamheden jaarrond uit te voeren is er rekening mee gehouden dat :
 - : de aangegeven elementen worden gespaard;
 - : in het algemeen wat geringere kans op nestverstoring is in:
 - populier en ander loofhoutopstanden vóór 1 mei,
 - opstanden zonder ondergroei;
 - : en dat er in het algemeen een wat grotere kans op nestverstoring is in:
 - opstandsranden met struikvormende soorten,
 - opstanden met ondergroei.

CHECKLIST Flora- en Faunawet: algemene zorg



Terrainrichters
en hoveniers

FRISIA
BERGUM

Locatie: Dontemedeil


Werkzaamheden: Snoeien

Te sparen elementen: ¹⁾	Locaties gemarkeerd		niet gemarkeerde locaties	
	op kaart	in het terrein	Algemene zorg is verantw. koper	
Horstbomen ²⁾				
Bomen met holen				
Bomen/struiken met nesten				
Mierenhopen				
Dassenburchten				
Jeneverbesbomen				
Grafheuvels				
Vogels van rode lijst: ³⁾				
-				
-				
-				
Vogels van bijlage 1 Vogelrichtlijn: ³⁾				
-				
-				
-				
Andere soorten die bescherming behoeven (planten, dieren, vogels)				
Uit te voeren exploitatiewerkzaamheden ⁴⁾	Jaarrond werken mogelijk	Niet in de periode		voor de vakken
Uitdunsnoei	ja / nee	van	tot	
Rooien bomen	ja / nee			
Muur beplanting	ja / nee			
Maaien bermen	ja / nee			
Overig: <u>Snoeien</u>	ja / <u>nee</u>	<u>15-03</u>	<u>15-07</u>	


Bijzonderheden:

Opdrachtnemer:

d.d.: 12-07-2022

naam: 

plaats: Dontemedeil

handtekening: 

- Nestbomen niet vellen, tijdens werk voldoende afstand houden met velling en/of sleepwerk
- Bij bewoonde roofvogelhorsten wordt binnen een straal van 50-75 m geen velling uitgevoerd in de broedtijd
- Bij aanwezigheid van deze vogels wordt de planning van de velling daarop afgestemd. Van belang is of het gaat om biotoop of broedplek
- Bij het aangeven van de mogelijkheid (en evt. beperking) om werkzaamheden jaarrond uit te voeren is er rekening mee gehouden dat : de aangegeven elementen worden gespaard;
 - : in het algemeen wat geringere kans op nestverstoring is in:
 - populier en ander loofhoutopstanden vóór 1 mei,
 - opstanden zonder ondergroei;
 - : en dat er in het algemeen een wat grotere kans op nestverstoring is in:
 - opstandsranden met struikvormende soorten,
 - opstanden met ondergroei.

CHECKLIST Flora- en Faunawet: algemene zorg



*Terreinrichters
en hoveniers*

Locatie: Plantsoenmedel


Werkzaamheden: Speien

Te sparen elementen: ¹⁾	Locaties gemarkeerd		niet gemarkeerde locaties	
	op kaart	in het terrein	Algemene zorg is verantw. koper	
Horstbomen ²⁾				
Bomen met holen				
Bomen/struiken met nesten				
Mierenhopen				
Dassenburchten				
Jeneverbesbomen				
Grafheuvels				
Vogels van rode lijst: ³⁾				
-				
-				
-				
Vogels van bijlage 1 Vogelrichtlijn: ³⁾				
-				
-				
-				
Andere soorten die bescherming behoeven (planten, dieren, vogels)				
Uit te voeren exploitatiewerkzaamheden ⁴⁾	Jaarrond werken mogelijk	Niet in de periode		voor de vakken
Uitdunsnoei	ja / nee	van	tot	
Rooien bomen	ja / nee			
Muur beplanting	ja / nee			
Maaien bermen	ja / nee			
Overig:	ja <input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/>	1503	1507	

Bijzonderheden:

Opdrachtnemer:

d.d.: 14 07 2022

naam: 

plaats: _____

handtekening: 

- 1) Nestbomen niet vellen, tijdens werk voldoende afstand houden met velling en/of sleepwerk
- 2) Bij bewoonde roofvogelhorsten wordt binnen een straal van 50-75 m geen velling uitgevoerd in de broedtijd
- 3) Bij aanwezigheid van deze vogels wordt de planning van de velling daarop afgestemd. Van belang is of het gaat om biotoop of broedplek
- 4) Bij het aangeven van de mogelijkheid (en evt. beperking) om werkzaamheden jaarrond uit te voeren is er rekening mee gehouden dat : de aangegeven elementen worden gespaard;
 - : in het algemeen wat geringere kans op nestverstoring is in:
 - populier en ander loofhoutopstanden vóór 1 mei,
 - opstanden zonder ondergroei;
 - : en dat er in het algemeen een wat grotere kans op nestverstoring is in:
 - opstandsranden met struikvormende soorten,
 - opstanden met ondergroei.

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:44:45

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Wed, 31 Aug 2022 08:41:12

Verzonden: Wed, 31 Aug 2022 08:39:21

Aan: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

Cc: [REDACTED]

Onderwerp: FW: Afronden deelopdrachten

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[Definitieve gunning.pdf](#); [20220715140307846.pdf](#); [20220706123647058.pdf](#); [ETW Pasje 1-12-2024.pdf](#);

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Hierbij

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | Heldergroen advies

Van: P [REDACTED]@piusfloris.nl

Verzonden: woensdag 31 augustus 2022 07:32

Aan: [REDACTED] | Heldergroen advies <[REDACTED]@heldergroenadvies.nl>

Onderwerp: RE: Afronden deelopdrachten

Goedemorgen [REDACTED],

Bij deze ontvang je de ontbrekende stukken zoals afgesproken. Het gaat hierbij om;

-Flora en Fauna formulieren

-Document definitieve gunning

-kopie ETW certificaat Niels Bouwense die reeds verlengt is.

Laatste 3 bomen te Damwald zijn gesnoeid, en gemuteerd in het DigiTree systeem.

Zijn er vragen en/of opmerkingen dan horen wij die graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Uitvoerder/werkvoorbereider

Adviseur

Groenkeur boomveiligheids controleur

M



T

Kloosterlaan 81
Postbus 14

9250 AA Bergum

T

Jeverweg 10
Postbus 9531

9703 LM Groningen

T

Abel Tasmanplein 3
Postbus 541

9400 AM Assen

www.piusfloris.nl

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken we u dringend ons direct te informeren en om dit bericht en eventuele bijlage(n) te verwijderen, zonder het te kopiëren, door te zenden of op enige andere wijze te openbaren of te gebruiken.

Van: [redacted] | Heldergroen advies <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>

Verzonden: maandag 29 augustus 2022 11:32

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@piusfloris.nl](mailto:[redacted]@piusfloris.nl)>

CC: [redacted] <[\[redacted\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[redacted]@noardeast-fryslan.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[redacted]@noardeast-fryslan.nl)>;

[redacted] <[\[redacted\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[redacted]@noardeast-fryslan.nl)>; [redacted] | Heldergroen advies <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>

Onderwerp: RE: Afronden deelopdrachten

Hallo [redacted]

Iets te snel op verzenden gedrukt. Nu even compleet ☐

We hebben begin volgende week de laatste bouwvergadering staan en willen graag voor die tijd de zaken gecontroleerd hebben. Kunnen wij vandaag alle gevraagde noodzakelijke gegevens ontvangen ?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Heldergroen advies

Van: [redacted] | Heldergroen advies

Verzonden: maandag 29 augustus 2022 11:29

Aan: [redacted] <[redacted]@piusfloris.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@noardeast-fryslan.nl>; [redacted] <[redacted]2@noardeast-fryslan.nl>;
[redacted] <[redacted]@noardeast-fryslan.nl>; [redacted] | Helder groen advies <[redacted]@heldergroenadvies.nl>
Onderwerp: RE: Afronden deelopdrachten

Hallo [redacted]

We hebben begin volgende week de laatste bouwvergadering staan en willen graag voor die tijd de

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Helder groen advies

Van: [redacted] | Helder groen advies <[redacted]@heldergroenadvies.nl>

Verzonden: maandag 8 augustus 2022 07:41

Aan: [redacted] <[redacted]@piusfloris.nl>


CC: [redacted] <[redacted]@noardeast-fryslan.nl>; [redacted] <[redacted]@noardeast-fryslan.nl>; [redacted] |
Helder groen advies <[redacted]@heldergroenadvies.nl>; [redacted] <[redacted]@noardeast-fryslan.nl>

Onderwerp: Afronden deelopdrachten

Goedemorgen [redacted]

Ik ben bezig met de voorbereiding van de veldcontrole van het uitgevoerde werk in Dantumadiel voor zowel deelopdracht 1 als 2.

In deelopdracht 1 zijn een drietal bomen (nog) niet gemuteerd, het gaat om onderstaande bomen zou je willen kijken waarom deze nog openstaan?

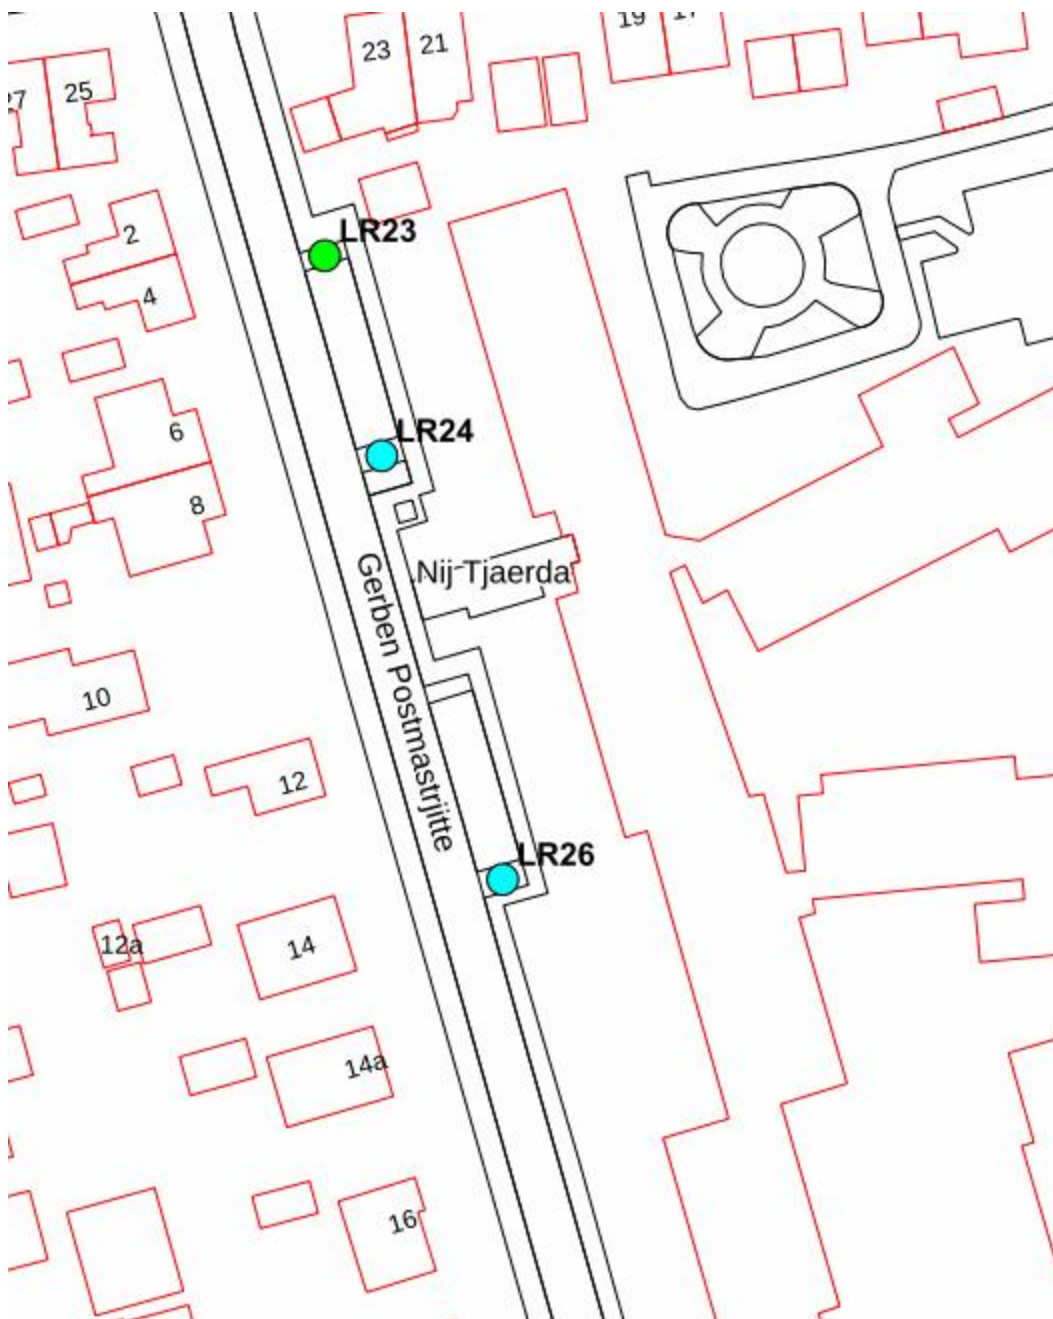

De mutaties voor alle bomen in deelopdracht 2 zijn doorgevoerd.

Zou je mij een bericht willen doen zodra de 3 openstaande bomen in deelopdracht 1 wel gemuteerd zijn, dan kan ik de veldcontrole uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

██████████
Toezichthouder

██████████
[@heldergroenadvies.nl](mailto:██████████@heldergroenadvies.nl)

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
██████████@heldergroenadvies.nl
www.heldergroenadvies.nl



Project: RAW Bestek onderhoud bomen 2022-204 Dantumadiel

Nummer: NE_2022_21

Aanwezig: Gemeente Dantumadiel [redacted]

[redacted]

[redacted]

Frisia [redacted]

Heldergroen advies [redacted]

[redacted]

Afwezig Frisia [redacted]

(mk): Gemeente Dantumadiel [redacted]

Datum: 6 september 2022 (8.30 uur gemeentewerf Damwald)

Onderwerp: Verslag overleg BV03 Bestek onderhoud bomen 2022-2024, Dantumadiel

Nummer *Onderwerp* *Actie*

1 **Opening**

- [redacted] opent de vergadering.
- [redacted] en [redacted] zijn afwezig.

2 **Vaststellen verslag en agendapunten**

- Agenda BV03 is akkoord en wordt vastgesteld.
- Verslag BV02 is akkoord en wordt vastgesteld.
- Er staan nog enkele actiepunten (naast de punten onder 3) open:
 - Definitieve gunning bij Frisia is binnen [redacted]
 - Mbt RAW afdracht heeft [redacted] alle gegevens verstuurd, die binnen moet binnen zijn bij Frisia. Check. [redacted]
 - Pasje ETW [redacted] is verstuurd [redacted]
 - Ontbrekende FF toesturen zijn verstuurd [redacted]

3 **Agendapunten**

- Afrekening termijn 1 is afgerond.



- Bevindingen controle termijn 2 (restant). Over het algemeen goed. Extra aandacht voor de te maken of gemaakte keuzes bij BGS verwaarloosd. Er dient forser ingegrepen worden. Nu niet voldoende om daarvoor terug te gaan, maar volgende keer zal dit beter moeten. ■ overlegt met ■. Extra werk eik met lengtescheur in tak. ■ maakt voorstel voor 2^e termijn ■
- Overleg hoe verder in 2023. Start met rayon West: direct in begin van het jaar. ■ bespreekt intern en levert concept planning aan. ■ levert ■ globaal de hoeveelheden aan. Beplantingswerk aansluitend aan het deel van 2022 (rayon Centrum). ■

4 Vaststellen volgend overleg, wvttk, rondvraag en sluiting

- ■ controleert aangeleverde gegevens van Frisia. Er zijn een paar mutaties van nieuwe aanplant op het reeds bestaande nummer. ■ past dit aan en actualiseert de gegevens. ■ levert vervolgens de uit de snoei opdracht aangeleverde te rooien bomen aan bij ■ voor de aanvraag en informeert ■ tbv nieuwe aanplant. ■
- ■ geeft aan dat hij stopt als uitvoerder bij Frisia. ■ neemt vooreerst werkzaamheden over. ■

5 Algemeen

Hieronder van de betrokkenen de mailadressen, telefoonnummers en rollen:

- ■@noardeast-fryslan.nl / ■
- J ■@noardeast-fryslan.nl / ■
(aanwezig: ma,di, wo ,vr)
- ■@noardeast-fryslan.nl / ■
(aanwezig: ma, di wo, do)
- ■@frisiabergum.nl / ■
hoofduitvoerder
- ■@piusfloris.nl / ■
uitvoerder
- ■@heldergroenadvies.nl / ■ / extern
directievoerder
- ■@heldergroenadvies.nl / ■ /
extern toezichthouder



Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:45:11

Van: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Wed, 7 Sep 2022 12:36:39

Verzonden: Wed, 7 Sep 2022 12:35:59

Aan: [redacted]

Cc: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

Onderwerp: Verslag BV03 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[20220906 Verslag BV03 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel \(Frisia\).pdf](#)

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Hallo,

Hierbij het verslag van het overleg gisteren.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Heldergroen advies

Van: [redacted] | Heldergroen advies

Verzonden: vrijdag 2 september 2022 16:38

Aan: [redacted] - Gemeente Noardeast Fryslan ([redacted]@noardeast-fryslan.nl) <[redacted]@noardeast-fryslan.nl>; [redacted]@noardeast-fryslan.nl; [redacted]@noardeast-fryslan.nl; [redacted]@piusfloris.nl

CC: [redacted] | Heldergroen advies [redacted]@heldergroenadvies.nl>; [redacted] <[redacted]@frisiabergum.nl>

Onderwerp: Agenda bouwvergadering BV03 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024

Hallo,

Hierbij de agenda voor de bouwvergadering van komende dinsdag.

Goed weekend en tot dinsdag !

Met vriendelijke groet,

[redacted]
European Tree Technician

Heldergroen advies
Bezoekadres: Vaart NZ 50, 9401 GN Assen

Groentechnisch specialist

Postadres: Stedelaan 1, 9408 HE Assen

[redacted] | [@heldergroenadvies.nl](#)

[redacted] | [@heldergroenadvies.nl](#) www.heldergroenadvies.nl

FRISIA BERGUM

Pagina 1 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 september

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		A	G	in termijn	tm termijn		
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)						
10	BEGELEIDINGSSNOEI						
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	5,00	V			
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	7,00	V	3,00	3,00	
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	3,00	V	2,00	2,00	
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V			
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V	7,00	7,00	
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V	19,00	19,00	
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	64,00	V	9,00	9,00	
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	5,00	V			
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V	8,00	8,00	
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	154,00	V	5,00	5,00	
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	159,00	V	3,00	3,00	
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	1,00	V			
11	ONDERHOUDSSNOEI						
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.						
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V			
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V			
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V	1,00	1,00	
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V	2,00	2,00	
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V	8,00	8,00	
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	2,00	V			
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)						
20	BEGELEIDINGSSNOEI						
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4,00	V	2,00	4,00	
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V *	8,00	20,00	
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107,00	V	56,00	106,00	
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	104,00	V	19,00	99,00	
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	34,00	V	4,00	27,00	
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3,00	V	1,00	1,00	

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 2 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 september

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		A	G	in termijn	tm termijn		
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	195,00	V	48,00	138,00	
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	248,00	V *	155,00	248,00	
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	91,00	V	19,00	85,00	
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V	9,00	25,00	
21	ONDERHOUDSSNOEI						
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.						
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V *		10,00	
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	14,00	V	2,00	14,00	
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	60,00	V	19,00	59,00	
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	141,00	V	27,00	139,00	
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	58,00	V	1,00	54,00	
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	9,00	V		9,00	
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)						
30	BEGELEIDINGSSNOEI						
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m).	st	2,00	V			
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	5,00	V			
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	1,00	V			
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	64,00	V			
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	199,00	V			
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	132,00	V			
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	94,00	V			
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	14,00	V			
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V			
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	253,00	V			
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	176,00	V			
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V			
31	ONDERHOUDSSNOEI						
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.						
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	4,00	V			
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	2,00	V			
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	24,00	V			
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	89,00	V			

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 3 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 september

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
						in termijn	tm termijn		
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	114,00	V				[REDACTED]	
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	21,00	V				[REDACTED]	
4	REGISTRATIE 2022-2024							[REDACTED]	
40	OPNAME BOOMKENMERKEN							[REDACTED]	
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.							[REDACTED]	
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei).	st	4.029,00	V		500,00	1.168,00	[REDACTED]	[REDACTED]
5	WERK ALGEMENE AARD 2022-2024							[REDACTED]	
50	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA							[REDACTED]	
5010	Inventariseren flora en fauna verkennend							[REDACTED]	
501010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	V				[REDACTED]	
501020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V				[REDACTED]	
5011	Inventariseren flora en fauna soortspecifiek							[REDACTED]	
501110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	15,00	V				[REDACTED]	
501120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	15,00	V				[REDACTED]	
5012	Markeren flora- en faunaplaatsen							[REDACTED]	
501210	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V				[REDACTED]	
501220	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V				[REDACTED]	
6	VERKEERSMAATREGELEN 2022-2024							[REDACTED]	
60	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK							[REDACTED]	
6010	Toepassen verkeersmaatregelen							[REDACTED]	
601010	Toepassen afzetting (2022)	eur	600,00	N		28,79	28,79	[REDACTED]	[REDACTED]
601020	Toepassen afzetting (2023)	eur	600,00	N		214,04	582,90	[REDACTED]	[REDACTED]
601030	Toepassen afzetting (2024)	eur	941,75	N				[REDACTED]	[REDACTED]
61	VERKEERSREGELAAR							[REDACTED]	
6101	Bevoegde verkeersregelaars							[REDACTED]	
610110	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2022).	eur	500,00	N				[REDACTED]	
610120	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2023).	eur	500,00	N				[REDACTED]	
610130	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2024).	eur	500,00	N				[REDACTED]	
7	PRAKTIJKDAG							[REDACTED]	
70	PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS							[REDACTED]	
7010	Afstemming ETW's en ETT's							[REDACTED]	
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V		1,00	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]
8	INZETTEN 2022-2024							[REDACTED]	
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V				[REDACTED]	[REDACTED]
	SUBTOTAAL							[REDACTED]	[REDACTED]

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 4 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 september

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
910010	Aanvoerkosten	100,00	N		9,88	24,87	[REDACTED]	[REDACTED]
910020	Afvoerkosten	100,00	N		9,88	24,87	[REDACTED]	[REDACTED]
910030	0,00	N				[REDACTED]	
910040	0,00	N				[REDACTED]	
910050	0,00	N				[REDACTED]	
919980	Overige eenmalige kosten	0,00	N				[REDACTED]	
919990	Korting	0,00	N				[REDACTED]	
929990	Uitvoeringskosten	975,00	N		96,32	242,46	[REDACTED]	[REDACTED]
939990	Algemene kosten	550,00	N		54,33	136,77	[REDACTED]	[REDACTED]
949990	Winst en risico	500,00	N		49,39	124,33	[REDACTED]	[REDACTED]
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	131,03	N				[REDACTED]	[REDACTED]
	SUBTOTAAL						[REDACTED]	[REDACTED]

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 5 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 september

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
	OVERSCHRIJDINGEN							
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V		60,00	60,00	[REDACTED]
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	248,00	V		1,00	1,00	[REDACTED]
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V		2,00	2,00	[REDACTED]
	TOTAAL OVERSCHRIJDINGEN							[REDACTED]

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 6 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 september

AANNEMINGSSOM:	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM TOT TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN TOT TERMIJN	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN	€	
DEZE TERMIJN EXTRA DECLARATIES	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN EXTRA DECLARATIES T/M TERMIJN	€	
BTW % 21,00 IN TERMIJN		9.542,47 = €

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum : ____ / ____ / ____

Naam toezichhouder : _____

Handtekening toezichhouder : _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum : 06 / 09 / 2022

Naam uitvoerder : _____

Handtekening uitvoerder : _____

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:45:47

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Thu, 15 Sep 2022 17:14:53

Verzonden: Thu, 15 Sep 2022 17:14:22

Aan: [REDACTED]

Cc: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

Onderwerp: RE: 2e Termijn Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[2e Termijn Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024.pdf](#);

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Hallo [REDACTED]

We hebben een paar opmerkingen, namelijk:

- Er zitten wat afwijkingen in de aantallen (soms voor je in de plus en soms in de min). Het betreft de besteksposten:
 - 201120: 1 stuks te weinig opgevoerd
 - 201140: 2 stuks te veel opgevoerd
 - 201150: 2 stuks te weinig opgevoerd
 - 201210: 52 stuks te weinig opgevoerd
 - 201220: 1 stuks te veel opgevoerd
 - 201230: 3 stuks te veel opgevoerd
 - 211040: 2 stuks te weinig opgevoerd
- Daarnaast kun je nog een deel opvoeren van de posten onder 5010 en 6101.
- Denk je met afrekenen ook even aan de bonus. Begreep van de gemeente dat die er in de 1e termijn niet bij zat.

Uiteindelijk doe je jezelf tekort, maar we houden van eerlijk zaken doen. Pas je hem aan, zodat ik kan afrekenen ?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | Heldergroen advies

Van: [REDACTED]@piusfloris.nl>

Verzonden: dinsdag 6 september 2022 12:36

Aan: [REDACTED] | Heldergroen advies <[REDACTED]@heldergroenadvies.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@piusfloris.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@frisiabergum.nl>

Onderwerp: FW: 2e Termijn Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

Goedemiddag [REDACTED]

Bij deze ontvang je een 2^e termijn voor reeds verrichte werkzaamheden binnen het areaal van de gemeente Dantumadiel.

Voor akkoord ontvangen wij deze graag getekend retour.

Ik wil jullie heel erg bedanken voor de prettige samenwerking!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Uitvoerder/werkvoorbereider

Adviseur

Groenkeur boomveiligheids controleur

M [Redacted]



T [Redacted]

Kloosterlaan 81
Postbus 14

9250 AA Bergum

T [Redacted]

Jeverweg 10
Postbus 9531

9703 LM Groningen

T [Redacted]

Abel Tasmanplein 3
Postbus 541

9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken we u dringend ons direct te informeren en om dit bericht en eventuele bijlage(n) te verwijderen, zonder het te kopiëren, door te zenden of op enige andere wijze te openbaren of te gebruiken.

Van: [Redacted] <[\[Redacted\]@frisiabergum.nl](mailto:[Redacted]@frisiabergum.nl)>

Verzonden: dinsdag 6 september 2022 11:56

Aan: [Redacted] <[\[Redacted\]@frisiagroep.nl](mailto:[Redacted]@frisiagroep.nl)>

Onderwerp: 2e Termijn Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

Hierbij de aangepaste tweede termijn voor het werk 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024.

Wil je deze controleren en versturen?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Kloosterlaan 81, 9251 ME Bergum

Postbus 14, 9250 AA Bergum

T: [REDACTED]

Nieuwe Steen 25, 1625 HV Hoom

T: [REDACTED]



*Terebinthrichters
en hoveniers*

Website: www.frisiaberghum.nl



Denk aan het milieu voordat u print.

Bestekpost	Naam	Eenheid	Verwerkte hoeveelheid	Calc. eh.prijs	Bonus eh.prijs	Bonus totaal
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)					
10	BEGELEIDINGSSNOEI					
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.					
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	0			
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	3			
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	2			
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.					
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	0			
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	7			
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	19			
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	9			
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	0			
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld					
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	8			
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	5			
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	3			
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	0			
11	ONDERHOUDSSNOEI					
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	0			
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	0			
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	1			
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	2			
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	8			
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	0			
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)					
20	BEGELEIDINGSSNOEI					
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.					
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4			
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.					
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20			
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107			
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	99			
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	25			
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3			
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld					
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	190			
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	247			
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	82			
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	25			
21	ONDERHOUDSSNOEI					
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10			
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	14			
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	59			
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	141			
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	54			
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	9			
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)					
30	BEGELEIDINGSSNOEI					
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.					
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	0			
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	0			
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	0			
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.					
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	0			
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	0			
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	0			
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	0			
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	0			
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld					
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	0			
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	0			
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	0			
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	0			
31	ONDERHOUDSSNOEI					
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.					
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	0			
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	0			
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	0			
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	0			
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	0			
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	0			
4	REGISTRATIE 2022-2024					
40	OPNAME BOOMKENMERKEN					
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.					
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei).	st	1.168,00			

TOTALE BONUS HOOFDSTUK 1 T/M 4:

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:46:28

Van: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Tue, 27 Sep 2022 18:17:17

Verzonden: Tue, 27 Sep 2022 18:16:01

Aan: [redacted]

Cc: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

Onderwerp: RE: termijn Dantemadiel

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[20220927132202741.pdf](#); [20220927132212416.pdf](#);

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Hallo [redacted]

Je bent nu iets te enthousiast. Paar opmerkingen:

- 401110: klopt dit aantal met alle bomen die zijn opgevoerd bij het snoeien van alle bomen ?
- 501010 / 501020: hier mag je maar een deel van opvoeren. Op basis van aantal bomen. Zie bestek.
- 5011 / 5012. Wat heb je daarvoor gedaan ? Graag onderbouwing wat blijkt uit de FF verkenning (en is doorgegeven aan ons).
- 6010 gaat wat raar, maar klopt wel

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Heldergroen advies

Van: [redacted]@piusfloris.nl>

Verzonden: dinsdag 27 september 2022 16:19

Aan: [redacted] | Heldergroen advies <[redacted]@heldergroenadvies.nl>

Onderwerp: termijn Dantemadiel

Goedemiddag [redacted],

Hierbij ontvang je de aangepaste termijn staat in zei bijlage.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
European Tree Worker
M [redacted]



T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

FRISIA BERGUM

Pagina 1 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € ██████████ Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)							
10	BEGELEIDINGSSNOEI							
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	5,00	V				
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	7,00	V	3,00	3,00		
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	3,00	V	2,00	2,00		
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V				
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V	7,00	7,00		
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V	19,00	19,00		
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	64,00	V	9,00	9,00		
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	5,00	V				
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V	8,00	8,00		
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	154,00	V	5,00	5,00		
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	159,00	V	3,00	3,00		
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	1,00	V				
11	ONDERHOUDSSNOEI							
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.							
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V				
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V				
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V	1,00	1,00		
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V	2,00	2,00		
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V	8,00	8,00		
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	2,00	V				
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)							
20	BEGELEIDINGSSNOEI							
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4,00	V	2,00	4,00		
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V *	8,00	20,00		
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107,00	V	57,00	107,00		
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	104,00	V	19,00	99,00		
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	34,00	V	2,00	25,00		
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3,00	V	3,00	3,00		

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 2 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	195,00	V	100,00	190,00		
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	248,00	V	154,00	247,00		
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	91,00	V	16,00	82,00		
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V	9,00	25,00		
21	ONDERHOUDSSNOEI							
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.							
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V *		10,00		
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	14,00	V	2,00	14,00		
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	60,00	V	19,00	59,00		
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	141,00	V	29,00	141,00		
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	58,00	V	1,00	54,00		
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	9,00	V		9,00		
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)							
30	BEGELEIDINGSSNOEI							
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	5,00	V				
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	1,00	V				
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	64,00	V				
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	199,00	V				
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	132,00	V				
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	94,00	V				
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	14,00	V				
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V				
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	253,00	V				
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	176,00	V				
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V				
31	ONDERHOUDSSNOEI							
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.							
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	4,00	V				
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	24,00	V				
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	89,00	V				

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 3 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € ██████████ Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	114,00	V				
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	21,00	V				
4	REGISTRATIE 2022-2024							
40	OPNAME BOOMKENMERKEN							
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.							
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei). Verwerkte hoeveelheid correctie	st	4.029,00	V	488,00	1.156,00		
5	WERK ALGEMENE AARD 2022-2024							
50	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA							
5010	Inventariseren flora en fauna verkennend							
501010	Inventariseren flora, verkennend. Verwerkte hoeveelheid correctie	keer	1,00	V	0,29	0,29		
501020	Inventariseren fauna, verkennend. Verwerkte hoeveelheid correctie	keer	1,00	V	0,29	0,29		
5011	Inventariseren flora en fauna soortspecifiek							
501110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	15,00	V				
501120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	15,00	V				
5012	Markeren flora- en faunaplaatsen							
501210	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V				
501220	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V				
6	VERKEERSMAATREGELLEN 2022-2024							
60	VERKEERSMAATREGELLEN BIJ DYNAMISCH WERK							
6010	Toepassen verkeersmaatregelen							
601010	Toepassen afzetting (2022)	eur	600,00	N	600,00	600,00		
601020	Toepassen afzetting (2023) Verwerkte hoeveelheid correctie	eur	600,00	N	-368,86			
601030	Toepassen afzetting (2024)	eur	941,75	N				
61	VERKEERSREGELAAR							
6101	Bevoegde verkeersregelaars							
610110	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2022).	eur	500,00	N	500,00	500,00		
610120	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2023).	eur	500,00	N				
610130	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2024).	eur	500,00	N				
7	PRAKTIJKDAG							
70	PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS							
7010	Afstemming ETW's en ETT's							

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 4 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag 1,00	V		1,00	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]
8	INZETTEN 2022-2024							
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur 40,00	V				[REDACTED]	[REDACTED]
	SUBTOTAAL							

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

[REDACTED]

FRISIA BERGUM

Pagina 5 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
910010	Aanvoerkosten	100,00	N		14,41	29,40	[REDACTED]	[REDACTED]
910020	Afvoerkosten	100,00	N		14,41	29,40	[REDACTED]	[REDACTED]
910030	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
910040	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
910050	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
919980	Overige eenmalige kosten	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
919990	Korting	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
929990	Uitvoeringskosten	975,00	N		140,51	286,65	[REDACTED]	[REDACTED]
939990	Algemene kosten	550,00	N		79,26	161,70	[REDACTED]	[REDACTED]
949990	Winst en risico	500,00	N		72,05	146,99	[REDACTED]	[REDACTED]
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	131,03	N		131,03	131,03	[REDACTED]	[REDACTED]
	SUBTOTAAL						[REDACTED]	[REDACTED]

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 6 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
	OVERSCHRIJDINGEN							
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V	60,00	60,00	[REDACTED]	[REDACTED]
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V	2,00	2,00	[REDACTED]	[REDACTED]
	TOTAAL OVERSCHRIJDINGEN							

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 7 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

AANNEMINGSSOM:	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM TOT TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN TOT TERMIJN	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN	€	
DEZE TERMIJN EXTRA DECLARATIES	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN EXTRA DECLARATIES T/M TERMIJN	€	
BTW % 21,00 IN TERMIJN	11.572,37 =	€

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum : ____ / ____ / ____

Naam toezichthouder : _____

Handtekening toezichthouder : _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum : 5 / 10 / 2022

Naam uitvoerder : _____

Handtekening uitvoerder : _____

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:46:58

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Wed, 5 Oct 2022 19:26:49

Verzonden: Wed, 5 Oct 2022 19:25:49

Aan: [REDACTED]

Cc: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

Onderwerp: FW: Aangepaste mail Dantumadiel

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[20220929154120900.pdf](#); [20221005082802793.pdf](#);

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Hoi [REDACTED]

Deze klopt volgens mij. Ben de komende dagen afwezig en maandag weer op de post. Zal ik hem bij akkoord aftekenen en maandag naar [REDACTED] sturen ?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | Heldergroen advies

Van: [REDACTED]@piusfloris.nl>

Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 08:38

Aan: [REDACTED] | Heldergroen advies <[REDACTED]@heldergroenadvies.nl>

Onderwerp: Aangepaste mail Dantumadiel

Hallo [REDACTED],

Hierbij de aangepaste termijn voor de uitgevoerde snoeiwerkzaamheden in Dantumadiel in rayon centrum.

In de bijlage vind je ook de bonus regeling

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]



T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

FRISIA BERGUM

Pagina 1 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING			VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
			A	G	in termijn	tm termijn		
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)							
10	BEGELEIDINGSSNOEI							
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	5,00	V				
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	7,00	V	3,00	3,00		
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	3,00	V	2,00	2,00		
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V				
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V	7,00	7,00		
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V	19,00	19,00		
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	64,00	V	9,00	9,00		
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	5,00	V				
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V	8,00	8,00		
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	154,00	V	5,00	5,00		
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	159,00	V	3,00	3,00		
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	1,00	V				
11	ONDERHOUDSSNOEI							
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.							
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V				
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V				
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V	1,00	1,00		
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V	2,00	2,00		
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V	8,00	8,00		
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	2,00	V				
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)							
20	BEGELEIDINGSSNOEI							
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4,00	V	2,00	4,00		
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V *	8,00	20,00		
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107,00	V	57,00	107,00		
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	104,00	V	19,00	99,00		
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	34,00	V	2,00	25,00		
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3,00	V	3,00	3,00		

Bereffanpemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 2 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : ██████████ Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
			A	G		
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld					
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st 195,00	V	100,00	190,00	
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st 248,00	V	154,00	247,00	
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st 91,00	V	16,00	82,00	
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st 30,00	V	9,00	25,00	
21	ONDERHOUDSSNOEI					
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.					
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st 10,00	V *		10,00	
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st 14,00	V	2,00	14,00	
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st 60,00	V	19,00	59,00	
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st 141,00	V	29,00	141,00	
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st 58,00	V	1,00	54,00	
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st 9,00	V		9,00	
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)					
30	BEGELEIDINGSSNOEI					
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.					
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m).	st 2,00	V			
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st 5,00	V			
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st 1,00	V			
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.					
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st 64,00	V			
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st 199,00	V			
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st 132,00	V			
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st 94,00	V			
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st 14,00	V			
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld					
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st 225,00	V			
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st 253,00	V			
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st 176,00	V			
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st 30,00	V			
31	ONDERHOUDSSNOEI					
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.					
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st 4,00	V			
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st 2,00	V			
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st 24,00	V			
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st 89,00	V			

Paraaf opdrachtgever

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 3 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	VERWERKTE HOEV.		Prijns per eenheid €	Bedrag in termijn €
			A	G		
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	114,00	V		
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	21,00	V		
4	REGISTRATIE 2022-2024					
40	OPNAME BOOMKENMERKEN					
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.					
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei). Verwerkte hoeveelheid correctie	st	4.029,00	V	488,00 -12,00	1.156,00
5	WERK ALGEMENE AARD 2022-2024					
50	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA					
5010	Inventariseren flora en fauna verkennend					
501010	Inventariseren flora, verkennend. Verwerkte hoeveelheid correctie	keer	1,00	V	0,29 -1,00	0,29
501020	Inventariseren fauna, verkennend. Verwerkte hoeveelheid correctie	keer	1,00	V	0,29 -1,00	0,29
5011	Inventariseren flora en fauna soortspecifiek					
501110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	15,00	V		
501120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	15,00	V		
5012	Markeren flora- en faunaplaatsen					
501210	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V		
501220	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V		
6	VERKEERSMAATREGELEN 2022-2024					
60	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK					
6010	Toepassen verkeersmaatregelen					
601010	Toepassen afzetting (2022)	eur	600,00	N	600,00	600,00
601020	Toepassen afzetting (2023) Verwerkte hoeveelheid correctie	eur	600,00	N	-368,86 -368,86	
601030	Toepassen afzetting (2024)	eur	941,75	N		
61	VERKEERSREGELAAR					
6101	Bevoegde verkeersregelaars					
610110	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2022).	eur	500,00	N	500,00	500,00
610120	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2023).	eur	500,00	N		
610130	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2024).	eur	500,00	N		
7	PRAKTIJKDAG					
70	PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS					
7010	Afstemming ETW's en ETT's					

Paraaf [REDACTED]

Paraaf aannemer,
[REDACTED]

FRISIA BERGUM

Pagina 4 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V		1,00	1,00	[REDACTED]
8	INZETTEN 2022-2024							[REDACTED]
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V				[REDACTED]
	SUBTOTAAL							[REDACTED]

Paraaf opdrachtg

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 5 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
910010	Aanvoerkosten	100,00	N		14,41	29,40	[REDACTED]	[REDACTED]
910020	Afvoerkosten	100,00	N		14,41	29,40	[REDACTED]	[REDACTED]
910030	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
910040	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
910050	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
919980	Overige eenmalige kosten	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
919990	Korting	0,00	N				[REDACTED]	[REDACTED]
929990	Uitvoeringskosten	975,00	N		140,51	286,65	[REDACTED]	[REDACTED]
939990	Algemene kosten	550,00	N		79,26	161,70	[REDACTED]	[REDACTED]
949990	Winst en risico	500,00	N		72,05	146,99	[REDACTED]	[REDACTED]
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	131,03	N		131,03	131,03	[REDACTED]	[REDACTED]
	SUBTOTAAL						[REDACTED]	[REDACTED]

Paraaf opdrachtg

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 6 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		A	G	in termijn	tm termijn		
	OVERSCHRIJDINGEN						
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V	60,00	60,00	[REDACTED]
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V	2,00	2,00	[REDACTED]
	TOTAAL OVERSCHRIJDINGEN						[REDACTED]

Paraaf opdrachtgever

Paraaf aannemer

FRISIA BERGUM

Pagina 7 van 7

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 05 oktober 2022

AANNEMINGSSOM:	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM TOT TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN TOT TERMIJN	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN	€	
DEZE TERMIJN EXTRA DECLARATIES	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN EXTRA DECLARATIES T/M TERMIJN	€	
BTW % 21,00 IN TERMIJN	11.572,37 =	€

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum

: 10/10/2022

Naam toezichthouder

:

Handtekening toezichthouder

:

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum

: 5/10/2022

Naam uitvoerder

:

Handtekening uitvoerder

:

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:47:32

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Mon, 10 Oct 2022 09:12:17

Verzonden: Mon, 10 Oct 2022 09:11:35

Aan: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Aangepaste mail Dantumadiel

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[20221010 Termijnstaat 2 ondertekend.pdf](#);

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Hallo [REDACTED],

Zoals vrijdag toegezegd hierbij de ondertekende termijn.

Bij vragen en/of opmerkingen hoor ik graag van je.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | Heldergroen advies

Van: [REDACTED]@piusfloris.nl>

Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 08:38

Aan: [REDACTED] | Heldergroen advies <[REDACTED]@heldergroenadvies.nl>

Onderwerp: Aangepaste mail Dantumadiel

Hallo [REDACTED],

Hierbij de aangepaste termijn voor de uitgevoerde snoeiwerkzaamheden in Dantumadiel in rayon centrum.

In de bijlage vind je ook de bonus regeling

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]



T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

FRISIA BERGUM

Pagina 1 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 12 december 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		A	G	in termijn	tm termijn		
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)						
10	BEGELEIDINGSSNOEI						
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	5,00	V			
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	7,00	V		3,00	
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	3,00	V		2,00	
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V			
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V		7,00	
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V		19,00	
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	64,00	V		9,00	
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	5,00	V			
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V		8,00	
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	154,00	V		5,00	
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	159,00	V		3,00	
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	1,00	V			
11	ONDERHOUDSSNOEI						
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.						
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V			
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V			
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V		1,00	
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V		2,00	
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V		8,00	
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	2,00	V			
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)						
20	BEGELEIDINGSSNOEI						
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4,00	V		4,00	
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V		20,00	
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107,00	V		107,00	
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	104,00	V		99,00	
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	34,00	V		25,00	
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3,00	V		3,00	

Paraaf opdra

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 2 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 12 december 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	195,00	V		190,00		
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	248,00	V		247,00		
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	91,00	V		82,00		
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V		25,00		
21	ONDERHOUDSSNOEI							
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.							
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V		10,00		
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	14,00	V		14,00		
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	60,00	V		59,00		
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	141,00	V		141,00		
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	58,00	V		54,00		
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	9,00	V		9,00		
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)							
30	BEGELEIDINGSSNOEI							
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	5,00	V				
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	1,00	V				
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	64,00	V				
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	199,00	V				
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	132,00	V				
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	94,00	V				
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	14,00	V				
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V				
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	253,00	V				
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	176,00	V				
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V				
31	ONDERHOUDSSNOEI							
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.							
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	4,00	V				
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	24,00	V				
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	89,00	V				

Paraaf opdrachtgever

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 3 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 12 december 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID		A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		RESULTAATS	VERPLICHTING			in termijn	tm termijn		
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	114,00	V					
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	21,00	V					
4	REGISTRATIE 2022-2024								
40	OPNAME BOOMKENMERKEN								
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.								
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei).	st	4.029,00	V			1.156,00		
5	WERK ALGEMENE AARD 2022-2024								
50	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA								
5010	Inventariseren flora en fauna verkennend								
501010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	V			0,29		
501020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V			0,29		
5011	Inventariseren flora en fauna soortspecifiek								
501110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	15,00	V					
501120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	15,00	V					
5012	Markeren flora- en faunaplaatsen								
501210	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V					
501220	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V					
6	VERKEERSMAATREGELEN 2022-2024								
60	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK								
6010	Toepassen verkeersmaatregelen								
601010	Toepassen afzetting (2022)	eur	600,00	N			600,00		
601020	Toepassen afzetting (2023)	eur	600,00	N					
601030	Toepassen afzetting (2024)	eur	941,75	N					
61	VERKEERSREGELAAR								
6101	Bevoegde verkeersregelaars								
610110	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2022).	eur	500,00	N			500,00		
610120	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2023).	eur	500,00	N					
610130	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2024).	eur	500,00	N					
7	PRAKTIJKDAG								
70	PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS								
7010	Afstemming ETW's en ETT's								
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V			1,00		
8	INZETTEN 2022-2024								
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V		40,00	40,00		
	SUBTOTAAL								

Paraaf opdr

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 4 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 12 december 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
910010	Aanvoerkosten	100,00	N			29,40	[REDACTED]	
910020	Afvoerkosten	100,00	N			29,40	[REDACTED]	
910030	0,00	N				[REDACTED]	
910040	0,00	N				[REDACTED]	
910050	0,00	N				[REDACTED]	
919980	Overige eenmalige kosten	0,00	N				[REDACTED]	
919990	Korting	0,00	N				[REDACTED]	
929990	Uitvoeringskosten	975,00	N			286,65	[REDACTED]	
939990	Algemene kosten	550,00	N			161,70	[REDACTED]	
949990	Winst en risico	500,00	N			146,99	[REDACTED]	
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	131,03	N			131,03	[REDACTED]	
	SUBTOTAAL						[REDACTED]	[REDACTED]

Paraaf opdrachtgever, [REDACTED]

Paraaf aannemer, [REDACTED]

FRISIA BERGUM

Pagina 5 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € [REDACTED] Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 12 december 2022

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
	OVERSCHRIJDINGEN							
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V		60,00	[REDACTED]	
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V		2,00	[REDACTED]	[REDACTED]
	TOTAAL OVERSCHRIJDINGEN							

Paraaf op

Paraaf aanemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 6 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024


BESTEK : NE_2022_21


Datum: 12 december 2022

AANNEMINGSSOM:	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM TOT TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN TOT TERMIJN	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN	€	
DEZE TERMIJN EXTRA DECLARATIES	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN EXTRA DECLARATIES T/M TERMIJN	€	
BTW % 21,00 IN TERMIJN	4.960,00 =	€

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum : 13, 12, 2022

Naam toezichthouder : 

Handtekening toezichthouder : 

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum : 12, 12, 2022

Naam uitvoerder : 

Handtekening uitvoerder : 

Project: RAW Bestek onderhoud bomen 2022-204 Dantumadiel
Nummer: NE_2022_21
Aanwezig: Gemeente Dantumadiel [REDACTED]
Frisia [REDACTED]
[REDACTED]
Heldergroen advies [REDACTED]
Afwezig : Gemeente Dantumadiel [REDACTED]
Heldergroen advies [REDACTED]
Datum: 8 december 2022 (8.30 uur kantoor Frisia, Burgum)
Onderwerp: Verslag overleg BV04 Bestek onderhoud bomen 2022-2024, Dantumadiel

<i>Nummer</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Actie</i>
1	Opening <ul style="list-style-type: none">• [REDACTED] opent de vergadering.• [REDACTED] is afwezig.• [REDACTED] schuift even aan.	
2	Vaststellen verslag en agendapunten <ul style="list-style-type: none">• Agenda BV04 is akkoord en wordt vastgesteld.• Verslag BV03 is akkoord en wordt vastgesteld.• Er staan nog enkele actiepunten open:<ul style="list-style-type: none">○ Aanleveren areaal / locaties waar beplantingsonderhoud uitgevoerd moet worden, gebied Centrum en West 2022-2023	[REDACTED]
3	Agendapunten <ul style="list-style-type: none">• Afrekening termijn 2 afgerond? Termijn 2 is afgerond, afgesproken om de 40 uur inzet van de snoeiploeg voor 2022 dit jaar te factureren op termijn 3 en de uitvoering begin januari uit te voeren. BK doet voorstel voor afrekening• Opstellen deelopdracht 3 [REDACTED] maakt in Digitree deelopdracht 3 aan, hierin worden alle te onderhouden bomen opgenomen. Afgesproken dat eventuele onderhoudssnoei bomen met aanvaard boombeeld op achterstallig gezet worden.	[REDACTED] [REDACTED]



- **Planning**
Op basis van de deelopdracht stelt BK de planning op. In de planning staat aangegeven in welke week in welk dorp wordt gewerkt. ■
- **Praktijkdag**
In het bestek is één praktijkdag voorzien echter voor een meerjarige overeenkomst is dit niet reëel aangezien binnen de organisatie redelijkerwijs personeelwisselingen kunnen voorkomen. Afgestemd wordt dat er jaarlijks voor uitvoering van de deelopdracht een praktijkdag vanuit het bestek geregeld wordt. BK geeft aan dat Cristiaan Zoodsma sinds kort als ETW in dienst is bij Frisia en ook werkzaamheden in Dantumadiel uit gaat voeren. Datum voor de praktijkdag 2023 vooreerst vastgesteld op dinsdag 17 januari. ■
- **Digitree**
De rechten en lijst met inspecteurs is voor 2023 niet volledig. LR past dit aan en communiceert dit met de support afdeling van Digitree ■

4 **Vaststellen volgend overleg, wvttk, rondvraag en sluiting**

Verkeersplan uitvoering deelopdracht 3, er hoeft geen nieuw verkeersplan gemaakt te worden wel ontvangt de directie een overzicht van de hoeveelheid in te zetten verkeersmaatregelen. Indien de inzet van verkeersregelaars gewenst is, ontvangt de directie hiervoor de locaties en in te zetten uren. ■

Verder zijn er geen aanvullende zaken. Het volgende overleg is de praktijkdag op 17 januari 2023. Aan de hand van de ingediende planning worden de overige overleggen vastgesteld.

5 **Algemeen**

Hieronder van de betrokkenen de mailadressen, telefoonnummers en rollen:

- [redacted]@noardeast-fryslan.nl / [redacted]
- J [redacted]@noardeast-fryslan.nl / [redacted]
(aanwezig: ma, di, wo, vr)
- [redacted]@noardeast-fryslan.nl / [redacted]
(aanwezig: ma, di, wo, do)
- [redacted]@frisiabergum.nl / [redacted]
hoofduitvoerder
- [redacted]@piusfloris.nl / [redacted]
uitvoerder
- [redacted]@heldergroenadvies.nl / [redacted] / extern
directievoerder
- [redacted]@heldergroenadvies.nl / [redacted] /
extern toezichthouder





Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:51:33

Van: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Mon, 9 Jan 2023 15:05:52

Verzonden: Mon, 9 Jan 2023 16:04:24

Aan: [redacted]

Cc: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

Onderwerp: FW: Verslag BV 4, deelopdracht gebied West, Digitree

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[20221222 Hoeveelheden DO 3.xlsx](#); [20221222 Verslag BV04 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel \(Frisia\).docx.pdf](#);

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Goedemiddag [redacted],

Ik was in mijn enthousiasme vergeten het verslag in de bijlage te doen, bij deze alsnog.

Van digitree support heb ik de volgende inlog gegevens voor [redacted] ontvangen:

gebruikersnaam: [redacted]

Wachtwoord: [redacted]

Voor de bestaande gebruikers zijn de gegevens ongewijzigd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
European Tree Technician
Groentechnisch specialist
[redacted]
[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)
www.heldergroenadvies.nl



Van: [redacted] | Heldergroen advies

Verzonden: donderdag 22 december 2022 15:55

Aan: [redacted]@piusfloris.nl>

CC: [redacted]@noardeast-fryslan.nl>; [redacted]@noardeast-fryslan.nl>; [redacted] |

Heldergroen advies <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>

Onderwerp: Verslag BV 4, deelopdracht gebied West, Digitree

Goedemiddag [REDACTED],


Het was even blijven liggen maar hierbij het verslag van BV 4.

Voor het de te onderhouden bomen in gebied West heb ik deelopdracht 3 aangemaakt, zoals in het overleg besproken heb ik de bomen met onderhoudsnoei beeld aangepast naar achterstallig. Op de viewer van Digitree kun je de deelopdracht inzien, in de bijlage het excel met hoeveelheden.

Het gaat om de volgende hoeveelheden:

Aantal bomen	OHT					
Boomhoogte	BGS	BGS	BGS	OHS		
beeld	achterstallig	verwaarloosd	achterstallig	Eindtotaal		
0-6 m	217	29		19		265
6-9 m	149	140		5	44	338
9-12 m	156	293		4	91	544
12-15 m	1	55		1	237	294
15-18 m		5			72	77
18-24 m					1	1
Eindtotaal	523	522	10	464		1519

Op kaart ziet het er als volgt uit:

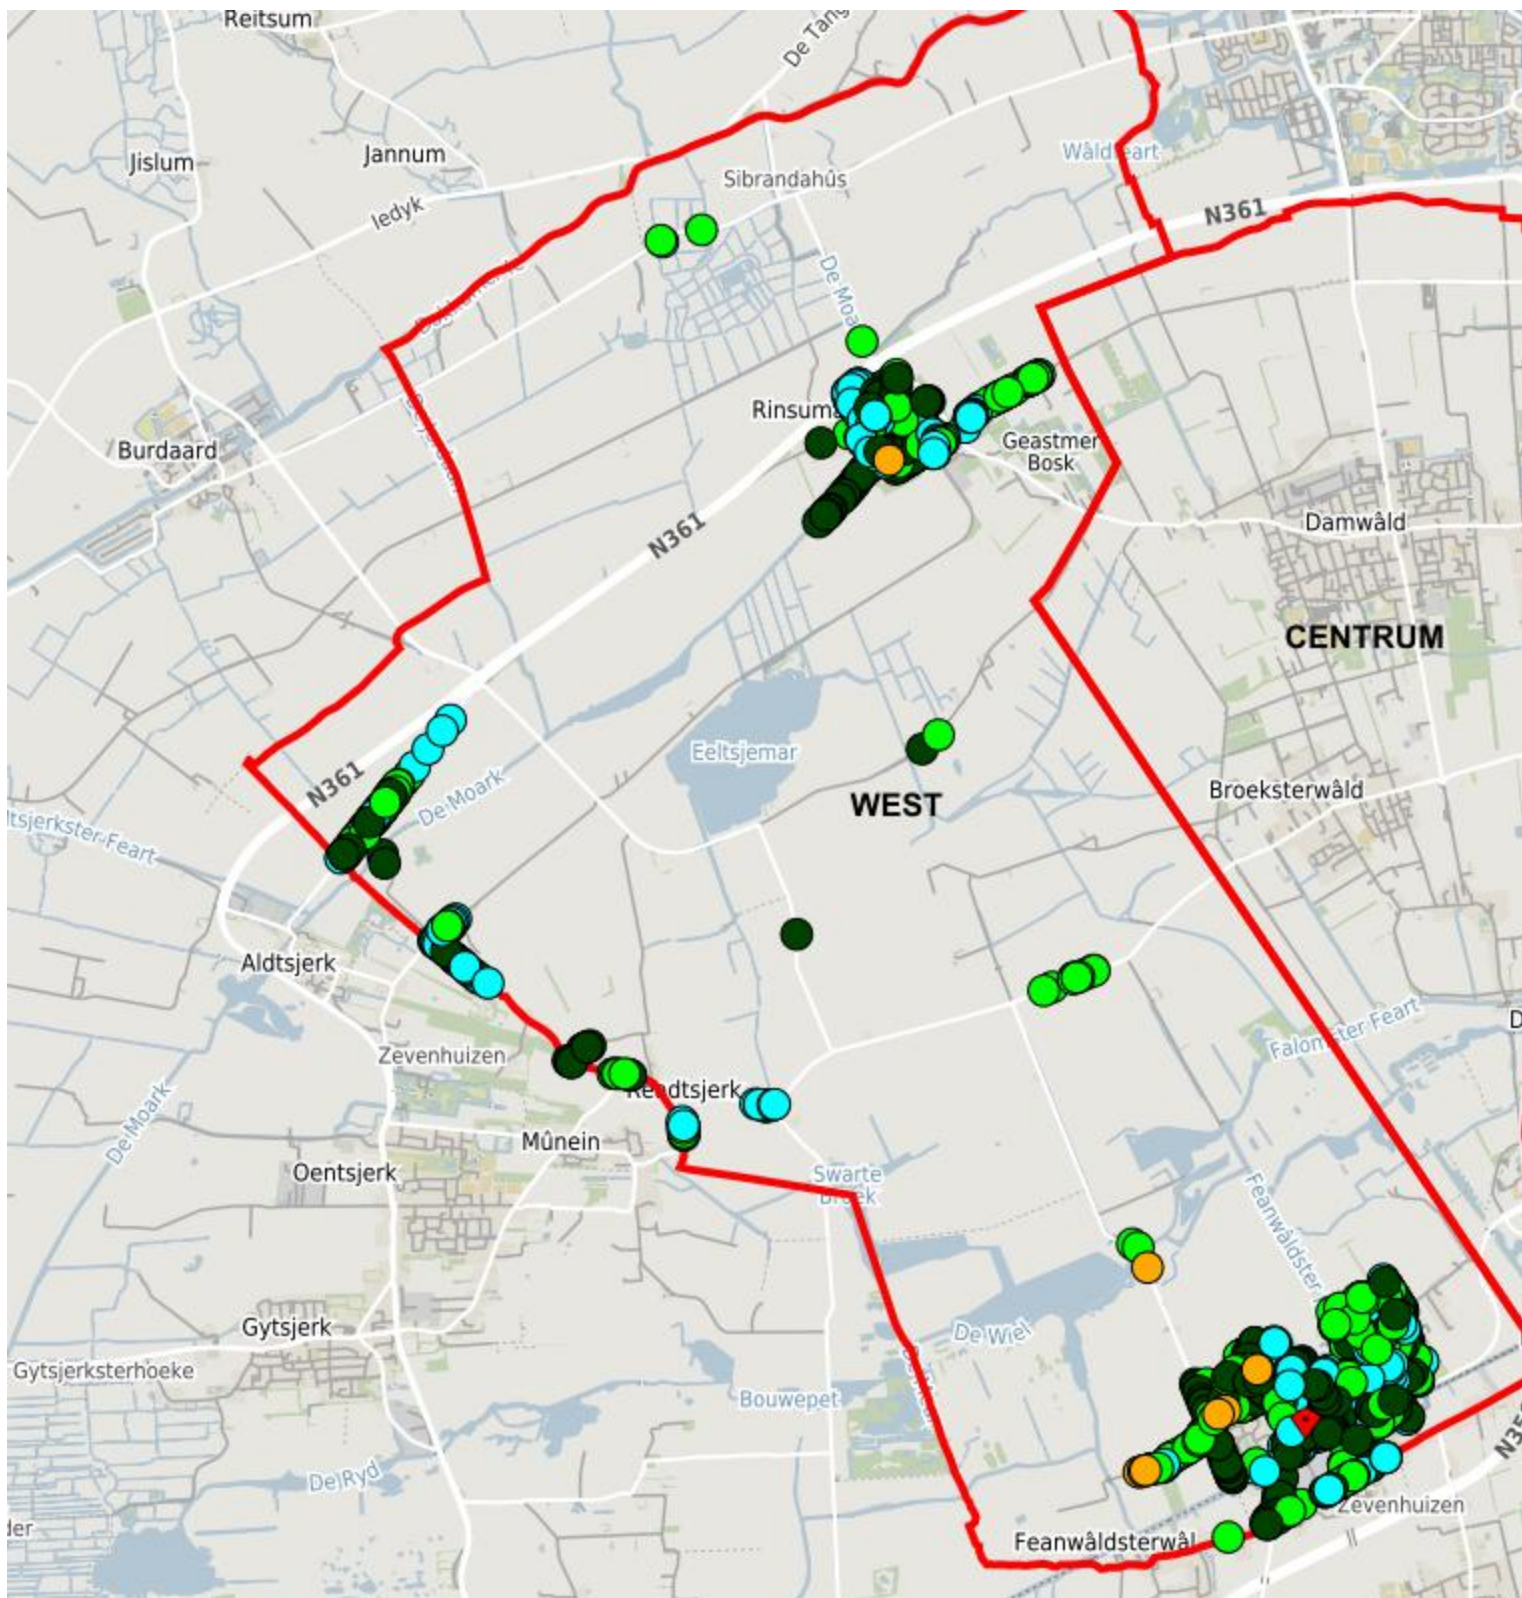

Zou je op basis van deze gegevens een planning op willen stellen en aangeven hoeveel verkeersmaatregelen je hiervoor in wilt zetten.

Ik heb een mail gestuurd naar de support afdeling van Digitree met het verzoek een inlog aan te maken voor [REDACTED] voor jou en [REDACTED] is er al een inlog. Verder heb ik jouw naam als contactpersoon doorgegeven.

Succes, bij vragen hoor ik het graag,

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
European Tree Technician
Groentechnisch specialist

[REDACTED]
[@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
[REDACTED]
[@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)
www.heldergroenadvies.nl



Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:51:52

Van: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Thu, 19 Jan 2023 16:34:38

Verzonden: Thu, 19 Jan 2023 17:34:22

Aan: [redacted]

Cc: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

Onderwerp: RE: Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023

Urgentie: Normal

Precisie: None

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Goedemiddag [redacted]

We hebben het verkeersplan beoordeeld, en zien dit graag iets gedetailleerder. Als je kijkt op de bijlage Overzichtstekening ontsluitingswegen gemeente Dantumadiel zijn er verschillende weg typen. Zou je per voorkomend weg type aan willen geven welk figuur nummer je toepast. Jullie verwijzen nu naar fig. 1223b, dit is nogal een zware maatregel die het huidige gebied niet strikt noodzakelijk is en veelal eenvoudiger opgelost kan worden met meer passende figuurnummers.

In de planning staan 13 weken opgenomen om 1519 bomen te onderhouden wat neerkomt op gemiddeld 23 bomen per dag. Da's een vrij ruime planning, zou je deze wat scherper neer willen zetten en er rekening mee houden dat de werkzaamheden aan één stuk achtereen uitgevoerd moeten worden.

Zou je voor het financiële overzicht de inschrijfstaat in willen vullen met de aangeleverde hoeveelheden? Er zijn ten opzichte van de geraamde hoeveelheden voor rayon West wat wijzigingen doorgevoerd welke we qua kosten graag inzichtelijk hebben.

Ik zie de aangepaste stukken tegemoet, mocht je vragen hebben hoor ik het graag,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Toezichthouder
[redacted]
[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)
www.heldergroenadvies.nl



Van: [redacted]@piusfloris.nl>

Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 14:08

Aan: [redacted] | [Heldergroen advies](#) <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>; [redacted]@noardeast-fryslan.nl>

Onderwerp: Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023

Hallo [redacted]

Bijgaand de planning en verkeersplan voor deel opdracht 3 2023.

Planning

Dinsdag 17 januari straten we met de cursus dag daarbij zijn aanwezig de onderstaande namen;

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

De Adres waar de hoogwerker word gelost is *De hoek 10 te FeanWalden*


Verkeersplan

Net zo als het voorafgaande jaar gaan we gebruik maken van CROW 96B figuur 1323A en figuur 1323B.

De werk in uitvoeringborden voor het einde werkvak zullen niet worden gebruikt.

Digitree

Graag ontvang ik van [redacted] de download code zodat ik de veldlaptop gereed kan maken voor de snoeibestek.

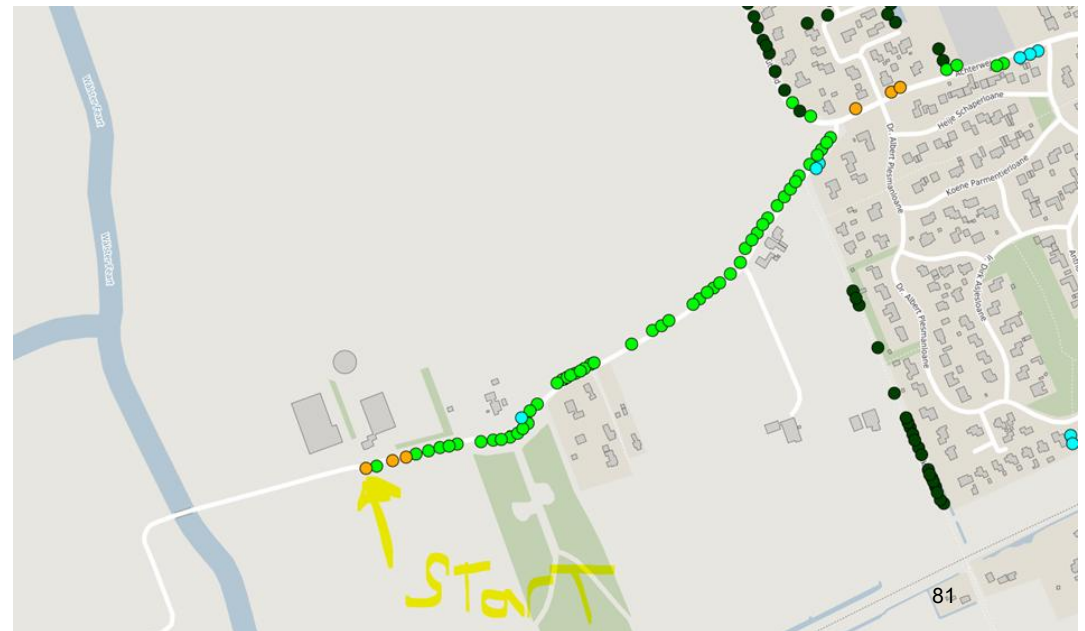

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M +31 (0)6 83 44 78 38

[REDACTED]
T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Project: RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel
Nummer: NE_2022_21
Aanwezig: Gemeente Dantumadiel
Frisia
Heldergroen advies
Afwezig: Gemeente Dantumadiel
Heldergroen advies
Datum: 14 februari 2023 (8.30 uur gemeentewerf, Damwâld)
Onderwerp: Verslag overleg BV05 Bestek onderhoud bomen 2022-2024, Dantumadiel

<i>Nummer</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Actie</i>
1	Opening <ul style="list-style-type: none">• [redacted] opent de vergadering.• [redacted] en [redacted] zijn met kennisgeving afwezig.	
2	Vaststellen verslag en agendapunten <ul style="list-style-type: none">• Agenda is akkoord• Verslag BV04 is akkoord en wordt vastgesteld.• Verslag praktijkdag is akkoord en wordt vastgesteld.• [redacted] scant beide getekende documenten en mailt ze naar aanwezigen [redacted]• Openstaande actiepunten :<ul style="list-style-type: none">○ Aanleveren geïndexeerde inschrijfstaat rayon West Indexatie is correct doorgevoerd, verrekening van F&F en staartposten nog aanpassen naar percentages. De afdracht van de RAW bijdrage is reeds bij aanvang in het geheel voldaan, dit hoeft er nu niet meer bij op.○ Aanleveren aangepast verkeersplan Aangepaste plan is akkoord.	
3	Agendapunten <ul style="list-style-type: none">• Planning / voortgang Werk verloopt vooralsnog volgend planning	



- Gebruik Digitree
Registratie in het veld met Digis gaat goed, er wordt geregeld geüpload naar de viewer. Voor het maken van week-, en termijnstaten kan het beste een export gemaakt worden uit Digis. ■ heeft dit vorig jaar ook ■ al eerder gedaan en weet hoe dit moet.
- Verkeersmaatregelen
■ het gaat goed, geen bijzonderheden. ■ er zijn geen klachten binnen gekomen bij de gemeente.
- V&G
Geen bijzonderheden
- F&F
Geen bijzonderheden aangetroffen, dit is nu nog niet vastgelegd. Dit moet wel, ■ draagt hier zorg voor. De ingevulde formulieren mogen bij afronding van de deelopdracht als één gescand document aangeleverd worden. ■
- Kwaliteit uitgevoerd werk
Uitgevoerde snoeiwerk ziet er goed uit, wel aandacht voor de juiste afstand tot de takkraag. Bij enkele bomen is het iets te lang. Voor het muteren / afmelden is het van belang om alleen bomen af te melden die in het geheel gesnoeid zijn.
- Indien week-, en termijnstaten
■ stuurt elke maandag een overzicht van aantal gesnoeide bomen en globaal in welk gebied. Uren inzet onderhoud beplanting en eventuele bijzonderheden. ■
De eerste vier weken zitten erop, er moet een termijn opgemaakt worden ■ gaat hiermee aan de slag, en stuurt deze naar CK. ■

4

Rondvraag en sluiting

- ■ het komt af en toe voor dat de boomhoogte afwijkt. LR: als het om meerdere bomen gaat dit graag melden in de app.
- ■ aan de zuidzijde van de Zwette zit veel grof afgestorven hout in de bomen. ■, deze bomen zijn eigendom van de gemeente Tietjerksteradeel ■, stuurt mail naar bombeheerder. ■
- ■ boomnummer NT801 en 802 komen te vervallen uit de opdracht, hier ligt een specifieke snoei/ verankeropdracht voor.



- BK vraagt of het akkoord is dat in week 9 i.v.m. de voorjaarsvakantie de werkzaamheden een week stil liggen. Dit is akkoord.

Voor akkoord ondertekend, d.d. 14 - 03 - 2023


Gemeente Dantumadiel



.....



Frisia groenvoorziening BV



....



Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:52:38

Van: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Tue, 14 Feb 2023 11:18:09

Verzonden: Tue, 14 Feb 2023 12:17:24

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[VGWM plan snoeibestek gem Dantumadiel 2023.pdf](#); [Financiële overzicht 2023 rayon west.pdf](#);

Met vriendelijke groet [redacted]

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: [redacted]@piusfloris.nl>

Datum: 10-02-2023 12:05 (GMT+01:00)

Aan: [redacted] | Heldergroen advies <[redacted]@heldergroenadvies.nl>

Onderwerp: RE: Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023

Goedemiddag [redacted]

Hierbij ontvang je de nieuwe documenten die aan zijn gepast aan de onderstaande mail.

Bij vragen hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
European Tree Worker
M [redacted]



T [redacted]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [redacted]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [redacted]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Van: ██████████ | HelderGroen advies <██████████@heldergroenadvies.nl>
Verzonden: donderdag 2 februari 2023 12:53
Aan: ██████████ <██████████@piusfloris.nl>; ██████████ <██████████@noardeast-fryslan.nl>
CC: ██████████ | HelderGroen advies <██████████@heldergroenadvies.nl>
Onderwerp: RE: Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023

Goedemiddag ██████████

Dank voor de aangeleverde stukken.

M.b.t. tot het financiële overzicht het volgende:

- Bij post 501010 en 501020 staat nu de geïndexeerde prijs per eenheid op basis van de inschrijfstaat, deze is gebaseerd op het totaal aantal bomen over drie jaar. We voeren dit jaar ongeveer één derde uit, je kan dan ook maar een deel van dit bedrag in rekening brengen. (zie bestek deel 3 64 17 01)
- Het is prima om de posten soortspecifiek en markeren te vullen met hoeveelheden. Ze mogen echter alleen toegekend worden als ze daadwerkelijk ingevuld / uitgevoerd zijn.
- Zou je voor de volledigheid ook de startkosten toe willen voegen aan het overzicht

Verkeersplan:

- Het verkeersplan heeft als doel vast te leggen welke verkeersmaatregelen je op welke locatie toepast om het voor de weggebruiker en je eigen medewerkers zo'n veilig mogelijke situatie te maken. Waar het mij en de opdrachtgever om gaat is dat we weten hoe en met welke figuurnummers je de situatie oplost. Als voorbeeld, welk figuurnummer pas je toe in de kom van Feanwâlden en Rinsumageest, wat doe je op de doorgaande wegen tussen de dorpen en is het ergens noodzaak om gecertificeerde verkeersregelaars in te zetten.
- Zou je in het plan een datum op willen nemen wanneer het gemaakt is.

Zou je e.e.a. aan willen passen, mocht je vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,



██████████
European Tree Technician
Groentechnisch specialist
██████████
██████████@heldergroenadvies.nl

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
██████████@heldergroenadvies.nl
www.heldergroenadvies.nl

Van: ██████████ <██████████@piusfloris.nl>
Verzonden: maandag 30 januari 2023 09:00
Aan: ██████████ | HelderGroen advies <██████████@heldergroenadvies.nl>; ██████████ <██████████@noardeast-fryslan.nl>
CC: ██████████ | HelderGroen advies <██████████@heldergroenadvies.nl>
Onderwerp: RE: Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023

Goedemorgen ██████████,

In deze mail beantwoord ik de volgende vragen; aanpassen Verkeersplan, Maken van een nieuw planning en het maken van een financiële overzicht.

Verkeersplan

Bijgaand een VGWM Plan met daarin de nieuwe verkeersplannen die meer betrekkingen hebben op de weg types. In de voorafgaande bouw vergadering bij ons in de vergaderzaal hadden we het er over gehad dat wij het zelfde verkeersplan mochten versturen. Nu begrijp ik dat het niet volledig aansluit aan de

verkeer types.

Planning

Telefonische hebben ik contact gehad met Lutein. Daarin hebben we besproken dat de meegezonden planning in mijn ogen een redelijke planning is. Nu dat we een stukje extra werk aan het doen zijn lijkt het mij niet nodig om een nieuw planning te maken.

Financiële overzicht

Bijgaand heb ik een financiële overzicht mee verstuurd. Dit overzicht is op basis van de meegezonden aantallen. Deze aantallen hebben we ook verwerkt in het nieuw VGWM plan. In het financiële overzicht zijn wij uit gegaan van een index van 14,93 %. Het percentage hebben wij berekend met de formule die terug te vinden is in het bestek. Ook staat de formule op het document dit zodat er dan een goed overzicht ontstaat.

De bonus regeling hebben wij niet toegepast in het financiële overzicht.

Bij verdere vragen horen wij het graag!

Met vriendelijke groet,

██████████
Projectleider
European Tree Worker
M ██████████

██████████
T ██████████
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T ██████████
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T ██████████
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Van: ██████████ | Heldergroen advies <██████████@heldergroenadvies.nl>

Verzonden: donderdag 19 januari 2023 16:34

Aan: ██████████g@piusfloris.nl>

CC: ██████████@noardeast-fryslan.nl>; ██████████@noardeast-fryslan.nl>; ██████████ | Heldergroen advies
<██████████@heldergroenadvies.nl>

Onderwerp: RE: Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023

Goedemiddag ██████████

We hebben het verkeersplan beoordeeld, en zien dit graag iets gedetailleerder. Als je kijkt op de bijlage Overzichtstekening ontsluitingswegen gemeente Dantumadiel zijn er verschillende weg typen. Zou je per voorkomend weg type aan willen geven welk figuur nummer je toepast. Jullie verwijzen nu naar fig. 1223b, dit is nogal een zware maatregel die het huidige gebied niet strikt noodzakelijk is en veelal eenvoudiger opgelost kan worden met meer passende figuurnummers.

In de planning staan 13 weken opgenomen om 1519 bomen te onderhouden wat neerkomt op gemiddeld 23 bomen per dag. Da's een vrij ruime planning, zou je deze wat scherper neer willen zetten en er rekening mee houden dat de werkzaamheden aan één stuk achtereen uitgevoerd moeten worden.

Zou je voor het financiële overzicht de inschrijfstaat in willen vullen met de aangeleverde hoeveelheden? Er zijn ten opzichte van de geraamde hoeveelheden voor rayon West wat wijzigingen doorgevoerd welke we qua kosten graag inzichtelijk hebben.

Ik zie de aangepaste stukken tegemoet, mocht je vragen hebben hoor ik het graag,

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Toezichthouder
[Redacted]
[\[Redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[Redacted]@heldergroenadvies.nl)

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
[\[Redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[Redacted]@heldergroenadvies.nl)
www.heldergroenadvies.nl




Van: [Redacted] [@piusfloris.nl](mailto:[Redacted]@piusfloris.nl)

Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 14:08

Aan: [Redacted] | Heldergroen advies <[\[Redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[Redacted]@heldergroenadvies.nl)>; [Redacted] [@noardeast-fryslan.nl](mailto:[Redacted]@noardeast-fryslan.nl)

Onderwerp: Planning + verkeersplan Boomonderhoud Dantumadiel 2023

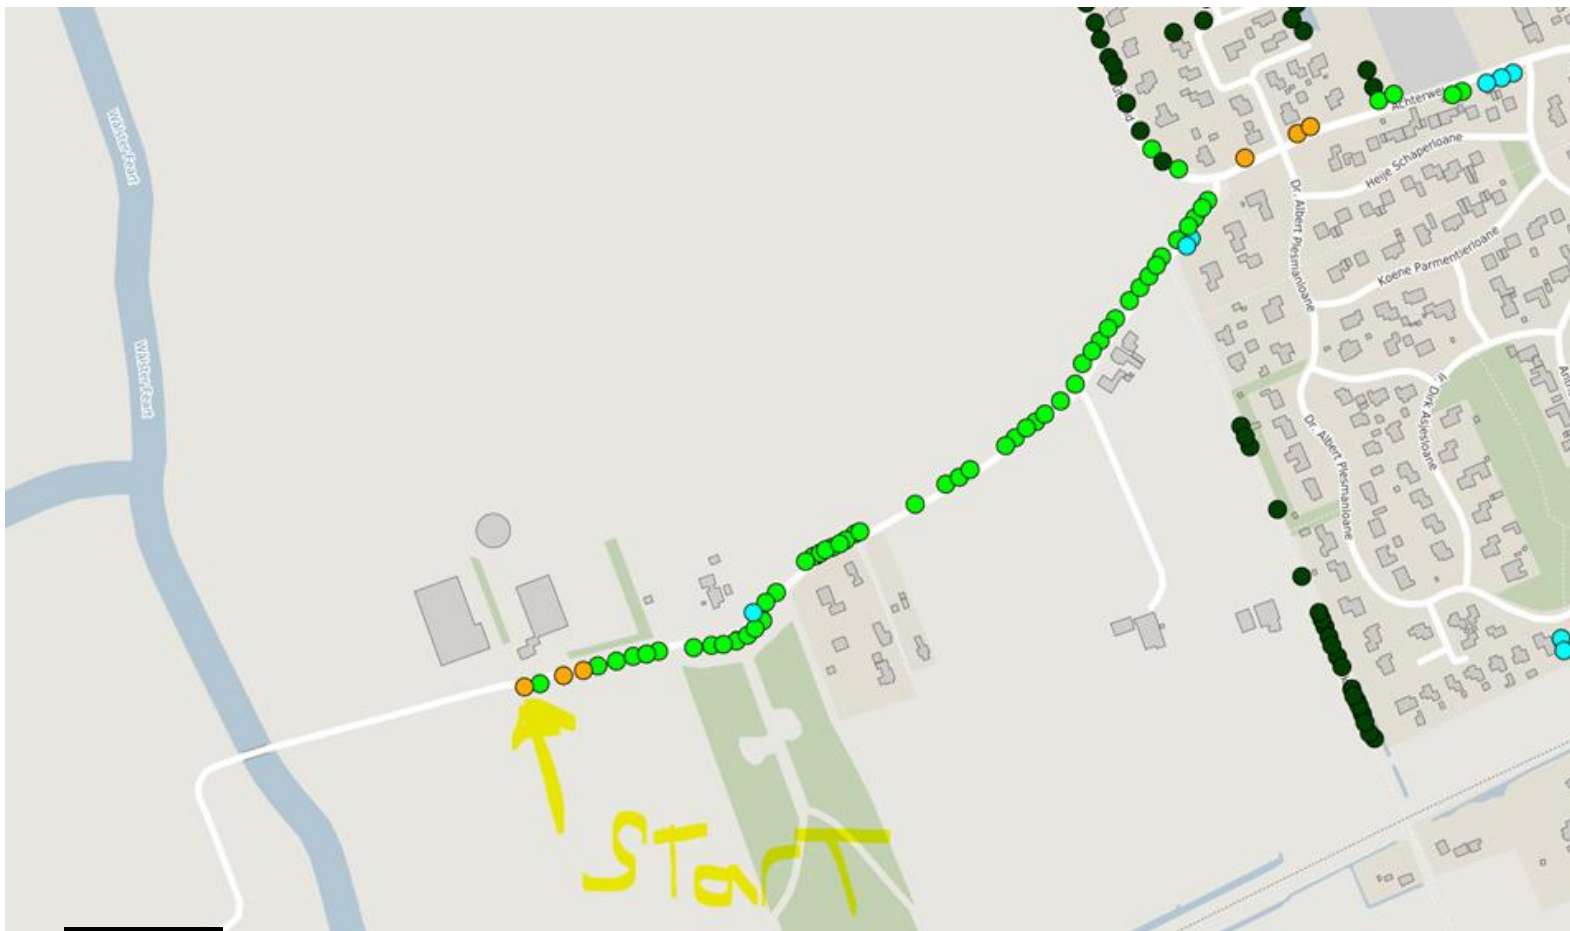

Hallo [Redacted]

Bijgaand de planning en verkeersplan voor deel opdracht 3 2023.

Planning

Dinsdag 17 januari straten we met de cursus dag daarbij zijn aanwezig de onderstaande namen;

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]e

De Adres waar de hoogwerker word gelost is *De hoek 10 te FeanWalden*

Verkeersplan

Net zo als het voorafgaande jaar gaan we gebruik maken van CROW 96B figuur 1323A en figuur 1323B.

De werk in uitvoeringborden voor het einde werkvak zullen niet worden gebruikt.

Digitree

Graag ontvang ik van [REDACTED] de download code zodat ik de veldlaptop gereed kan maken voor de snoeibestek.


Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

[REDACTED]
T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

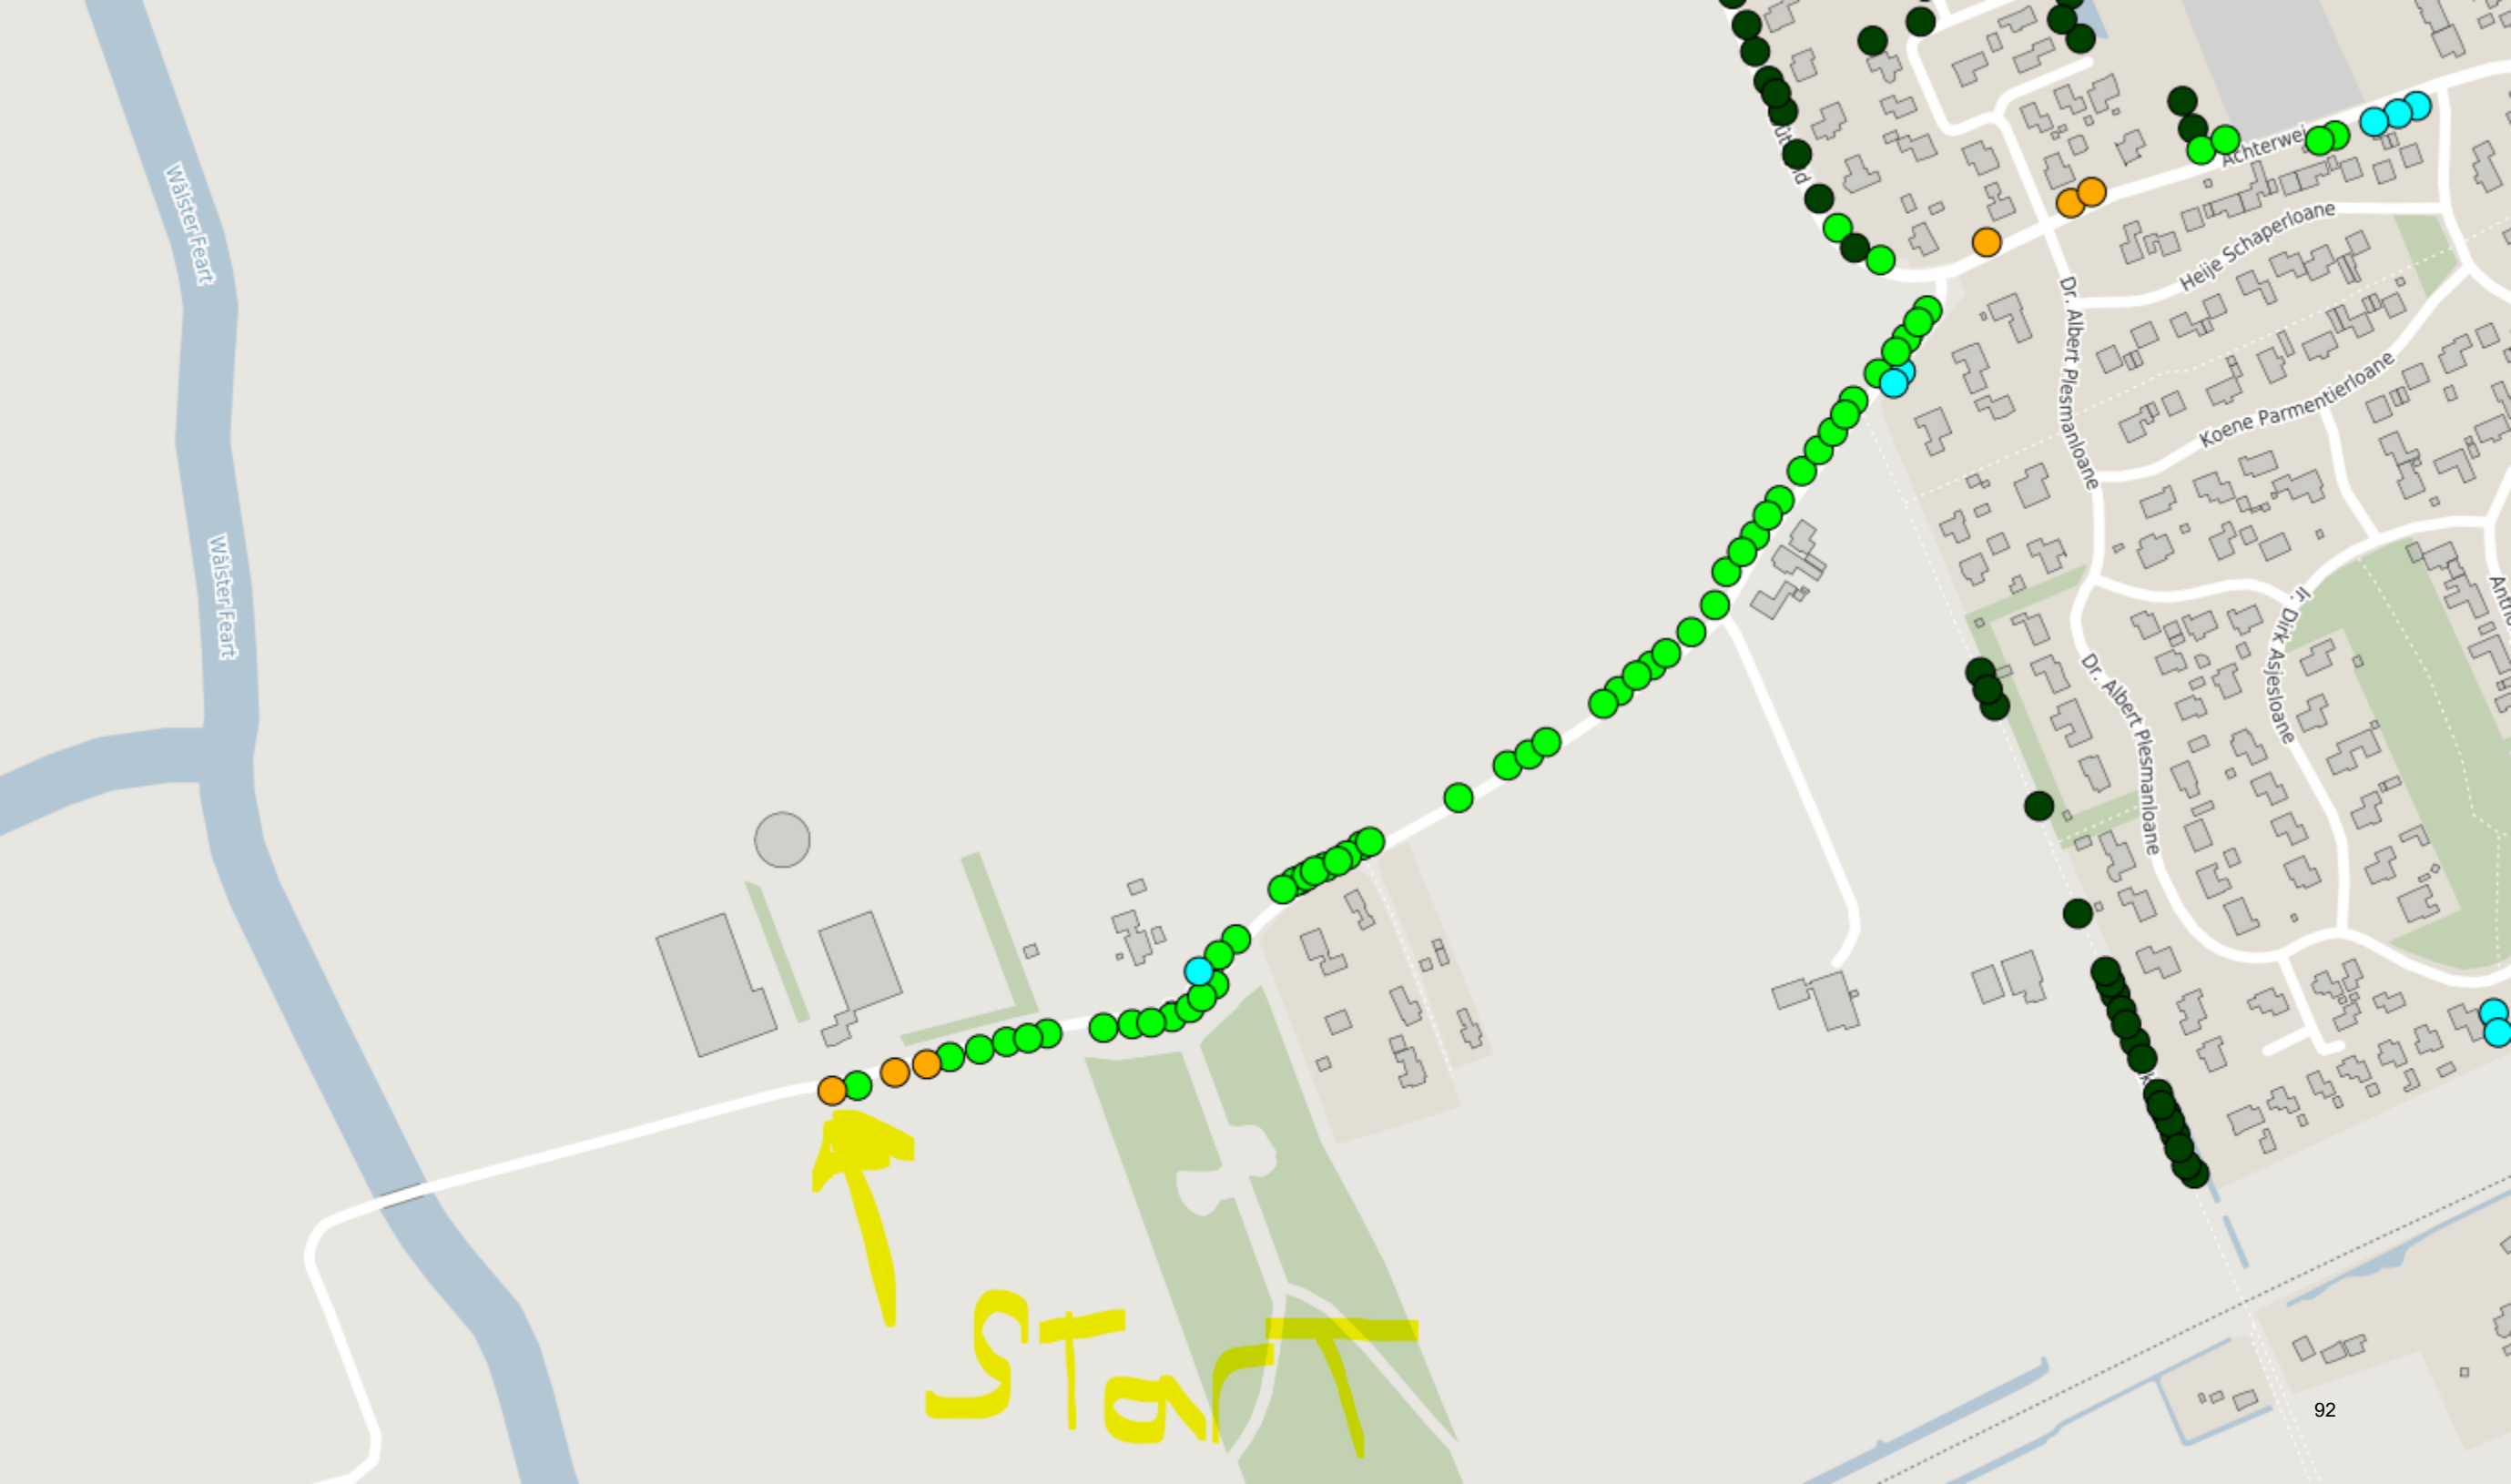

Wâlderfeart

Wâlderfeart

Dijkstra

Achterwei

Heije Schaperloane

Koene Parmentierloane

Dr. Albert Pleismanloane

Dr. Albert Pleismanloane

Il. Dirk Asjesloane

Start

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:53:25

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Tue, 21 Feb 2023 08:45:18

Verzonden: Tue, 21 Feb 2023 09:45:05

Aan: [REDACTED]

Cc: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

Onderwerp: 4e Termijn Gemeente Dantumadiel, onderhoud bomen 2022-2024

Urgentie: Normal

Precisie: None

Hallo [REDACTED]

We hebben van Frisia de vierde termijn gekregen. [REDACTED] belde me nog dat er een foutje in de indexering zat. Daarnaast vielen ons een aantal punten op, namelijk:

1. In de op de viewer administratief gecontroleerde gegevens zitten 39 fouten op 322 mutaties, dit betreft o.a. dood hout en takken, takvrije zone en tijdelijk verhoogd risico of een combinatie van voorgaande.
2. De uitvoering is gestart in week 3 en loopt tot week 6, boven de termijn staat 13-dec-2022 T/M 17-feb-2023. In deze periode zijn volgens de weekrapporten 322 bomen gesnoeid. Op de nu aangeleverde termijn staan 390 stuks, er is waarschijnlijk een week teveel meegenomen.
3. De hoeveelheden voor mutaties en F&F worden niet meegenomen.
4. Bij de staatkosten zijn de volledige hoeveelheden voor de gehele deelopdracht 4 opgenomen wel op basis van de door mij aangeleverde percentages.

Hieronder de hoeveelheden die gemuteerd zijn in termijn 4

dat nieuw (Meerdere items)

Aantal van boomid	Kolomlabels	BGS	BGS	OHS		
Rijlabels	BGS beeld	achterstallig	verwaarloosd	achterstallig	Eindtotaal	
0-6 m		147	14		5	166
6-9 m		15	36	3	1	55
9-12 m		4	54		1	59
12-15 m			11		15	26
15-18 m			1		14	15
18-24 m					1	1
Eindtotaal		166	116	3	37	322

Hoe wil je dat we om gaan met de afwijkingen in de mutaties? Het is voldoende om de prestatiebeloning in te houden. De uitvoering buiten ziet er verder goed uit.

Vind het wel erg slordig allemaal. Maar een signaal afgeven en de beloning inhouden? Hoor graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] I Helder groen advies

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@piusfloris.nl](mailto:[REDACTED]@piusfloris.nl)>

Verzonden: maandag 20 februari 2023 10:36

Aan: [REDACTED] | Helder groen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>

CC: [REDACTED] | Helder groen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>

Onderwerp: 4e Termijn Gemeente Dantumadiel, onderhoud bomen 2022-2024 1502/22

Goedemorgen [REDACTED],

Hierbij ontvang je de 4^e termijn van Gem Dantumadiel. Dit is de eerste van 2023.

Graag ontvangen wij een getekend exemplaar retour.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

Project: RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel
Nummer: NE_2022_21
Aanwezig: Gemeente Dantumadiel [REDACTED]
Frisia [REDACTED]
[REDACTED]
Heldergroen advies [REDACTED]
Afwezig : Gemeente Dantumadiel [REDACTED]
Heldergroen advies [REDACTED]
Datum: 14 februari 2023 (8.30 uur gemeentewerf, Damwâld)
Onderwerp: Verslag overleg BV05 Bestek onderhoud bomen 2022-2024, Dantumadiel

<i>Nummer</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Actie</i>
1	Opening <ul style="list-style-type: none">• LR opent de vergadering.• PB en CK zijn met kennisgeving afwezig.	
2	Vaststellen verslag en agendapunten <ul style="list-style-type: none">• Agenda is akkoord• Verslag BV04 is akkoord en wordt vastgesteld.• Verslag praktijkdag is akkoord en wordt vastgesteld.• SD scant beide getekende documenten en mailt ze naar aanwezigen• Openstaande actiepunten :<ul style="list-style-type: none">○ Aanleveren geïndexeerde inschrijfstaat rayon West Idexatie is correct doorgevoerd, verrekening van F&F en staartposten nog aanpassen naar percentages. De afdracht van de RAW bijdrage is reeds bij aanvang in het geheel voldaan, dit hoeft er nu niet meer bij op.○ Aanleveren aangepast verkeersplan Aangepaste plan is akkoord.	SD
3	Agendapunten <ul style="list-style-type: none">• Planning / voortgang Werk verloopt vooralsnog volgend planning	



- **Gebruik Digitree**
Registratie in het veld met Digis gaat goed, er wordt geregeld geüpload naar de viewer. Voor het maken van week-, en termijnstaten kan het beste een export gemaakt worden uit Digis. BK heeft dit vorig jaar ook al eerder gedaan en weet hoe dit moet. *BK*
- **Verkeersmaatregelen**
BK: het gaat goed, geen bijzonderheden. SD: er zijn geen klachten binnen gekomen bij de gemeente.
- **V&G**
Geen bijzonderheden
- **F&F**
Geen bijzonderheden aangetroffen, dit is nu nog niet vastgelegd. Dit moet wel, BK draagt hier zorg voor. De ingevulde formulieren mogen bij afronding van de deelopdracht als één gescand document aangeleverd worden. *BK*
- **Kwaliteit uitgevoerd werk**
Uitgevoerde snoeiwerk ziet er goed uit, wel aandacht voor de juiste afstand tot de takkraag. Bij enkele bomen is het iets te lang. Voor het muteren / afmelden is het van belang om alleen bomen af te melden die in het geheel gesnoeid zijn.
- **Indienen week-, en termijnstaten**
BK stuurt elke maandag een overzicht van aantal gesnoeide bomen en globaal in welk gebied. Uren inzet onderhoud beplanting en eventuele bijzonderheden. *BK*
De eerste vier weken zitten erop, er moet een termijn opgemaakt worden. BK gaat hiermee aan de slag, en stuurt deze naar CK. *BK*

4 Rondvraag en sluiting

- BK: het komt af en toe voor dat de boomhoogte afwijkt. LR: als het om meerdere bomen gaat dit graag melden in de app.
- BK: aan de zuidzijde van de Zwette zit veel grof afgestorven hout in de bomen. SD, deze bomen zijn eigendom van de gemeente Tietjerksteradeel. SD, stuurt mail naar bombeheerder. *SD*
- BK: boomnummer NT801 en 802 komen te vervallen uit de opdracht, hier ligt een specifieke snoei/ verankeropdracht voor.



- BK vraagt of het akkoord is dat in week 9 i.v.m. de voorjaarsvakantie de werkzaamheden een week stil liggen. Dit is akkoord.

Voor akkoord ondertekend, d.d. _____ - _____ - 2023

Gemeente Dantumadiel

Frisia groenvoorziening BV

.....

.....

██████████

██████████



Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:53:37

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Wed, 22 Feb 2023 16:27:47

Verzonden: Wed, 22 Feb 2023 17:27:02

Aan: [REDACTED]

Cc: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

Onderwerp: Verslag BV 5

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[20230222 Verslag BV05 RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel \(Frisia\).pdf](#)

Goedemiddag heren,

Hierbij het verslag van BV 5. Er staan enkele actiepunten in die nog gedaan moeten worden in de komende periode.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
European Tree Technician
Groentechnisch specialist

[REDACTED] [@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)

Heldergroen advies BV

Vaart N.Z. 50

9401 GN Assen

[REDACTED] [@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)

www.heldergroenadvies.nl



FRISIA BERGUM

Pagina 1 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € 98.198,06

Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 maart 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)							
10	BEGELEIDINGSSNOEI							
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	5,00	V				
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	7,00	V				
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	3,00	V				
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V				
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V				
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V				
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	64,00	V				
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	5,00	V				
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V				
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	154,00	V				
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	159,00	V				
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	1,00	V				
11	ONDERHOUDSSNOEI							
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.							
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V *				
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V				
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V				
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V				
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V				
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	2,00	V				
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)							
20	BECELEIDINGSSNOEI							
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4,00	V				
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V				
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107,00	V				
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	104,00	V				
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	34,00	V				
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3,00	V				

Paraaf

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 2 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € 98.198,06

Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 maart 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	195,00	V				
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	248,00	V				
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	91,00	V				
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V				
21	ONDERHOUDSSNOEI							
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.							
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V				
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	14,00	V				
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	60,00	V				
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	141,00	V				
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	58,00	V				
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	9,00	V				
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)							
30	BEGELEIDINGSSNOEI							
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	5,00	V				
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	1,00	V				
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	64,00	V				
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	199,00	V				
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	132,00	V				
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	94,00	V				
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	14,00	V				
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V				
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	253,00	V				
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	176,00	V				
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V				
31	ONDERHOUDSSNOEI							
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.							
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	4,00	V				
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	24,00	V				
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	89,00	V				

Paraaf opdrachtgever

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 3 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € 98.198,06

Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 maart 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	114,00	V				
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	21,00	V				
4	REGISTRATIE 2022-2024							
40	OPNAME BOOMKENMERKEN							
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.							
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei).	st	4.029,00	V				
5	WERK ALGEMENE AARD 2022-2024							
50	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA							
5010	Inventariseren flora en fauna verkennend							
501010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	V				
501020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V				
5011	Inventariseren flora en fauna soortspecifiek							
501110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	15,00	V				
501120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	15,00	V				
5012	Markeren flora- en faunaplaatsen							
501210	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V				
501220	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V				
6	VERKEERSMAATREGELEN 2022-2024							
60	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK							
6010	Toepassen verkeersmaatregelen							
601010	Toepassen afzetting (2022)	eur	600,00	N				
601020	Toepassen afzetting (2023)	eur	600,00	N				
601030	Toepassen afzetting (2024)	eur	941,75	N				
601040	Toepassen verkeersmaatregelen	eur	574,70	N				
61	VERKEERSREGELAAR							
6101	Bevoegde verkeersregelaars							
610110	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2022).	eur	500,00	N				
610120	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2023).	eur	500,00	N				
610130	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2024).	eur	500,00	N				
7	PRAKTIJKDAG							
70	PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS							
7010	Afstemming ETW's en ETT's							
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V *				
8	INZETTEN 2022-2024							
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V				
	SUBTOTAAL							

Paraaf op

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 4 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € 98.198,06

Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 maart 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
			A	G		
910010	Aanvoerkosten	115,00	N			
910020	Afvoerkosten	115,00	N			
910030	0,00	N			
910040	0,00	N			
910050	0,00	N			
919980	Overige eenmalige kosten	0,00	N			
919990	Korting	0,00	N			
929990	Uitvoeringskosten	1.120,60	N			
939990	Algemene kosten	632,20	N			
949990	Winst en risico	574,70	N			
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	130,53	N			
	SURTOTAAL					

Paraa

FRISIA BERGUM

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024


AANN.SOM : € 98.198,06

Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 maart 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
	OVERSCHRIJDINGEN							
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V				
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V				
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V				
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V				
	TOTAAL OVERSCHRIJDINGEN							



Paraaf op



mer,



FRISIA BERGUM

Pagina 6 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 06 maart 2023

AANNEMINGSSOM:	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM TOT TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN TOT TERMIJN	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN	€	
DEZE TERMIJN EXTRA DECLARATIES	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN EXTRA DECLARATIES T/M TERMIJN	€	
BTW % 21,00 IN TERMIJN	8.389,75 =	€

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum : 09/03/2023

Naam toezichthouder :

Handtekening toezichthouder

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum : 06/03/2023

Naam uitvoerder :

Handtekening uitvoerder

Van: [redacted] | [Heldergroen advies](#)
E-mailbericht ontvangen om: Thu, 9 Mar 2023 17:53:04
Verzonden: Thu, 9 Mar 2023 18:52:21
Aan: [redacted]
Cc: [redacted] | [Heldergroen advies](#)
Onderwerp: RE: Termijnstaat 1502/22 Gem Dantumadiel onderhoud bomen 2022-2024
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen: [nieuwe inspectie termijn 4.xlsx](#); [20230309 Termijnstaat ondertekend.pdf](#);
Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:54:07

Hallo [redacted]

De geconstateerde onvolkomenheden in de termijnstaat zijn opgelost. Wat niet is opgelost zijn de onvolkomenheden in de viewer. Dat is reden dat de termijn wordt goedgekeurd (en daarmee is ondertekend), maar dat de prestatiebeloning niet wordt toegekend. Ik wil je verzoeken om deze onvolkomenheden in de viewer alsnog aan te passen (anders volgt er boete op deze termijn). Mocht dat nodig zijn (waar ik niet vanuit ga) dan stel ik voor om die in te houden bij de volgende termijn.

We zien de aanpassingen in de viewer graag zsm tegenmoet.

Met vriendelijke groet,
[redacted] | Heldergroen advies

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted]@piusfloris.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 15:02
Aan: [redacted] | Heldergroen advies <[redacted]@heldergroenadvies.nl>
CC: [redacted] | Heldergroen advies <[redacted]@heldergroenadvies.nl>; [redacted] <[redacted]@noardeast-fryslan.nl>; [redacted] <[redacted]@frisiagroep.nl>
Onderwerp: Termijnstaat 1502/22 Gem Dantumadiel onderhoud bomen 2022-2024

Goedemiddag [redacted],

Hierbij ontvang je onze termijnstaat van de eerste 4 weken van dit jaar.

Graag ontvangen wij een getekend exemplaar retour.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
European Tree Worker
M [redacted]

T [redacted]

Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen

<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.piusfloris.nl%2F&data=05%7C01%7Cp.broersma%40noardeast-fryslan.nl%7C2b699bb52eb54771dbac08db20bea87a%7C938c17e33cd94fe690d0a1053a1228b5%7C0%7C0%7C638139775800638643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jwoloqEhQW8PCto9H9xHKZe1jmUE0gdW4EW43TPE4fw%3D&reserved=0>

Van: [REDACTED]
E-mailbericht ontvangen om: Tue, 14 Mar 2023 09:36:24
Verzonden: Tue, 14 Mar 2023 10:36:23
Aan: [REDACTED] [Heldergroen advies](#) [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: getekend exemplaar notulen bouwvergadering
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen: [20230314093917320.pdf](#);
Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:54:56

Heren,

Hierbij het getekende exemplaar van de notulen bouwvergadering bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel

Met vriendelijke groet, Mei Freonlike groetnis, Kind regards

[REDACTED]
Coordinator Dantumadiel West/wnd specialistisch Groen
Eenheid Utfiering Iepenbiere Romte
Werkdagen maandag tm donderdag

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:55:45

Van: [REDACTED]

E-mailbericht ontvangen om: Thu, 13 Apr 2023 07:11:02

Verzonden: Thu, 13 Apr 2023 05:10:46

Aan: [REDACTED] [Heldergroen advies](#) [REDACTED] [Heldergroen advies](#) [REDACTED]

Onderwerp: FW: Week update t/m week 14

Urgentie: Normal

Precisie: None

Goedemorgen Allen,

Het klopt dat wij achterlopen op planning. Er zitten 233 bomen in deze deelopdracht die wij momenteel niet kunnen snoeien aangezien deze gaan bloeden. Iets wat niet wenselijk is. Dat maakt dat we vanaf afgelopen dinsdag nog 335 bomen moesten snoeien. Deze week doen we ongeveer 180 bomen. Volgende week woensdag hopen we de laatste 155 bomen uit de deelopdracht afgerond te hebben.

Planning snoeien van ABC Bomen

De 233 ABC bomen gaan wij begin juni snoeien. Planning is starten 9 juni. Definitieve datum ontvangen jullie eind mei.

Er komt ook nog bij de [REDACTED] vandaag een cursus moet volgen, een iets wat ongelukkig moment.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]



T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken we u dringend ons direct te informeren en om dit bericht en eventuele bijlage(n) te verwijderen, zonder het te kopiëren, door te zenden of op enige andere wijze te openbaren of te gebruiken.

Nieuw! Pius de Podcast Luister hem o.a. [hier](#)



Van: [REDACTED] | Heldergroen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>

Verzonden: woensdag 12 april 2023 10:52

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@piusfloris.nl](mailto:[REDACTED]@piusfloris.nl)> [REDACTED] | Heldergroen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noardeast-frysland.nl](mailto:[REDACTED]@noardeast-frysland.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noardeast-frysland.nl](mailto:[REDACTED]@noardeast-frysland.nl)>

Onderwerp: RE: Week update t/m week 14

Goedemorgen [REDACTED].

Dank voor de update.

In de deelopdracht zitten 1519 te onderhouden bomen, er zijn er nu 951 gesnoeid / gemuteerd. Conform planning ronden jullie deze week de werkzaamheden af, er zijn echter nog 568 te onderhouden bomen. Komt dit goed?

Verder viel het mij op dat er bij de getploodde gegevens in Rinsumageest, grijze stippen staan. Bij deze bomen is het veld met onderhoudstoestand leeg, zou je met [REDACTED] overleggen dat dit aangepast moet worden?

Met vriendelijke groet,

██████████
European Tree Technician
Groentechnisch specialist
██████████
██████████@heldergroenadvies.nl

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
██████████
██████████@heldergroenadvies.nl
www.heldergroenadvies.nl



Van: ██████████ <██████████@piusfloris.nl>

Verzonden: woensdag 12 april 2023 07:33

Aan: ██████████ | Heldergroen advies <██████████@heldergroenadvies.nl>; ██████████ ██████████ <██████████@noardeast-fryslan.nl>; ██████████ | Heldergroen advies <██████████@heldergroenadvies.nl>

Onderwerp: RE: Week update t/m week 14

Goedemorgen Allen,

Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken.


Op de kaart hieronder naast heb ik met een stift doorgehaald wat er tot nu toe af is.

Afgelopen week hebben de snoeiers *H&I* extra werk verricht. Een overzicht van

het extra werk is te vinden in de Bijlage.

Alle bomen in Veenwouden zijn gesnoeid door ██████████ behalve de ABC bomen die last hebben van snoeien in deze periode van het jaar.

Totaal zijn er momenteel **951** bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft ██████████ op vrijdag gedaan.

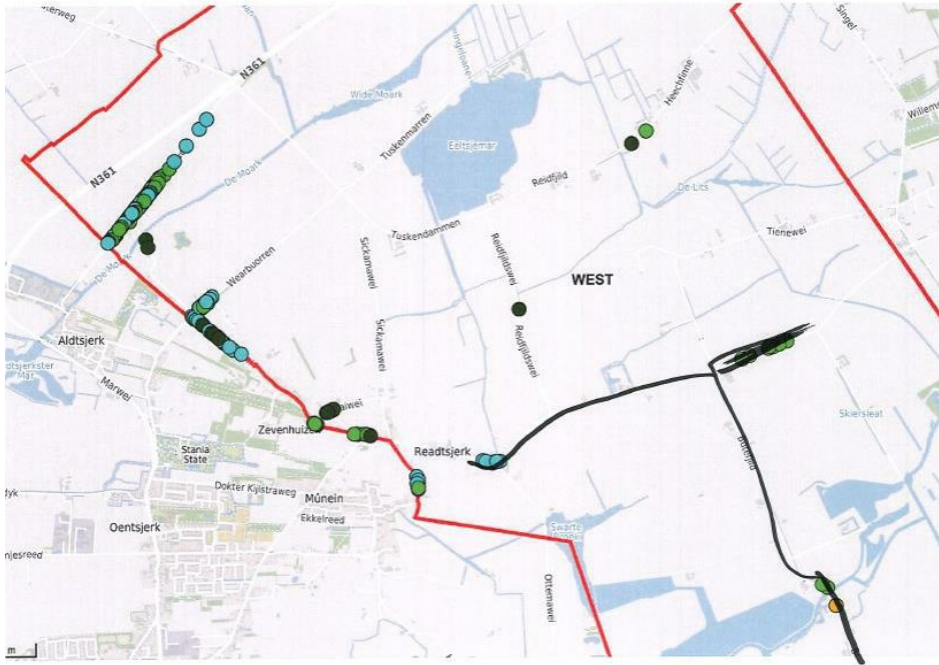



Met vriendelijke groet,

Projectleider
European Tree Worker
M

T
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 3 april 2023 07:40
Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[REDACTED]@noardeast-fryslan.nl)>; [REDACTED] Heldergroen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>
CC: [REDACTED] Heldergroen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>
Onderwerp: RE: Week update t/m week 12

Goedemorgen Allen,

Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken.

Op de kaart hieronder naast heb ik met een stijf doorgehaald wat er tot nu toe af is.

Afgelopen week hebben de snoeiers *Geen* extra werk verricht. Een overzicht van het extra werk is te vinden in de Bijlage.

[REDACTED] is op Vrijdag begonnen in Rinsumageest. Vrijdag heeft [REDACTED] de eerste 50 bomen kunnen snoeien. Vanaf deze week worden er 2 snoeiploegen in gezet, Dit zodat we de achterstand dan in gaan inhalen.

Ook staan veel ABC bomen in de wijken, deze bomen kunnen we deze periode van het jaar niet snoeien.

Totaal zijn er momenteel **681** bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [REDACTED] op vrijdag gedaan.



Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

T [redacted]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [redacted]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [redacted]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken we u dringend ons direct te informeren en om dit bericht en eventuele bijlage(n) te verwijderen, zonder het te kopiëren, door te zenden of op enige andere wijze te openbaren of te gebruiken.

Nieuw! Pius de Podcast Luister hem o.a. [hier](#)



Nu in uw favoriete
podcast-app:
'Pius de Podcast'

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 27 maart 2023 07:51
Aan: [redacted] <[\[redacted\]@noardeast-frysland.nl](mailto:[redacted]@noardeast-frysland.nl)>; [redacted] HelderGroen advies <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>
CC: [redacted] HelderGroen advies <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>
Onderwerp: RE: Week update t/m week 12

Goedemiddag [redacted]

Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken.

Op de kaart hier naast heb ik met een stift doorgehaald wat er tot nu toe af is.

Afgelopen week hebben de snoeier **Geen** extra werk verricht. Een overzicht van

het extra werk is te vinden in de Bijlage. De Eik die bij de sport velden staat wordt niet vergeten, [redacted] weet hiervan en snoeit deze boom zodra hij in de buurt is.

Totaal zijn er momenteel **538** bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [redacted] op vrijdag gedaan.

Planning

Het klopt dat wij een achterstand hebben met de totaal gesnoeide bomen. Deze achterstand komt met name door de vele winderige en slechte dagen van de afgelopen tijd. Hier baken wij ontzettend van. Het is NIET zo dat wij dit project gebruiken als zijde Stop project. De achterstand gaan wij in de laatste 2 weken van de planning in halen. [redacted] Bouwense begint maandag 3 april in Rinsmageast.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
European Tree Worker
M [redacted]

T [redacted]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [redacted]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [redacted]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen



Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 21 maart 2023 12:07
Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[REDACTED]@noardeast-fryslan.nl)>; [REDACTED] Helder groen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>
CC: [REDACTED] Helder groen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>
Onderwerp: RE: Week update t/m week 11

Goedemiddag [REDACTED]

Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken.

Op de kaart hier naast heb ik met een stift doorgehaald wat er tot nu toe af is.

Afgelopen week hebben de snoeier **Geen** extra werk verricht. Een overzicht van

het extra werk is te vinden in de Bijlage.

Totaal zijn er momenteel **448** bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [REDACTED] op vrijdag gedaan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]



[REDACTED]
T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T + [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 13 maart 2023 11:58
Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[REDACTED]@noardeast-fryslan.nl)>; [REDACTED] Helder groen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>
CC: [REDACTED] Helder groen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>
Onderwerp: RE: Week update t/m week 10

Goedemiddag [REDACTED]

Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken.

Op de kaart hier naast heb ik met een stift doorgehaald wat er tot nu toe af is.

Afgelopen week hebben de snoeier **Geen** extra werk verricht. Een overzicht van

het extra werk is te vinden in de Bijlage.

Totaal zijn er momenteel **448** bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [REDACTED] op vrijdag gedaan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

T [redacted]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [redacted]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T + [redacted]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl



Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 14:44
Aan: [redacted] <[\[redacted\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[redacted]@noardeast-fryslan.nl)>; [redacted] Helder groen advies <[\[redacted\]@h\[redacted\].nl](mailto:[redacted]@h[redacted].nl)>
Onderwerp: RE: Week update t/m week 7

Goedemiddag [redacted]

Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken.

Op de kaart hier naast heb ik met een stift doorgehaald wat er tot nu toe af is. Momenteel zijn de

Snoeier bezig aan de Feintensloane 48, 9269 VD Feanwâlden. Afgelopen week hebben de snoeier *Geen* extra werk verricht. Een overzicht van het extra werk is te vinden in de Bijlage.

Totaal zijn er momenteel **432** bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [redacted] op vrijdag gedaan.

In week 9 zijn de snoeiers er een week niet. Dit hebben we besproken in de bouwvergadering.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
European Tree Worker
M [redacted]



T [redacted]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [redacted]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [redacted]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 20 februari 2023 07:05
Aan: [redacted] Helder groen advies <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[redacted]@noardeast-fryslan.nl)>
Onderwerp: FW: Week update t/m week 7

Goedemorgen [redacted]

Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken.

Op de kaart hier naast heb ik met een stift doorgehaald wat er tot nu toe af is. Momenteel zijn de Snoeier bezig aan de Markolstrijtte te Veenwouden. Afgelopen week hebben de snoeier **Geen** extra werk verricht. Een overzicht van het extra werk is te vinden in de Bijlage.

Totaal zijn er momenteel **387** bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [REDACTED] op vrijdag gedaan.

In week 9 zijn de snoeiers er een week niet. Dit hebben we besproken in de bouwvergadering.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl



Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 13 februari 2023 08:00

Aan: [REDACTED] Heldergroen advies [REDACTED]@heldergroenadvies.nl; [REDACTED]@noardeast-frysland.nl

Onderwerp: FW: Week update t/m week 6 Met bijlage

Nu met bijlage,

Goedemorgen [REDACTED]



Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken.

Op de kaart hier naast heb ik met een stift doorgehaald wat er tot nu toe af is. Momenteel zijn de Snoeier bezig nabij het park van Veenwouden. Ook hebben de snoeier afgelopen week Geen extra werkzaamheden verricht. Een overzicht van het extra werk is te vinden in de Bijlage.

Totaal zijn er momenteel 322 bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [REDACTED] op vrijdag gedaan.

Aankomen de Donderdag zijn de snoeiers een dag er niet. Dit in verband met een snoei praktijkdag

Van de Gem Groningen. De snoeiwerkzaamheden worden vrijdag weer voortgezet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

[REDACTED]
T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 6 februari 2023 08:04
Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[REDACTED]@noardeast-fryslan.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>
Onderwerp: RE: Week update t/m week 5

Goedemorgen [REDACTED]

Hierbij weer de wekelijkse update van de stand van zaken. Zo als Lutein heeft vermeld moet er wekelijks een update komen volgens bestek voorschriften.

Op de kaart hier naast heb ik met een stift doorgehaald wat er tot nu toe af is. Momenteel zijn de Snoeier bezig op het industrie terrein de Zwette. Ook hebben de snoeier afgelopen week weer wat extra werkzaamheden verricht. Hiervan kun je een overzicht vinden in de bijlage.

Totaal zijn er momenteel 248 bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [REDACTED] op vrijdag gedaan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

[REDACTED]
T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[REDACTED]@noardeast-fryslan.nl)>

Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 08:10

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@piusfloris.nl](mailto:[REDACTED]@piusfloris.nl)>; [REDACTED] Helder groen advies <[Onderwerp: RE: Week update t/m week 4](mailto:[REDACTED]@he</p></div><div data-bbox=)

Dag [REDACTED]

Ik vind dit een mooie simpele manier van mij (ons) op de hoogte houden van de vorderingen van het werk

Dank je.

Van: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@piusfloris.nl](mailto:[REDACTED]@piusfloris.nl)>

Verzonden: maandag 30 januari 2023 09:15

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@noardeast-fryslan.nl](mailto:[REDACTED]@noardeast-fryslan.nl)>; [REDACTED] Helder groen advies <[Onderwerp: Week update t/m week 4](mailto:[REDACTED]@</p></div><div data-bbox=)



LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Goedemorgen [REDACTED]

Hierbij wil ik jullie op de hoogte stellen van de doorloop van de snoeiwerkzaamheden.

Op de kaart hier naast heb ik met een stift doorgemaakt wat er tot nu toe af is. Momenteel zijn de

Snoeier net over het spoor waar het besproken extra werkzaamheden aanwezig is. Hier van hebben wij

Mondeling toezegging van [REDACTED]

Totaal zijn er momenteel 93 bomen afgemeld naar de Cloud dit heeft [REDACTED] op vrijdag gedaan.

-Extra werk uren Uur

Woensdag 25-1 7.75

Donderdag 26-1 7.75

Vrijdag 27-1 2 +

Totaal uur snoeiploeg 17.5 uur

Mijn streven is om elke maandag of om de maandag overzicht te verzenden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

[REDACTED]
T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14

9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.plusfloris.nl



Project: RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel
Nummer: NE_2022_21
Aanwezig: Gemeente Dantumadiel
Frisia
Heldergroen advies
Afwezig: Gemeente Dantumadiel
Heldergroen advies
Datum: 14 maart 2023 (8.30 uur gemeentewerf, Damwâld)
Onderwerp: Agenda overleg BV06 Bestek onderhoud bomen 2022-2024, Dantumadiel

Nummer *Onderwerp*

1 **Opening**

2 **Vaststellen verslag en agenda**

- Vaststellen agenda, er zijn geen specifieke aanvullingen.
- Vaststellen verslag BV05, akkoord en wordt ondertekend, [redacted] verstuurd getekend exemplaar. [redacted]
- Openstaande actiepunten, er zijn geen openstaande actiepunten.
 -

3 **Agendapunten**

- Planning / voortgang. De werkzaamheden lopen achter op de planning, oorzaak hiervan is een aantal dagen onwerkbaar weer en afwezigheid in week 9 en deels 10. Verzoek van de opdrachtgever is om binnen de planning, [redacted] gaat hiermee aan de slag. [redacted]
- Gebruik Digitree, administratieve controle wordt nu wekelijks meegenomen.
- Verkeersmaatregelen, geen bijzonderheden.
- V&G, geen.
- F&F, gaat goed geen bijzonderheden.
- Kwaliteit uitgevoerd werk, algemene indruk van het uitgevoerde werk is goed, [redacted] voert vandaag een controle uit. Aan de [redacted] Plesmanloane 25 was discussie met de bewoner over het onderhoud aan een mandelige boom. Dit is in het veld prima



opgelost door de ETW.

- Indienen week en termijnstaten, conform het bestek wordt er eens per vier weken een termijn ingediend. Op deze termijn worden alleen bomen opgenomen die correct gesnoeid en kloppend en integer gemuteerd zijn in Digitree. Afgelopen week was de laatste week van termijn 4 er moet weer een termijn opgemaakt worden.
- Prestatiebeloning, de ingediende termijn 3 is afgekeurd omdat de hoeveelheden niet overeen kwamen met gemuteerde werk in Digitree, en omdat er teveel administratieve tegenstrijdigheden in de gemuteerde gegevens voorkomen. De prestatiebeloning voor deze termijn wordt niet toegekend. ■ vraagt of dit heroverwogen kan worden door de directie. ■ bespreekt het met ■ en ■

4 Wvttk, rondvraag en sluiting

Bosplantsoen bij skatepark (Ljiploane), hier staan enkele eiken welke met de kroon boven de openbare weg hangen. Afsproken om dit te onderhouden als beplanting, ■ stemt dit af met de snoeiers. Kerstverlichting centrum Veenwouden, ■ neemt contact op met winkeliersvereniging

Algemeen

Hieronder van de betrokkenen de mailadressen, telefoonnummers en rollen:

- ■@noardeast-fryslan.nl ■
- ■@noardeast-fryslan.nl ■
- (aanwezig: ma, di, wo ,vr)
- ■@noardeast-fryslan.nl / ■
- (aanwezig: ma, di wo, do)
- ■@frisiabergum.nl / ■
- hoofduitvoerder
- ■@piusfloris.nl ■
- uitvoerder
- ■@heldergroenadvies.nl ■ / extern
- directievoerder
- ■@heldergroenadvies.nl / ■
- extern toezichthouder



Van: [REDACTED]
E-mailbericht ontvangen om: Thu, 20 Apr 2023 13:13:46
Verzonden: Thu, 20 Apr 2023 13:13:44
Aan: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#) [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: getekend exemplaar bouwvergadering
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen: [20230420132934408.pdf](#);
Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:56:32

Met vriendelijke groet, Mei Freonlike groetnis, Kind regards

[REDACTED]
Coordinator Dantumadiel West/wnd specialistisch Groen
Eenheid Utfiering Iepenbiere Romte
Werkdagen maandag tm donderdag

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]@dongeradeel.nl <[REDACTED]@dongeradeel.nl>
Verzonden: donderdag 20 april 2023 13:30
Aan: [REDACTED]@noardeast-fryslan.nl>
Onderwerp: Message from "DO-Printer06"

Deze E-mail is verzonden van "DO-Printer06"(MP C2003).

Scan datum: 20.04.2023 13:29:33 (+0200)
Vragen aan: [REDACTED]@dongeradeel.nl

FRISIA BERGUM

Pagina 1 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : € Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 24 april 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		A	G	in termijn	tm termijn		
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)						
10	BEGELEIDINGSSNOEI						
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	5,00	V	2,00	5,00	
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	7,00	V	3,00	6,00	
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	3,00	V	1,00	3,00	
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V *	12,00	27,00	
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V	63,00	125,00	
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V *	178,00	271,00	
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	64,00	V	42,00	62,00	
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	5,00	V	1,00	4,00	
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V	30,00	189,00	
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	154,00	V	99,00	124,00	
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	159,00	V	128,00	144,00	
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	1,00	V	1,00	1,00	
11	ONDERHOUDSSNOEI						
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.						
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V *		1,00	
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V *	6,00	12,00	
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V	34,00	60,00	
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V	165,00	209,00	
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V *	46,00	76,00	
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	2,00	V		1,00	
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)						
20	BEGELEIDINGSSNOEI						
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4,00	V		4,00	
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V		20,00	
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107,00	V		107,00	
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	104,00	V		99,00	
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	34,00	V		25,00	
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3,00	V		3,00	

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 2 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 24 april 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	195,00	V		190,00		
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	248,00	V		247,00		
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	91,00	V		82,00		
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V		25,00		
21	ONDERHOUDSSNOEI							
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.							
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V		10,00		
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	14,00	V		14,00		
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	60,00	V		59,00		
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	141,00	V		141,00		
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	58,00	V		54,00		
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	9,00	V		9,00		
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)							
30	BEGELEIDINGSSNOEI							
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	2,00	V				
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	5,00	V				
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	1,00	V				
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	64,00	V				
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	199,00	V				
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	132,00	V				
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	94,00	V				
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	14,00	V				
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V				
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	253,00	V				
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	176,00	V				
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V				
31	ONDERHOUDSSNOEI							
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.							
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	4,00	V				
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	24,00	V				
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	89,00	V				

Paraaf opdrachtgever

Paraaf aannemer

FRISIA BERGUM

Pagina 3 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : Gemeente Dantumadiel

Datum: 24 april 2023

BESTEK : NE_2022_21

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
			A	G		
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	114,00	V		
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	21,00	V		
4	REGISTRATIE 2022-2024					
40	OPNAME BOOMKENMERKEN					
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.					
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei).	st	4.029,00	V	843,00	2.421,00
5	WERK ALGEMENE AARD 2022-2024					
50	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA					
5010	Inventariseren flora en fauna verkennend					
501010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	V	0,21	0,89
501020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V	0,21	0,89
5011	Inventariseren flora en fauna soortspecifiek					
501110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	15,00	V	1,00	1,00
501120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	15,00	V		
5012	Markeren flora- en faunaplaatsen					
501210	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V		
501220	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V		
6	VERKEERSMAATREGELEN 2022-2024					
60	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK					
6010	Toepassen verkeersmaatregelen					
601010	Toepassen afzetting (2022)	eur	600,00	N		600,00
601020	Toepassen afzetting (2023)	eur	600,00	N		600,00
601030	Toepassen afzetting (2024)	eur	941,75	N		
601040	Toepassen verkeersmaatregelen	eur	574,70	N		
61	VERKEERSREGELAAR					
6101	Bevoegde verkeersregelaars					
610110	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2022).	eur	500,00	N		500,00
610120	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2023).	eur	500,00	N		
610130	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2024).	eur	500,00	N		
7	PRAKTIJKDAG					
70	PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS					
7010	Afstemming ETW's en ETT's					
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V		1,00
8	INZETTEN 2022-2024					
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V *		40,00
	SUBTOTAAL					

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 4 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : ██████████ Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 24 april 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
910010	Aanvoerkosten	115,00	N		24,04	66,23		
910020	Afvoerkosten	115,00	N		24,04	66,23		
910030	0,00	N					
910040	0,00	N					
910050	0,00	N					
919980	Overige eenmalige kosten	0,00	N					
919990	Korting	0,00	N					
929990	Uitvoeringskosten	1.120,60	N		234,21	643,44		
939990	Algemene kosten	632,20	N		132,13	318,57		
949990	Winst en risico	574,70	N		120,11	330,99		
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	130,53	N			130,53		
	SUBTOTAAL							

Paraaf opdrachtgever,

██████████

Paraaf aannemer,

██████████

FRISIA BERGUM

Pagina 5 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : Gemeente Dantumadiel

Datum: 24 april 2023

BESTEK : NE_2022_21

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
	OVERSCHRIJDINGEN							
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V		2,00	2,00	
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V		14,00	14,00	
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V		12,00	18,00	
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V		3,00	3,00	
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V		1,00	1,00	
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V			60,00	
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V			2,00	
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V			1,00	
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V		2,00	2,00	
	TOTAAL OVERSCHRIJDINGEN							

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 6 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 24 april 2023

AANNEMINGSSOM:	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM TOT TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN TOT TERMIJN	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN	€	
DEZE TERMIJN EXTRA DECLARATIES	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN EXTRA DECLARATIES T/M TERMIJN	€	

BTW % 21,00 IN TERMIJN 19.459,88 = €

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum: 28/06/2023

Naam toezichthouder: [Redacted]

Handtekening toezichthouder: [Redacted]

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum: 29/04/2023

Naam uitvoerder: [Redacted]

Handtekening uitvoerder: [Redacted]

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:56:54
Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)
E-mailbericht ontvangen om: Fri, 28 Apr 2023 14:12:51
Verzonden: Fri, 28 Apr 2023 12:12:01
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: RE: 5e termijn onderhoud bomen met bijlage
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen:
[20230428 Termijnstaat 5 ondertekend.pdf](#);

Goedemiddag [REDACTED]

De aangeleverde gegevens op termijn 5 zijn akkoord, in de bijlage het getekende exemplaar.

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Toezichthouder

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)
www.heldergroenadvies.nl



Van: [REDACTED]@piusfloris.nl>

Verzonden: maandag 24 april 2023 13:56

Aan: [REDACTED] | Heldergroen advies <[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>; [REDACTED] | Heldergroen advies
<[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)>

Onderwerp: FW: 5e termijn onderhoud bomen met bijlage

Goedemiddag [REDACTED]

Hierbij ontvang je termijn 5 voor echt project onderhoud bomen 2022-2024 te Dantumadiel, zoals afgesproken in de bouwvergadering ontvangen jullie meerdere weken in 1 keer. In mei/juni worden de laste ABC bomen gesnoeid, daarbij wordt dit jaar afgesloten.

Extra werk

Vorig jaar hebben we 40 uur in rekening mogen brengen, hiervan is echter 1 uur van gebruikt. Door deze reden hebben wij dit jaar een potje van 39 uur ter besteding voor extra werkzaamheden te verrichten, dit is ook gebeurt het potje is op. Dit jaar

hebben wij namelijk 42 uur gebruik gemaakt van het potje, hiervan kun je een overzicht terug vinden in de wekelijkse overzicht van de afgelopen tijd. Het laatste 0.75 uur is besteed aan de eik te Damwald. Op deze termijn 5 vind je een ploeg inzet terug van 2 uur, 39-42= -2 uur.

F&F

In de bijlage vinden jullie een het boek werkje voor de F&F, we hebben in de afgelopen weken maar 1 F&F melding kunnen doen namelijk Bloeiende stinzenplanten.

Graag ontvangen wij een getekend document retour, bij vragen en/of opmerkingen horen wij dat graag.

Veel goeds en Beterschap aan [REDACTED] Gewenst!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
European Tree Worker
M [REDACTED]

[REDACTED]
T [REDACTED]
Kloosterlaan 81
Postbus 14
9250 AA Bergum

T [REDACTED]
Jeverweg 10
Postbus 9531
9703 LM Groningen

T [REDACTED]
Abel Tasmanplein 3
Postbus 541
9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken we u dringend ons direct te informeren en om dit bericht en eventuele bijlage(n) te verwijderen, zonder het te kopiëren, door te zenden of op enige andere wijze te openbaren of te gebruiken.

Nieuw! **Pius de Podcast** Luister hem o.a. [hier](#)



Nu in uw favoriete
podcast-app:
'Pius de Podcast'

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:57:14

Van: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Mon, 12 Jun 2023 12:31:44

Verzonden: Mon, 12 Jun 2023 10:31:28

Aan: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Onderwerp: veldbeoordeling uitgevoerd werk Frisia

Urgentie: Normal

Precisie: None

Goedemiddag [REDACTED]

Afgelopen vrijdag heb ik het uitgevoerde boomonderhoud en de gemuteerde gegevens in Veenwoude beoordeeld.

Hierbij viel mij het volgende op:

Lysterstritte boomnr. NT287, 286,290, 293. Gemuteerd als gesnoeid, zit nog afgestorven hout in de kroon en stamschot op stam

Boomnr. NT148, 149 en HD2021121621, 2021121622. Staan nu gemuteerd als BGS achterstallig maar er is niks aan gedaan. Hier is echter iets fout gegaan bij de opname, betreffende bomen hadden moeten zijn opgenomen als gekandelaberde boom 6-9 meter met achterstallig boombeeld en moeten geknot worden.

Ik heb nog geen termijnstaat gezien maar ben benieuwd of bovenstaande bomen opgevoerd worden.

De Liquidambar en rode beuken winkelcentrum van Veenwoude zijn niet gesnoeid, i.v.m. feestverlichting, bomen zijn niet gemuteerd actie en komen als het goed is niet in de termijn.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
European Tree Technician
Groentechnisch specialist

[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)

Heldergroen advies BV

Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen

[\[REDACTED\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[REDACTED]@heldergroenadvies.nl)

www.heldergroenadvies.nl



Project: RAW Bestek onderhoud bomen 2022-2024 Dantumadiel
Nummer: NE_2022_21
Aanwezig: Gemeente Dantumadiel
Frisia
Heldergroen advies
Afwezig: Frisia
Heldergroen advies
Datum: 20 april 2023 (13.00 uur gemeentewerf, Damwâld)
Onderwerp: Verslag overleg BV07 Bestek onderhoud bomen 2022-2024, Dantumadiel

Nummer *Onderwerp*

1 **Opening**

■■■■ opent het overleg. ■■■■ vervangt voor vandaan ■■■■

2 **Vaststellen verslag en agenda**

- Vaststellen agenda, er zijn geen specifieke aanvullingen.
- Vaststellen verslag BV06, akkoord en wordt ondertekend, ■■■■ verstuurd het ■■■■ getekende exemplaar.
- Openstaande actiepunten, ■■■■ is nog bezig met de kerstverlichting in ■■■■ Veenwouden.

3 **Agendapunten**

- Planning / voortgang. Deze week (16) wordt het reguliere snoeiwerk exclusief de 210 stuks ABC bomen afgerond en gemuteerd. Per mail is door BK aangegeven dat de ABC bomen nu niet gesnoeid kunnen worden en dat deze begin juni alsnog gedaan worden. De opdrachtgever is hier niet over te spreken, enerzijds omdat de planning niet gehaald is en anderzijds de wijze waarop dit gecommuniceerd wordt. De opdrachtgever heeft hierdoor extra kosten doordat er meer inzet van ondersteuning noodzakelijk is. Excuses van ■■■■ hoe e.e.a. verlopen is, ■■■■ geeft aan dat we ook door moeten. Afgestemd wordt dat de ABC bomen week 22/23 gesnoeid worden, de eindtermijn volgt begin week 24, zodat het besproken kan worden tijdens het overleg op donderdag 15 juni.



- Meldingen app boomonderhoud, geen bijzonderheden.
- Verkeersmaatregelen, er was een melding binnen gekomen bij J. [REDACTED] over het uitvoeren van werkzaamheden buiten de kom zonder bebording. [REDACTED] heeft met de medewerkers besproken dat dit wel moet.
- V&G, geen bijzonderheden
- F&F, registratie gaat goed, er is geen noemenswaardige hinder m.b.t. uitvoering.
- Kwaliteit uitgevoerd werk [REDACTED] heeft vanochtend een ronde gedaan, over het algemeen ziet het uitgevoerde werk er goed uit. Aan de Fjildwei was bij enkele wilgen lichte uitscheuring zichtbaar, en er ligt nog dik takhout bij enkele bomen. [REDACTED] lost dit laatste op.
- Gebruik Digitree, dit gaat goed, er waren op de viewer enkele foutjes geconstateerd door [REDACTED] deze zijn inmiddels al weer aangepast.
- Indienen week en termijnstaten, formeel had termijn 4 in begin week 15 ingediend moeten worden. Dat is niet gedaan, afgestemd om een 6 wekelijkse termijn te maken om administratieve druk te beperken.
- Prestatiebeloning
Een onderdeel van het toekennen van de prestatiebeloning is het werken conform overeengekomen planning. Er volgt een discussie over welk deel geen prestatiebeloning toegekend moet worden omdat een deel buiten de planning valt. Onderling afgesproken dat de prestatiebeloning vervalt voor het deel wat in juni nog gesnoeid moet worden.

4 Wvttk, rondvraag en sluiting

Er zijn dit jaar nog uren voor de inzet van een snoeiploeg voor het onderhoud aan bosranden. Goed om te melden dat er bij dit werk geen inzet van een snipper combinatie nodig is, takhout hoeft enkel gestapeld te worden. De gemeente ruimt vervolgens zelf op. [REDACTED] maakt een overzicht van locaties, tijdens het volgende overleg wordt de planning verder afgestemd.

5 Volgende overleg

BV 8, donderdag 15 juni, 8:00 – 9.30 gemeentewerf, Damwâld

Voor akkoord ondertekend, d.d. 15 - 06 - 2023

Gemeente Dantumadiel

[REDACTED]

Frisia groenvoorziening BV

[REDACTED]



Van: [REDACTED]
E-mailbericht ontvangen om: Thu, 15 Jun 2023 08:29:34
Verzonden: Thu, 15 Jun 2023 08:29:33
Aan: [REDACTED] | [Heldergroen advies](#) [REDACTED]

Onderwerp: getekende notulen
Urgentie: Normal
Precisie: None
Bijlagen: [20230615084542924.pdf](#);
Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:57:26

Met vriendelijke groet, Mei Freonlike groetnis, Kind regards

[REDACTED]
Coordinator Dantumadiel
Eenheid Utfiering Iepenbiere Romte
Werkdagen maandag tm donderdag

FRISIA BERGUM

Pagina 1 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : ██████████ Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 21 juni 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
		A	G	in termijn	tm termijn		
1	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2022 (RAYON WEST)						
10	BEGELEIDINGSSNOEI						
1010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
101020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9 m).	st	5,00	V		5,00	
101030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	7,00	V	1,00	7,00	
101040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	3,00	V		3,00	
1011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V		27,00	
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V *	14,00	139,00	
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V *		271,00	
101140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	64,00	V	2,00	64,00	
101150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	5,00	V		4,00	
1012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld						
101210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V	21,00	210,00	
101220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	154,00	V	30,00	154,00	
101230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	159,00	V	15,00	159,00	
101240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	1,00	V		1,00	
11	ONDERHOUDSSNOEI						
1110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.						
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V		1,00	
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V *		12,00	
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V *	23,00	83,00	
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V *	9,00	218,00	
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V *		76,00	
111060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	2,00	V		1,00	
2	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2023 (RAYON CENTRUM)						
20	BEGELEIDINGSSNOEI						
2010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.						
201030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	4,00	V		4,00	
2011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.						
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V		20,00	
201120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	107,00	V		107,00	
201130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	104,00	V		99,00	
201140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	34,00	V		25,00	
201150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	3,00	V		3,00	

Parafondrechtgever,

Paraf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 2 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 21 juni 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
2012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
201210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	195,00	V		190,00		
201220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	248,00	V		247,00		
201230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	91,00	V		82,00		
201240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V		25,00		
21	ONDERHOUDSSNOEI							
2110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.							
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V		10,00		
211020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	14,00	V		14,00		
211030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	60,00	V		59,00		
211040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	141,00	V		141,00		
211050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	58,00	V		54,00		
211060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	9,00	V		9,00		
3	SNOEIWERKZAAMHEDEN 2024 (RAYON OOST)							
30	BEGELEIDINGSSNOEI							
3010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.							
301020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
301030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).	st	5,00	V				
301040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).	st	1,00	V				
3011	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.							
301110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	64,00	V				
301120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	199,00	V				
301130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	132,00	V				
301140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	94,00	V				
301150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	14,00	V				
3012	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld							
301210	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (<6m).	st	225,00	V				
301220	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m).	st	253,00	V				
301230	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m).	st	176,00	V				
301240	Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).	st	30,00	V				
31	ONDERHOUDSSNOEI							
3110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.							
311010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	4,00	V				
311020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	2,00	V				
311030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	24,00	V				
311040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	89,00	V				

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM


Pagina 3 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM :  Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 21 juni 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING			VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
			A	G	in termijn	tm termijn		
311050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	114,00	V				
311060	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).	st	21,00	V				
4	REGISTRATIE 2022-2024							
40	OPNAME BOOMKENMERKEN							
4011	Boomkenmerken actualiseren na snoei.							
401110	Controleren bomen door visuele inspectie (na snoei).	st	4.029,00	V	211,00	2.632,00		
5	WERK ALGEMENE AARD 2022-2024							
50	INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA							
5010	Inventariseren flora en fauna verkennend							
501010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	V		0,89	1	
501020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V		0,89	1	
5011	Inventariseren flora en fauna soortspecifiek							
501110	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	15,00	V		1,00		
501120	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	15,00	V				
5012	Markeren flora- en faunaplaatsen							
501210	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00	V				
501220	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00	V				
6	VERKEERSMAATREGELEN 2022-2024							
60	VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK							
6010	Toepassen verkeersmaatregelen							
601010	Toepassen afzetting (2022)	eur	600,00	N		600,00		
601020	Toepassen afzetting (2023)	eur	600,00	N		600,00		
601030	Toepassen afzetting (2024)	eur	941,75	N				
601040	Toepassen verkeersmaatregelen	eur	574,70	N				
61	VERKEERSREGELAAR							
6101	Bevoegde verkeersregelaars							
610110	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2022).	eur	500,00	N		500,00		
610120	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2023).	eur	500,00	N	500,00	500,00		
610130	Beschikbaar stellen verkeersregelaars (2024).	eur	500,00	N				
7	PRAKTIJKDAG							
70	PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS							
7010	Afstemming ETW's en ETT's							
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V		1,00		
8	INZETTEN 2022-2024							
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V		40,00		
	SUBTOTAAL							

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 4 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM : ██████████ Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 21 juni 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
910010	Aanvoerkosten	115,00	N		5,15	71,38		
910020	Afvoerkosten	115,00	N		5,15	71,38		
910030	0,00	N					
910040	0,00	N					
910050	0,00	N					
919980	Overige eenmalige kosten	0,00	N					
919990	Korting	0,00	N					
929990	Uitvoeringskosten	1.120,60	N		50,22	693,66		
939990	Algemene kosten	632,20	N		28,33	346,90		
949990	Winst en risico	574,70	N		25,74	356,73		
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	130,53	N			130,53		
	SUBTOTAAL							

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 5 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

AANN.SOM

Gemeente Dantumadiel

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 21 juni 2023

BESTEK POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEV.		Prijs per eenheid €	Bedrag in termijn €
					in termijn	tm termijn		
	OVERSCHRIJDINGEN							
101110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	27,00	V		2,00		
101120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	139,00	V	8,00	8,00		
101130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	271,00	V	24,00	38,00		
111010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	1,00	V		18,00		
111020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).	st	12,00	V	29,00	32,00		
111030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).	st	83,00	V	9,00	9,00		
111040	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).	st	218,00	V	20,00	20,00		
111050	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).	st	76,00	V	2,00	3,00		
201110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	20,00	V		60,00		
211010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).	st	10,00	V		2,00		
701010	Praktijkdag boomverzorgers	dag	1,00	V		1,00		
800010	Inzetten van een snoeiploeg	uur	40,00	V		2,00		
	TOTAAL OVERSCHRIJDINGEN							

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

FRISIA BERGUM

Pagina 6 van 6

PROJECT : 1502/22 Gemeente Dantumadiel Onderhoud bomen 2022-2024

BESTEK : NE_2022_21

Datum: 21 juni 2023

AANNEMINGSSOM:	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM TOT TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN TOT TERMIJN	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM	€	
DEZE TERMIJN VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN	€	
DEZE TERMIJN EXTRA DECLARATIES	€	
VERWERKT VAN AANNEMINGSSOM T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN OVERSCHRIJDINGEN T/M TERMIJN	€	
VERWERKT AAN EXTRA DECLARATIES T/M TERMIJN	€	
BTW % 21,00 IN TERMIJN	4.939,55 =	€

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum

: 23,06,2023

Naam toezichthouder

Handtekening toezichthouder

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum

: 21,06,2023

Naam uitvoerder

Handtekening uitvoerder

Gearchiveerd: maandag 27 november 2023 12:57:40

Van: [redacted] | [Heldergroen advies](#)

E-mailbericht ontvangen om: Fri, 23 Jun 2023 08:20:05

Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 10:20:05

Aan: [redacted]

Cc: [redacted] | [Heldergroen advies Broersma, Pieter](#)

Onderwerp: RE: 6e Termijn 1502/22 Gemeente Dantumadiel, onderhoud bomen 2022-2024

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[20230623 Termijnstaat 6 ondertekend.pdf](#);

Goedemorgen [redacted]

Termijn 6 is akkoord, in de bijlage het ondertekend exemplaar.

Mooi dat jullie de actiepunten afgehandeld hebben, er zijn inderdaad geen openstaande actiepunten meer.

Goede weekend!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
European Tree Technician
Groentechnisch specialist
[redacted]
[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)

Heldergroen advies BV
Vaart N.Z. 50
9401 GN Assen
[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)
www.heldergroenadvies.nl



Van: [redacted]@piusfloris.nl>

Verzonden: donderdag 22 juni 2023 07:32

Aan: [redacted] | Heldergroen advies <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>

CC: [redacted] Heldergroen advies <[\[redacted\]@heldergroenadvies.nl](mailto:[redacted]@heldergroenadvies.nl)>

Onderwerp: FW: 6e Termijn 1502/22 Gemeente Dantumadiel, onderhoud bomen 2022-2024

Goedemorgen [redacted],

Hierbij ontvang je de aangepaste termijn zonder de 4 wilgen, graag ontvangen wij een getekend document retour.

Actiepunten;

- Termijn aanpassen -4 tal wilgen, zie bijlage
- Snoeien van 4 tal eiken OHS hebben we afgerond
- 2 tal Eiken aan de Oastin te Veenwouden hebben we aangepast op attentieboom, opmerking en onderhoud 1x3 jaar

Volgens mij waren er voor de rest geen actie punten die nog afgehandeld moeten worden vanuit ons.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
European Tree Worker
M [redacted]



T [redacted]
 Kloosterlaan 81
 Postbus 14
 9250 AA Bergum

T + [redacted]
 Jeverweg 10
 Postbus 9531
 9703 LM Groningen

T + [redacted]
 Abel Tasmanplein 3
 Postbus 541
 9400 AM Assen
www.piusfloris.nl

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken we u dringend ons direct te informeren en om dit bericht en eventuele bijlage(n) te verwijderen, zonder het te kopiëren, door te zenden of op enige andere wijze te openbaren of te gebruiken.

Nieuw! **Pius de Podcast** Luister hem o.a. [hier](#)



Van: [redacted] <[\[redacted\]@frisiagroep.nl](mailto:[redacted]@frisiagroep.nl)>
Verzonden: woensdag 21 juni 2023 09:14
Aan: [redacted] <[\[redacted\]@piusfloris.nl](mailto:[redacted]@piusfloris.nl)>
Onderwerp: 6e Termijn 1502/22 Gemeente Dantumadiel, onderhoud bomen 2022-2024

Hoi [redacted],

Hierbij de nieuwe versie.

Opmerking bij post 111040, deze is van de overschrijding afgegaan, zie blad 5.

Met vriendelijke groet,

\itap [redacted]
 \itap2 Administratief medewerkster



\itap4
 \itap3

DIRECT CONTACT

\itap5
 \itap6 0511-461212
 \itap6 [redacted] <[\[redacted\]@frisiagroep.nl](mailto:[redacted]@frisiagroep.nl)>
 \itap6
ONLINE
 \itap6 [redacted] <[\[redacted\]@frisiagroep.nl](mailto:[redacted]@frisiagroep.nl)>
 \itap6 www.frisiagroep.nl
 \itap7 <[\[redacted\]@frisiagroep.nl](mailto:[redacted]@frisiagroep.nl)>

LOCATIES

<p>\itap5 \itap7 Burgum - Frisia Bergum Kloosterlaan 81, 9251 ME Burgum 0511 - 461 212 \itap7 \itap7 Hoorn - Frisia Bergum Nieuwe Steen 25, 1625 HV Hoorn 0229 - 213 193</p>	<p>\itap6 \itap7 Groningen - Groenservice Noord Jeverweg 10, 9723 JE Groningen 050 - 549 83 39 \itap7 \itap7 Assen - Groenservice Noord Abel Tasmanplein 3, 9401 AZ Assen 0592 - 408 878</p>
---	--
