

Inhoudsopgave

1. RE Watercompensatie De Westereen	2
1b. Planning Watercompensatie De Westereen CONCEPT	8
2. FW Brief herinrichting groenstrook Lange Reed - Yndustrywei	9
2a. Brief bewonersparticipatie De Westereen	11
3. Uitbreiding waterberging met legenda	13
4. Input bewonersavond 01 t/m 03	16
5. Power point bewonersavond 14-04-2026	19
6. RE DTM meting watercompensatie Vogelsang	37
6a. Inmeting gebied watercompensatie vogelsang	42
6b. DTM meting Vogelsang Westereen 30-4-2026	43

Gearchiveerd: donderdag 2 juli 2026 11:11:17

Van: [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 9 januari 2026 08:52:33

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Watercompensatie De Westereen

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

[quickscan-fogelsang-de-westereen \(2\).pdf](#)  [0260109 Planning Watercompensatie De Westereen CONCEPT.xlsx](#) 

Goedemorgen [REDACTED],

Dankjewel.

Met het verkennend bodemonderzoek bedoel ik de uitvoering daarvan. Ik heb de periode verlengd en de uitvraag hiervoor apart opgenomen in de planning.

Het lijkt mij dat het waterbodemonderzoek gelijktijdig door dezelfde partij uitgevoerd kan worden. [REDACTED] gaf aan dat Tijhuis Ingenieurs een geschikte partij is.

Vanuit de quickscan F&F (18-3-2025) is naar voren gekomen dat er geen belemmeringen zijn om het werk uit te voeren.

Hierbij wel specifieke uitvoeringsperioden in acht genomen. Een vervolgonderzoek wvb ecologie lijkt mij daarom niet nodig.

Frisia geeft in de quickscan ook aan dat het uitvoeren van een AERIUS-berekening noodzakelijk is. Heb jij ervaring met de uitvraag hiervan?

Het formatje heb ik even mn best op gedaan.   Een standaard opzet hadden we helaas nog niet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Beleidsmedewerker Groen

Team Openbare Werken

 (0511) 717 000

 (06) [REDACTED]

 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 9 januari 2026 07:38

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Watercompensatie De Westereen

Heyy goedemorgen [REDACTED],

Ziet er goed uit!

Twee opmerkingen / vragen

- Het verkennend bodemonderzoek staat 2 weken voor gepland. Is dit de uitvraag regelen? Wat zo'n onderzoek zelf gaat vaak 2-3 weken overheen voor veldwerk ingepland kan worden door een onderzoeksbureau en dan nog 2-4 weken voor de rapportages uitgewerkt zijn. Dus ik zou proberen om die naar voren te halen zodat je zeker bent dat je de input hebt voor de uitvoeringstekeningen.
 - En vergeet in die uitvraag het waterbodemonderzoek niet
- Moet er voorafgaand aan het ecologisch werkprotocol ook een ecologisch onderzoek worden uitgevoerd? Afhankelijk van 'niet uit te sluiten soorten' bij een verkennend onderzoek, kan nader onderzoek namelijk zeer tijdrovend zijn.

Verder heldere volgorde met de alle stappen er wel in denk ik. En er zit ook nog wel wat ruimte tussen aanbesteding en de uitvoering dus dat is denk ik ook prima!

En mooi formatje wel voor een planningsdocument haha!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Team Omgeving en Economie

■ (06) [Redacted]

👤 werkdagen: ma, woe, don, vr

Van: [Redacted] <[\[Redacted\]@dantumadiel.fr](mailto:[Redacted]@dantumadiel.fr)>

Verzonden: donderdag 8 januari 2026 16:38

Aan: [Redacted] <[\[Redacted\]@dantumadiel.fr](mailto:[Redacted]@dantumadiel.fr)>

Onderwerp: FW: Watercompensatie De Westereen

Hoi [Redacted],

Ik had je nog een planning toegezegd voor wat betreft de watercompensatie in de Westereen.

In de bijlage het concept welke door Frisia is beoordeeld.

Heb jij nog opmerkingen/ aanpassingen hierop?

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Beleidsmedewerker Groen

Team Openbare Werken

☎ (0511) 717 000

■ (06) [Redacted]

👤 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: [REDACTED]@frisiagroep.nl>
Verzonden: donderdag 8 januari 2026 12:54
Aan: [REDACTED]@dantumadiel.fr>
CC: [REDACTED]@dantumadiel.fr>; [REDACTED]@frisiagroep.nl>
Onderwerp: Re: Watercompensatie De Westereen

Hallo [REDACTED],

De planning is haalbaar voor ons, hier kunnen wij wel mee uit de voeten. Ik heb nog de volgende vragen/opmerkingen:

- Hebben jullie al een datum voor de participatiebijeenkomst in week 13/14 in gedachten? Goed om tijdig af te stemmen.
- Onder het kopje 'Natuurinclusief Definitief ontwerp' mogelijk nog een kopje laatste aanpassingen doorvoeren. (nadat alles op een rij staat en door iedereen is gezien is er altijd nog iets...)
- We gaan er van uit dat de uitvoeringstekening en het beplantingsplan ook al deel uit maakt van het DO, maar het is goed om het nogmaals te benoemen als onderdeel van de Uitvoeringstekeningen/werkomschrijving/werkvoorbereiding.
- We willen adviseren om ook een beheeradvies op te stellen voor de komende jaren

\itap5Met vriendelijke groet,

\itap4[REDACTED]
\itap4Natuurtechnisch Adviseur

\itap5 \itap406 [REDACTED]
🌐 \itap5 \itap4frisiagroep.nl



\itap7Locatie Bergum
Kloosterlaan 81

\itap6Locatie Groningen
Jeverweg 10

Locatie Hoorn
Nieuwe Steen 25

Locatie Assen
Abel Tasmanplein 3

GROENSPECIALISTEN SINDS 1696



\itap3

Van: [REDACTED]@dantumadiel.fr>
Verzonden: dinsdag 6 januari 2026 12:03
Aan: [REDACTED]@frisiagroep.nl>
CC: [REDACTED]@dantumadiel.fr>; [REDACTED]@frisiagroep.nl>
Onderwerp: RE: Watercompensatie De Westereen

Hoi [REDACTED],

Ook voor jullie de beste wensen!

Ik heb inmiddels al een opzet voor de planning gemaakt.

Zou je deze willen controleren op juistheid, volledigheid en haalbaarheid voor jullie?

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Beleidsmedewerker Groen

Team Openbare Werken

✉ [Redacted]@dantumadiel.fr

📅 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



Hynstebloem 4, 9104 BR Damwâld
(0511) 71 70 00
(06) 398 27 903 | WhatsApp
info@dantumadiel.fr
www.dantumadiel.fr

Van: [Redacted]@frisiagroep.nl>

Verzonden: dinsdag 6 januari 2026 11:46

Aan: [Redacted]@dantumadiel.fr>

CC: [Redacted]@dantumadiel.fr>; [Redacted]@frisiagroep.nl>

Onderwerp: Re: Watercompensatie De Westereen

Hallo [Redacted],

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. We beginnen met een bijzondere week, zo in de sneeuw!

De voorgestelde aanpassingen aan het SO lijken ons vrij duidelijk, daar kunnen we eerst wel een uitwerking van maken.

We hadden nu gekozen voor alleen een technische tekening om de specificaties goed in beeld te krijgen; we stellen voor om van het nieuwe SO een wat meer visueel ontwerp te maken, zodat deze ook voor de omwonenden een goed beeld geeft.

Zoals afgesproken zullen we ook een jaarplanning maken in Excel, met periodes en deadlines voor geplande uitvoering najaar 2026

- Aangepast schetsontwerp
- Momenten participatie
- VO en DO
- Vergunningtraject
- Kap houtsingel (Binnen bebouwingscontour houtkap) voorstel najaar, meteen voorafgaand aan uitbreiding waterbekken

- Aanplant nieuwe singel
- Uitvoering werkzaamheden buiten kwetsbare periodes

\itap5Met vriendelijke groet,

\itap4
 \itap4Natuurtechnisch Adviseur

\itap5 [\itap406](#)
 \itap5 [\itap4frisiagroep.nl](#)



<u>\itap7Locatie Bergum</u> Kloosterlaan 81	<u>\itap6Locatie Groningen</u> Jeverweg 10
<u>Locatie Hoorn</u> Nieuwe Steen 25	<u>Locatie Assen</u> Abel Tasmanplein 3

GROENSPECIALISTEN SINDS 1696



Van: [@dantumadiel.fr](#)>
 Verzonden: Dinsdag, 23 December, 2025 15:45
 Aan: [@frisiagroep.nl](#)>
 CC: [@dantumadiel.fr](#)>
 Onderwerp: Watercompensatie De Westereen

Hallo ,

Terugkomend op ons gesprek over het vervolg van project Watercompensatie De Westereen.

Het ontwerptraject heeft een tijdje stilgelegen om onderzoek te doen naar het ruimtebeslag van een eventuele verbinding tussen de Sintrale As (N356) en de Yndustrywei aan de noordzijde van het projectgebied.

Voor deze verbinding zijn een tweetal profielen uitgewerkt waarbij er één ideaal profiel met rijbaan en fietsstroken binnen de beschikbare ruimte past. Ik zie zelf nog een optie om de toekomstige fietsverbinding aan de zuidzijde te realiseren. Dit zou nog wat extra speelruimte geven.

Naast het benodigde ruimtebeslag dient ook een geluids- en trillingsonderzoek gedaan te worden om vast te stellen of de weg tot (overmatige) hinder bij de bestaande woningen leidt. Er is voornog besloten om dit onderzoek in dit stadium niet uit te voeren en het compensatieplan met behoud van noordelijke houtsingel voort te zetten.

Het huidige SO dient wel aangepast te worden. Vanuit ons eigen beheer en vanuit het Wetterskip wordt een robuuster watersysteem verlangd.

Daarom stel ik voor om het 'eilandmodel' te laten vervallen en voor een ontwerp te gaan met behoud van een deel van de zuidelijk gesitueerde houtsingel. Ook wordt vanuit het Wetterskip een waterdiepte voorgeschreven van minimaal 120 cm.

Variatie in waterdiepte kan dan alsnog beperkt gecreëerd worden door smalle en brede taluds.

Ook het aangepaste SO dient een compensatie te realiseren van 800 m2 extra wateroppervlak. Dit is leidend in de keuze voor behoud van aantal m1 houtsingel.

Ik neem graag begin januari contact met je op betreft het vervolg en planning van dit project. **Zouden jullie er in eerste instantie rekening mee kunnen houden dat we eind januari een aangepast SO kunnen ontvangen?**

Het heb een schets toegevoegd met hierop de belangrijkste wijzigingen op het huidige SO.

Voor eerst fijne feestdagen toegewenst en tot in 2026.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Beleidsmedewerker Groen

Team Openbare Werken

✉ [Redacted email] [@dantumadiel.fr](mailto:[Redacted email]@dantumadiel.fr)

👤 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



Hynstebloem 4, 9104 BR Damwâld
(0511) 71 70 00
(06) 398 27 903 | WhatsApp
info@dantumadiel.frl
www.dantumadiel.frl

projector.: DA 2024 12

datum: 28-11-2025

opsteller: XXXXXXXXXX2026-01-09 2. Planning Watercompensatie De Westereen CONCEPT

Gearchiveerd: donderdag 16 juli 2026 10:41:41

Van: [REDACTED]

Aan: [REDACTED]

Verzonden: 18 maart 2025

Onderwerp: FW: Brief herinrichting groenstrook Lange Reed - Yndustrywei

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:



[Brief bewonersparticipatie De Westereen.pdf](#);

Goedemorgen [REDACTED],

Ter info de uitnodiging voor de bewonersavond aan bewoners en doarpsbelang.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Beleidsmedewerker Groen

Team Openbare Werken



(0511) 717 000



(06) [REDACTED]



werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: Management secretariaat DAN

Verzonden: dinsdag 17 maart 2026 10:48

Aan: 'doarpsbelangdewestereen@gmail.com'

Onderwerp: Brief: herinrichting groenstrook Lange Reed - Yndustrywei

Goedemorgen,

In de bijlage vindt u een brief welke is verstuurd naar een aantal bewoners van de Dwarsreed, Lange Reed, Yndustrywei en de Fogelsang in de Westereen.

Hierbij nodigen wij Doarpsbelang De Westereen ook van harte uit om op dinsdag 14 april aan te sluiten bij de informatiebijeenkomst in de Old Dutch.

De aanvangstijd van de bijeenkomst is 19.30 uur.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Managementassistent

Team Omgeving & Economie I Openbare Werken



(06) [REDACTED]



[REDACTED]@dantumadiel.frl

 werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Aan de bewoner(s) van

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons adres: Postbus 22
9104 ZG Damwâld
Ons telefoonnr: (0511) 71 70 00
Ons whatsapp nr: (06) 398 279 03
Ons e-mailadres: info@dantumadiel.frl
Ons kenmerk: 2026 - 071977

Website: www.dantumadiel.frl

Behandeld door:

Datum: 16 maart 2026

Datum verzending: 17 maart 2026

Onderwerp: Herinrichting groenstrook Lange Reed – Yndustrywei

Beste bewoner(s),

Aankomend najaar start de gemeente Dantumadiel met werkzaamheden in de groenstrook tussen de Lange Reed en de Fogelsang/Yndustrywei in De Westereen. We richten het gebied opnieuw in. Wij vertellen u graag meer over deze plannen tijdens een informatieavond.

We gaan de bestaande watergang verbreden

Naast deze aanpassing willen we meerwaarde creëren en het gebied toegankelijker maken. Op de achterkant van deze brief ziet u een kaartje van het plangebied.

We beginnen dit najaar met de werkzaamheden

Er wordt gestart met het verwijderen van een deel van de houtsingels. Daarna worden er bagger- en grondwerkzaamheden verricht en nieuwe beplanting aangebracht. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2026 afgerond.

De ontwerptekeningen van de plannen worden tijdens de informatieavond aan u voorgelegd

De tekeningen zijn gemaakt in samenwerking met de Frisia Groep. Medewerkers van de gemeente Dantumadiel en de Frisia Goep zijn tijdens de bijeenkomst aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 april

Aanwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij de Old Dutch, Noarder Stasjonsstrjitte 54 in De Westereen. De aanvangstijd is 19.30 uur.



Heeft u vooraf al vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] via tel. (0511) 71 70 00 of stuur een e-mail naar [REDACTED]@[dantumadiel.frl](mailto:info@dantumadiel.frl).

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Beleidsmedewerker Groen
Team Openbare Werken

Plangebied

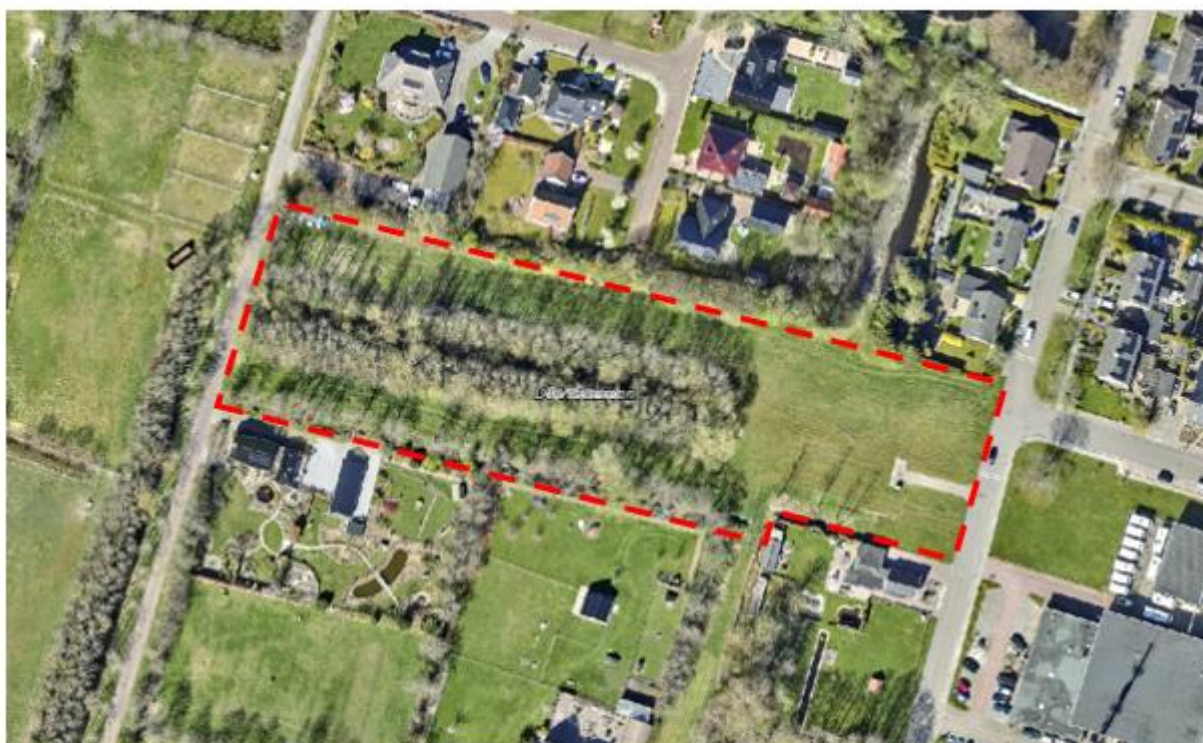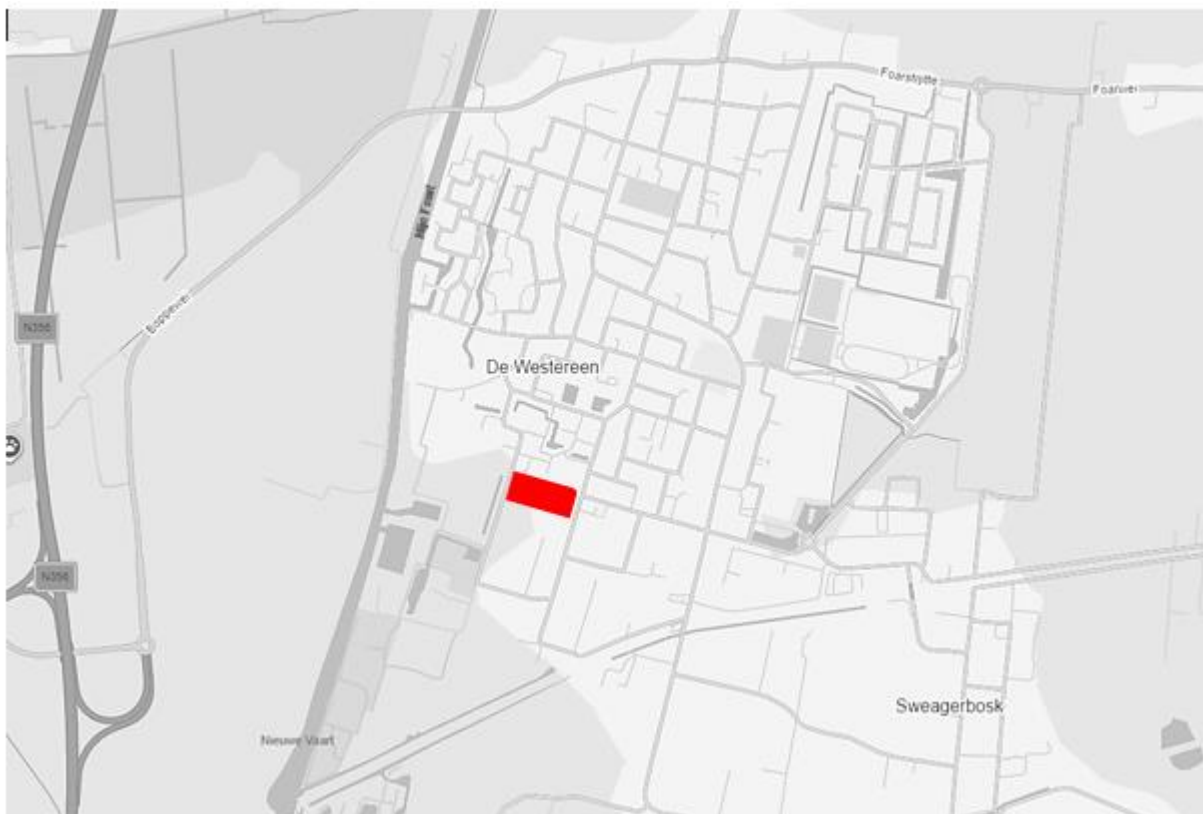

LEGENDA

- 1

tuinwal
- 2

kruidenrijk gras
- 3

maaipad ommetje
- 4

blijvende brede houtsingel
- 5

blijvende enkele houtsingel
- 6

nieuwe houtsingel
- 7

nieuwe houtsingel
- 8

bestaand water
- 9

verbreding met smalle oever 1:2
- 10

verbreding met natuurvriendelijke oever 1:4
- 11

schouwpad
- 12

bergbezinkbassin
- 13


uitzicht/recreatiepunt
- 14

duiker lange reed
- } 9+10=800m2 extra waterberging



Uitbreiding 800 m2 waterberging + natuurmaatregelen
Fogelsang De Westereen
iov Gemeente Dantumadiel
Voorlopig ontwerp

Schaal: 1:600 op A3



WIJ MAKEN GROEN VOOR GENERATIES



LEGENDA

- 1

tuinwal
- 2

kruidenrijk gras
- 3

maaipad ommetje
- 4

blijvende brede houtsingel
- 5

blijvende enkele houtsingel
- 6

nieuwe houtsingel
- 7

nieuwe houtsingel
- 8

bestaand water
- 9

verbreding met smalle oever 1:2
- 10

verbreding met natuurvriendelijke oever 1:4
- 11

schouwpad
- 12

bergbezinkbassin
- 13

uitzicht/recreatiepunt
- 14


duiker lange reed

} 9+10=800m2 extra waterberging




Uitbreiding 800 m2 waterberging + natuurmaatregelen
Fogelsang De Westereen
ioV Gemeente Dantumadiel
Voorlopig ontwerp

Schaal: 1:600 op A3




WIJ MAKEN GROEN VOOR GENERATIES




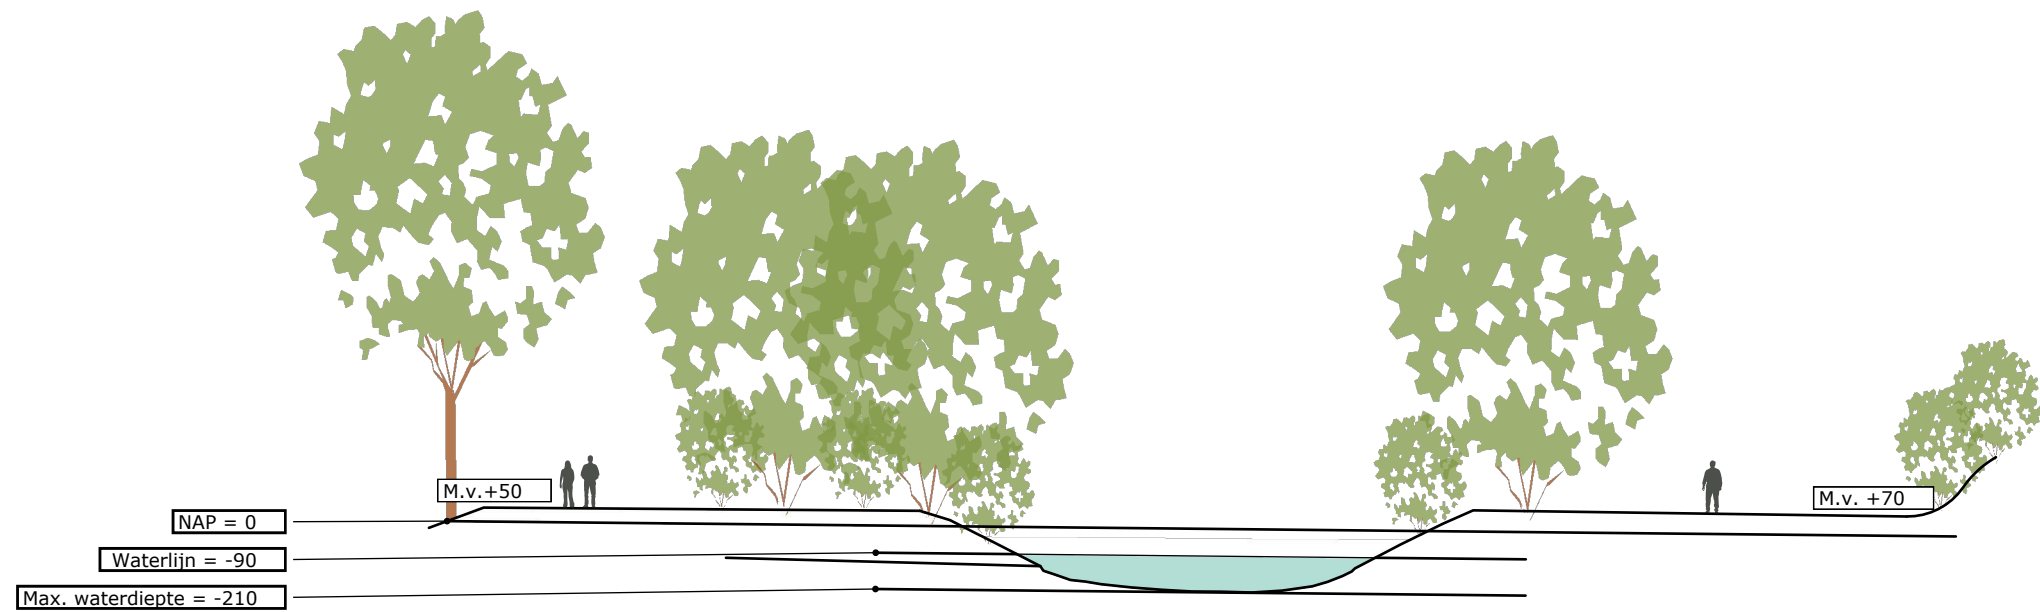

Dwarsprofiel 1

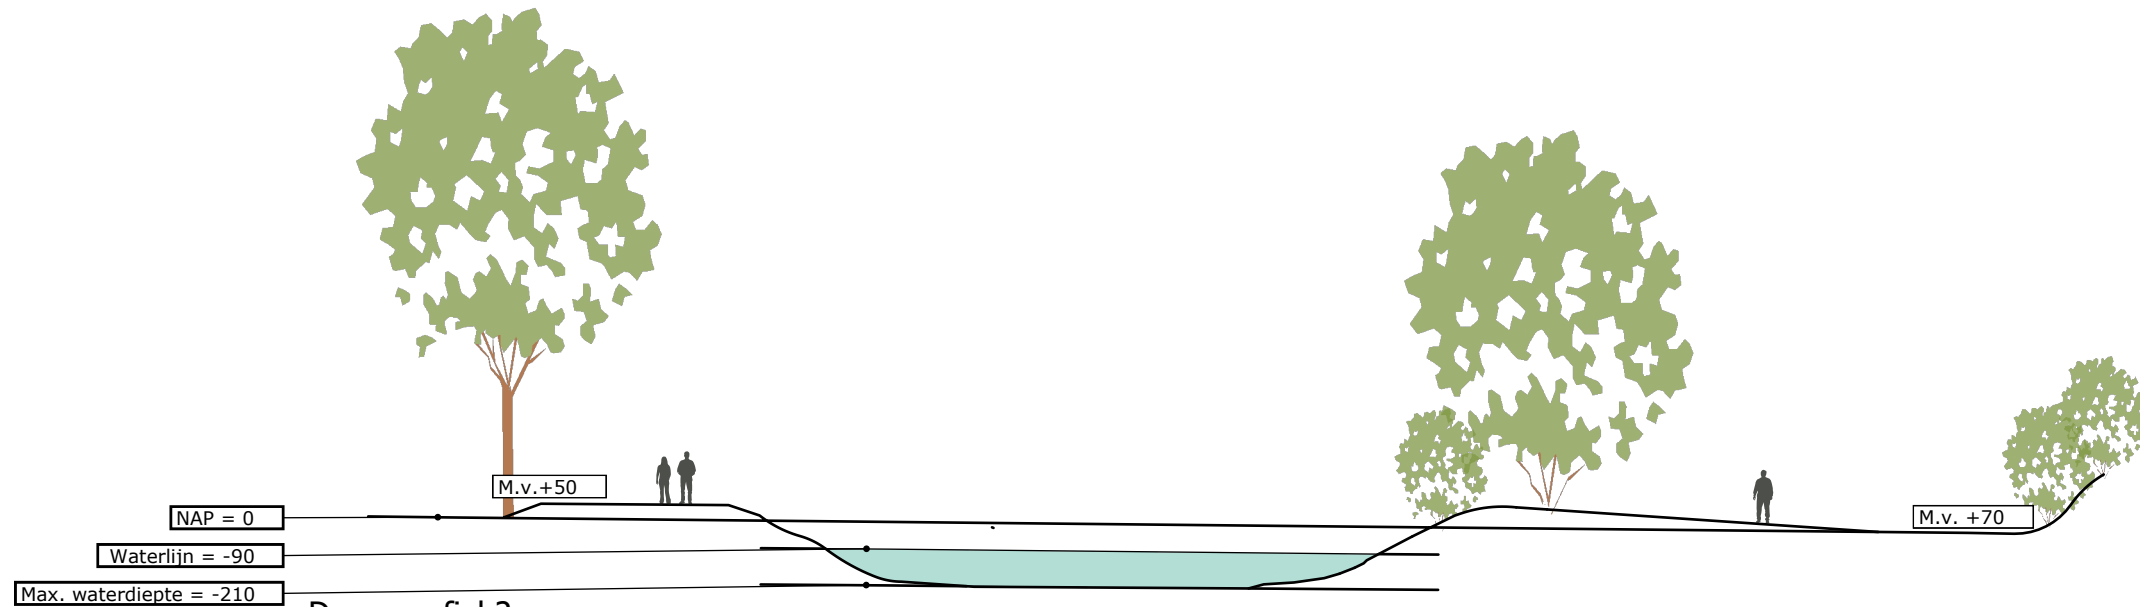

Dwarsprofiel 2

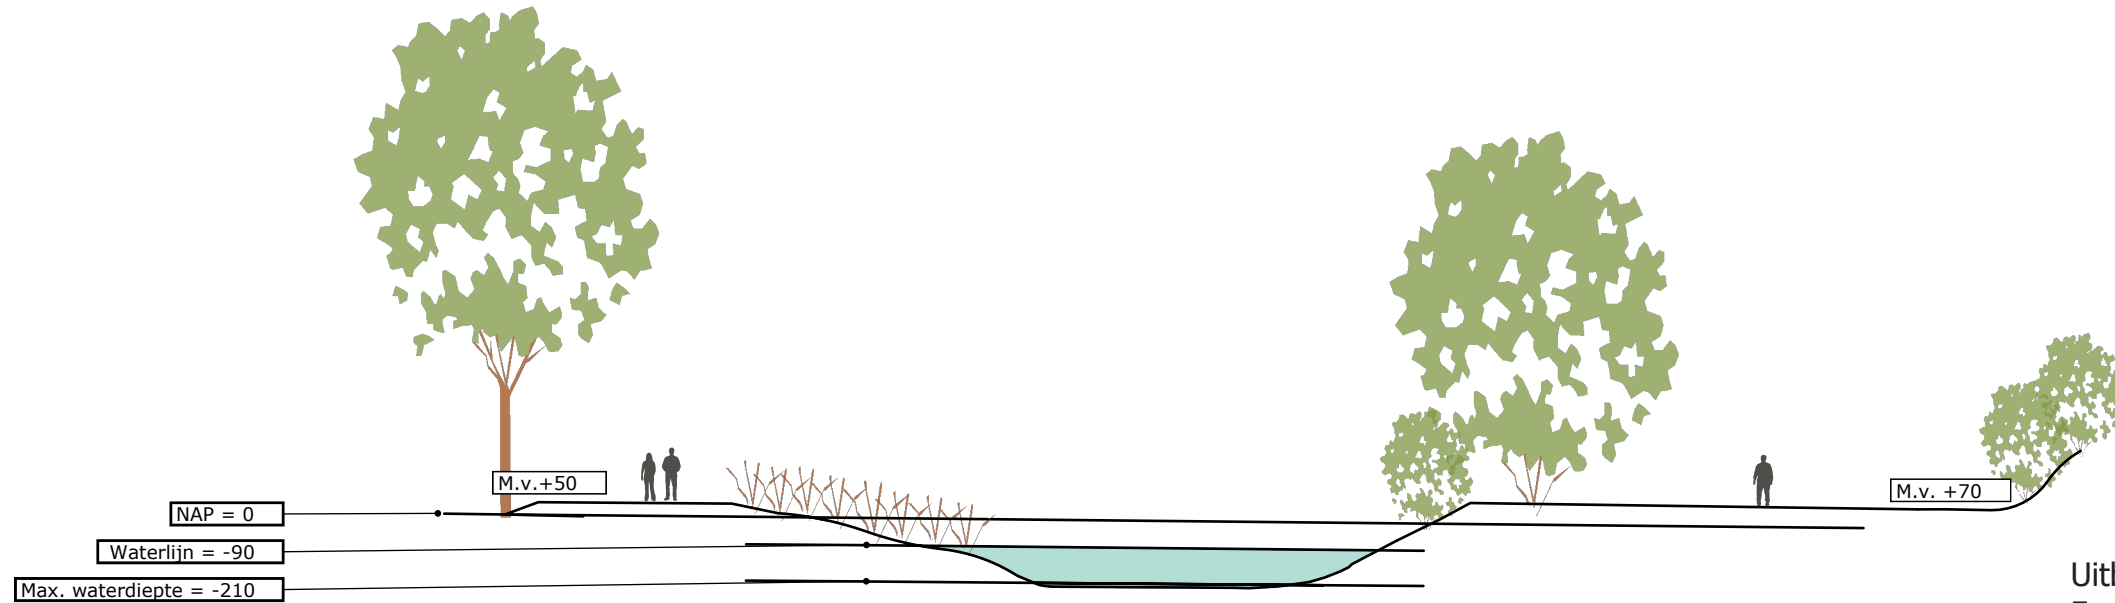

Dwarsprofiel 3

Uitbreiding 800 m² waterberging + natuurmaatregelen
Fogelsang De Westereen
iov Gemeente Dantumadiel
Voorlopig ontwerp

Maten in cm tov NAP
Schaal: 1:250 op A3



WIJ MAKEN GROEN VOOR GENERATIES

Datum: April 7, 2026

Impressie watercompensatie

Datum: April 7, 2026

LEGENDA

- | | | | | |
|---|-----------------------------|----|---|---------------------------------|
| 1 | tuinwal | 8 | bestaand water | |
| 2 | kruidenrijk gras | 9 | verbreding met smalle oever 1:2 | } 9+10=800m2 extra waterberging |
| 3 | maaipad ommetje | 10 | verbreding met natuurvriendelijke oever 1:4 | |
| 4 | blijvende brede houtsingel | 11 | schouwpad | |
| 5 | blijvende enkele houtsingel | 12 | bergbezinkbassin | |
| 6 | nieuwe houtsingel | 13 | uitzicht/recreatiepunt | |
| 7 | nieuwe houtsingel | 14 | duiker lange reed | |



Uitbreiding 800 m2 waterberging + natuurmaatregelen
Fogelsang De Westereen
ioy Gemeente Dantumadiel
Voorlopig ontwerp

Schaal: 1:600 op A3



WIJ MAKEN GROEN VOOR GENERATIES

Datum: April 7, 2026

LEGENDA

- | | | | | |
|---|--|----|---|---------------------------------|
| 1 | tuinwal | 8 | bestaand water | |
| 2 | kruidenrijk gras | 9 | verbreding met smalle oever 1:2 | } 9+10=800m2 extra waterberging |
| 3 | maaipad ommetje | 10 | verbreding met natuurvriendelijke oever 1:4 | |
| 4 | blijvende brede houtsingel | 11 | schouwpad | |
| 5 | blijvende enkele houtsingel → onderhoud! | 12 | bergbezinkbassin | |
| 6 | nieuwe houtsingel | 13 | uitzicht/recreatiepunt → overlast!! | |
| 7 | nieuwe houtsingel | 14 | duiker lange reed | |



Water in knipruimte
sinds BBS
oplossen in nieuwe situatie?

Uitbreiding 800 m2 waterberging + natuurmaatregelen
Fogelsang De Westereen
ioy Gemeente Dantumadiel
Voorlopig ontwerp

Schaal: 1:600 op A3



WIJ MAKEN GROEN VOOR GENERATIES

Datum: April 7, 2026

LEGENDA

- 1 tuinwal
- 2 kruidenrijk gras
- 3 maaipad ommetje
- 4 blijvende brede houtsingel
- 5 blijvende enkele houtsingel
- 6 nieuwe houtsingel
- 7 nieuwe houtsingel

- 8 bestaand water
 - 9 verbreding met smalle oever 1:2
 - 10 verbreding met natuurvriendelijke oever 1:4
 - 11 schouwpad
 - 12 bergbezinkbassin
 - 13 uitzicht/recreatiepunt
 - 14 duiker lange reed
- } 9+10=800m2 extra waterberging



Uitbreiding 800 m2 waterberging + natuurmaatregelen
 Fogelsang De Westereen
 iov Gemeente Dantumadiel
 Voorlopig ontwerp

Schaal: 1:600 op A3



WIJ MAKEN GROEN VOOR GENERATIES





Bewonersavond
Herinrichting groenstrook Lange Reed – Yndustrywei
De Westereen

14 april 2026

Agenda

- Welkom
- Projectgebied en opdracht
- Ecologische scan
- Natuurkansenscan
- Voorlopig ontwerp
- Natuurkansen en meerwaarde creëren
- Planning en vervolg
- Vragen
- Afsluiting

Projectgebied en opdracht

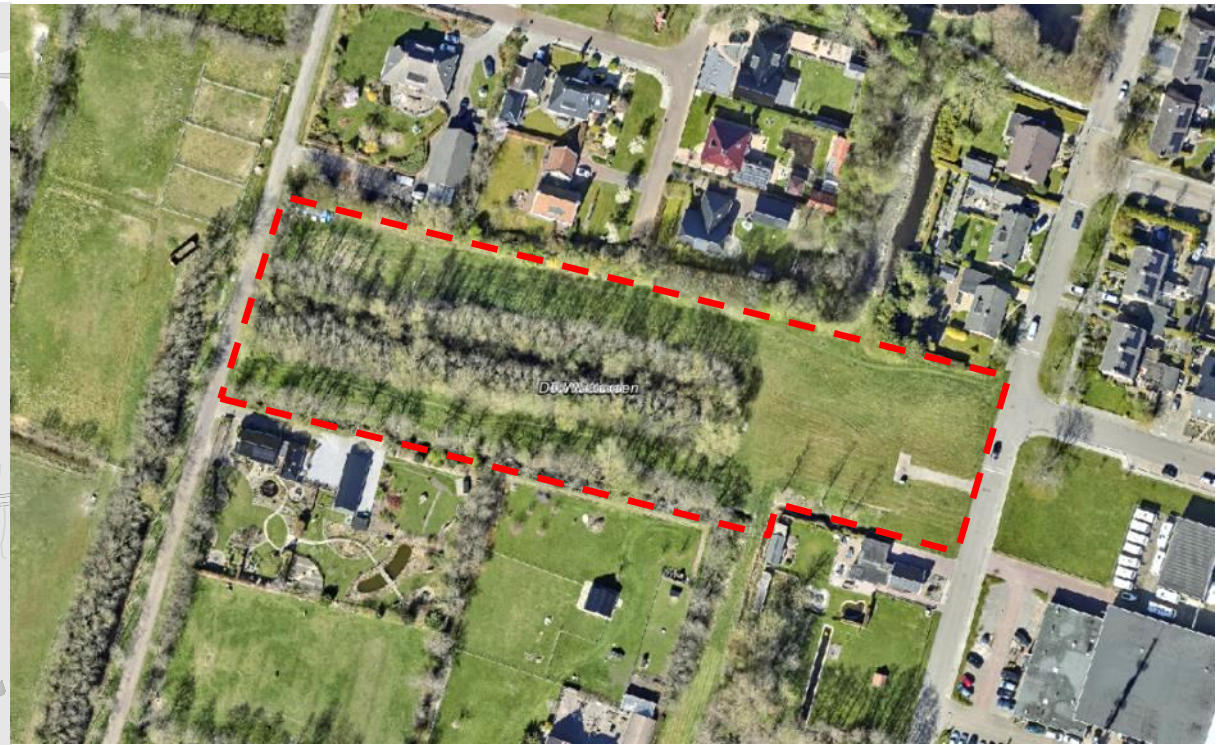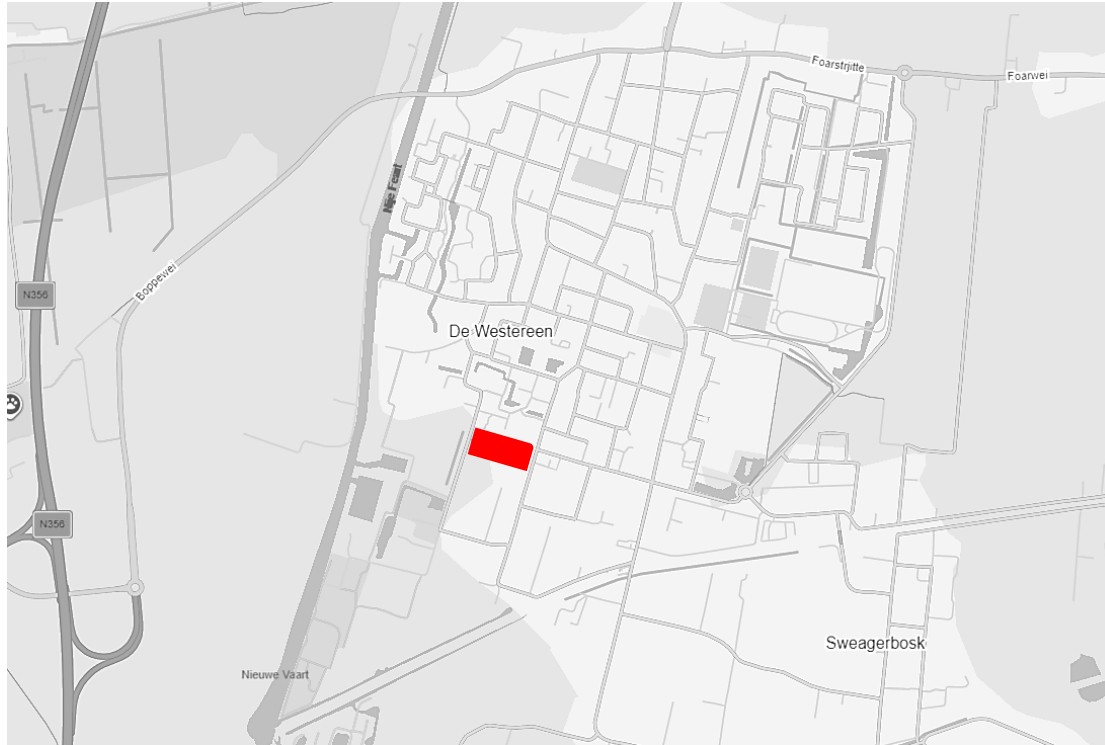

projectgebied

Projectgebied en opdracht



Bestaande houtwal

Projectgebied en opdracht



Bestaande watergang

Projectgebied en opdracht



-  Plangebied
-  Overstort bergbezinkbassin
-  Bestaande waterloop
-  Watercompensatie (800 m²)
-  Schouwpad


Ecologische scan



Geen holtes voor vleermuizen
Broedende vogels: kap buiten buiten broedseizoen
Rekening houden met overwinterende amfibieën in
sliblaag
Baggeren in vluchtrichting
Beperkt verlies van leefgebied kleine zoogdieren,
voldoende alternatief



Natuurkansenscan

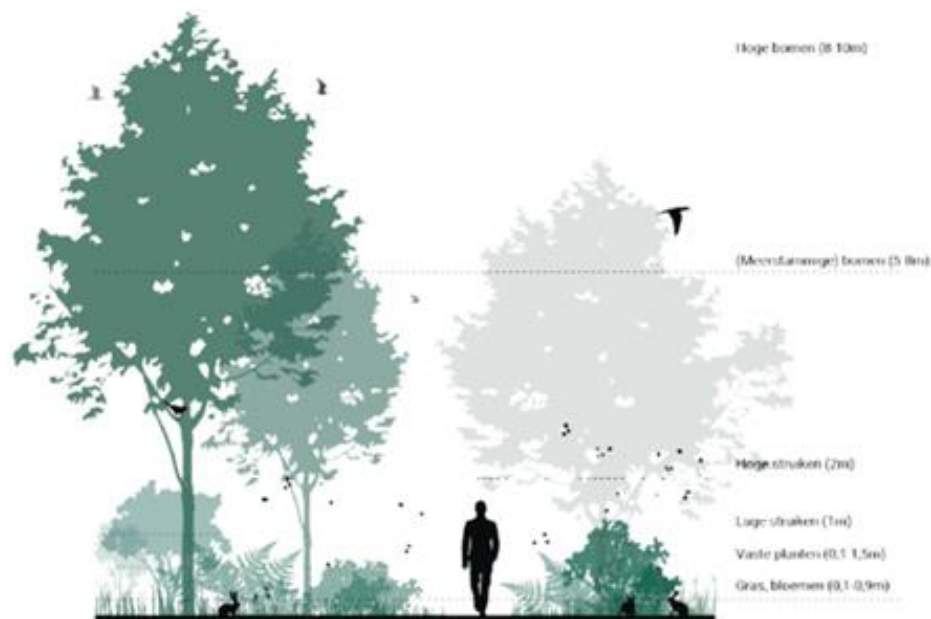

Gelaagdheid bevordert het aantal soorten,
afbeelding van DELVA Landscape Architecture / Urbanism






Voorlopig ontwerp




LEGENDA

- 1 tuinwal
 - 2 kruidenrijk gras
 - 3 maaipad ommetje
 - 4 blijvende brede houtsingel
 - 5 blijvende enkele houtsingel
 - 6 nieuwe houtsingel
 - 7 nieuwe houtsingel
 - 8 bestaand water
 - 9 verbreding met smalle oever 1:2
 - 10 verbreding met natuurvriendelijke oever
 - 11 schouwpad
 - 12 bergbezinkbassin
 - 13 uitzicht/recreatiepunt
 - 14 duiker lange reed
- } 9+10=800m² extra waterberging

Voorlopig ontwerp

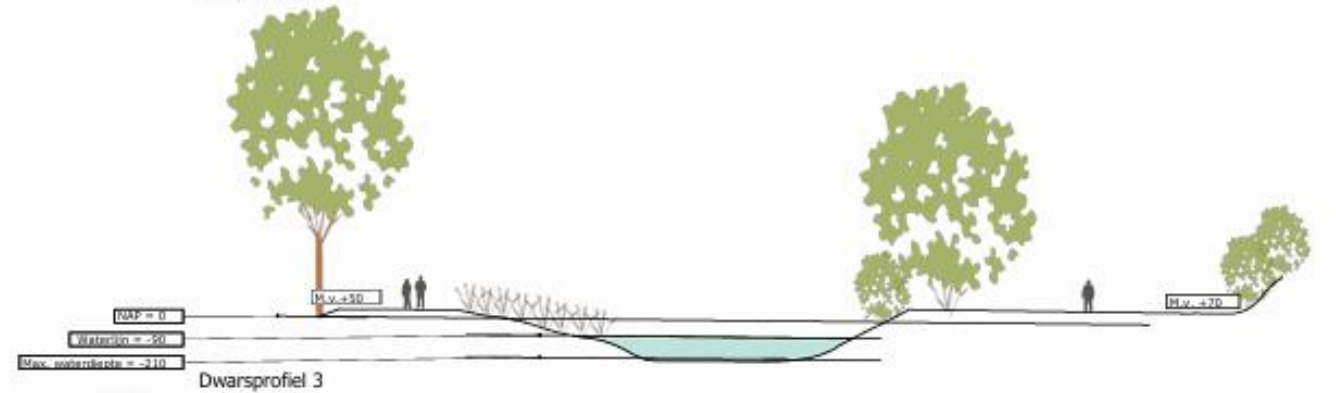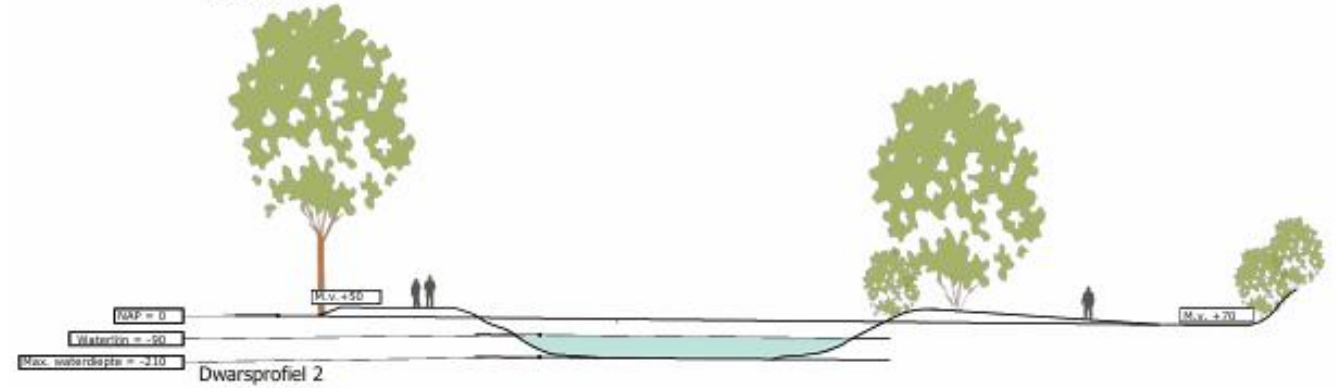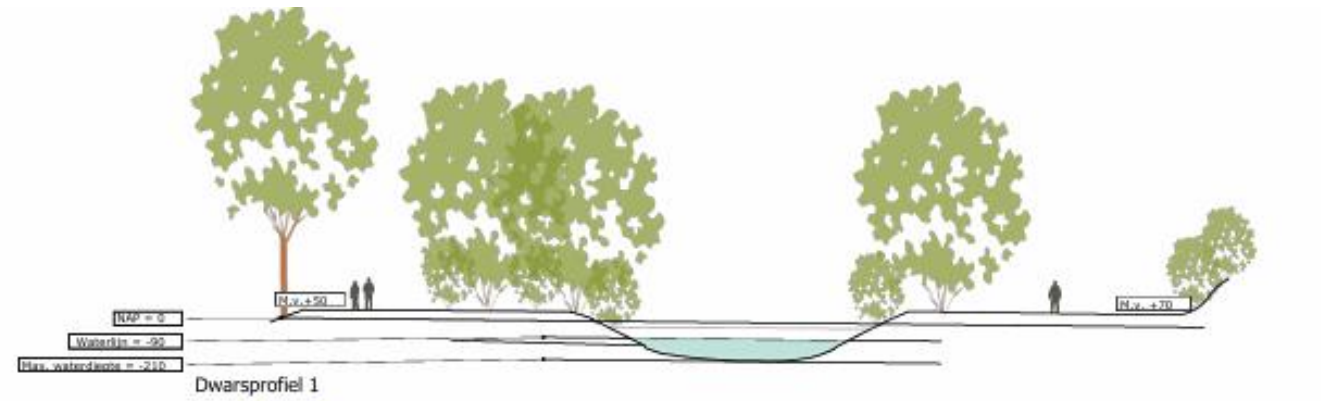

Natuurkansen elzensingels

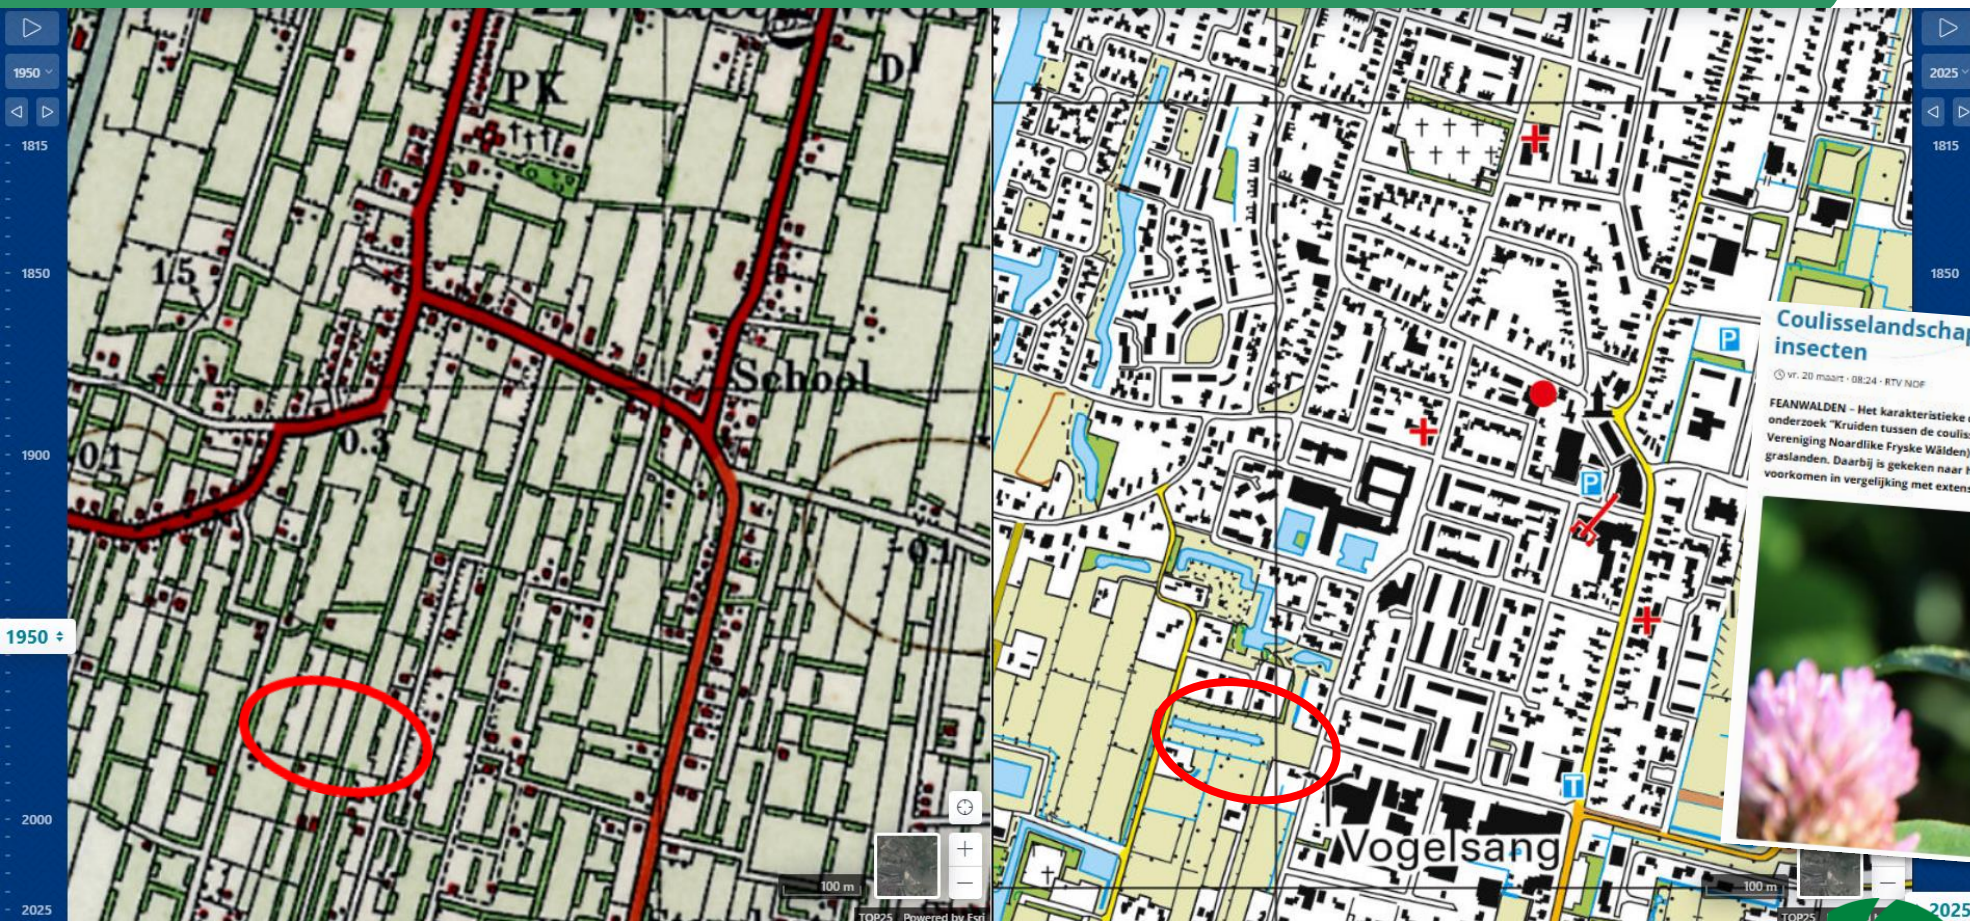


Coulisselandschap Noordlike Wâlden blijkt paradijs voor insecten

© W. 20 maart - 08:24 - RTV NOF

FEANWALDEN - Het karakteristieke coulisselandschap van de Noordlike Fryske Wâlden is een hotspot voor insecten. Het onderzoek "Kruiden tussen de coulissen" (uitgevoerd door Altenburg & Wymenga, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Vereniging Noordlike Fryske Wâlden) had als doel inzicht te krijgen in de relatie tussen landschapselementen en kruidenrijke graslanden. Daarbij is gekeken naar hoe insectenpopulaties in landschapselementen zoals boomwallen en graslanden voorkomen in vergelijking met extensief kruidenrijk, productief kruidenrijk en gangbaar beheerde graslanden.



Natuurkansen planten en dieren




Meerwaarde creëren

- Leefgebied in stand houden/vergroten



Natuurkansen water

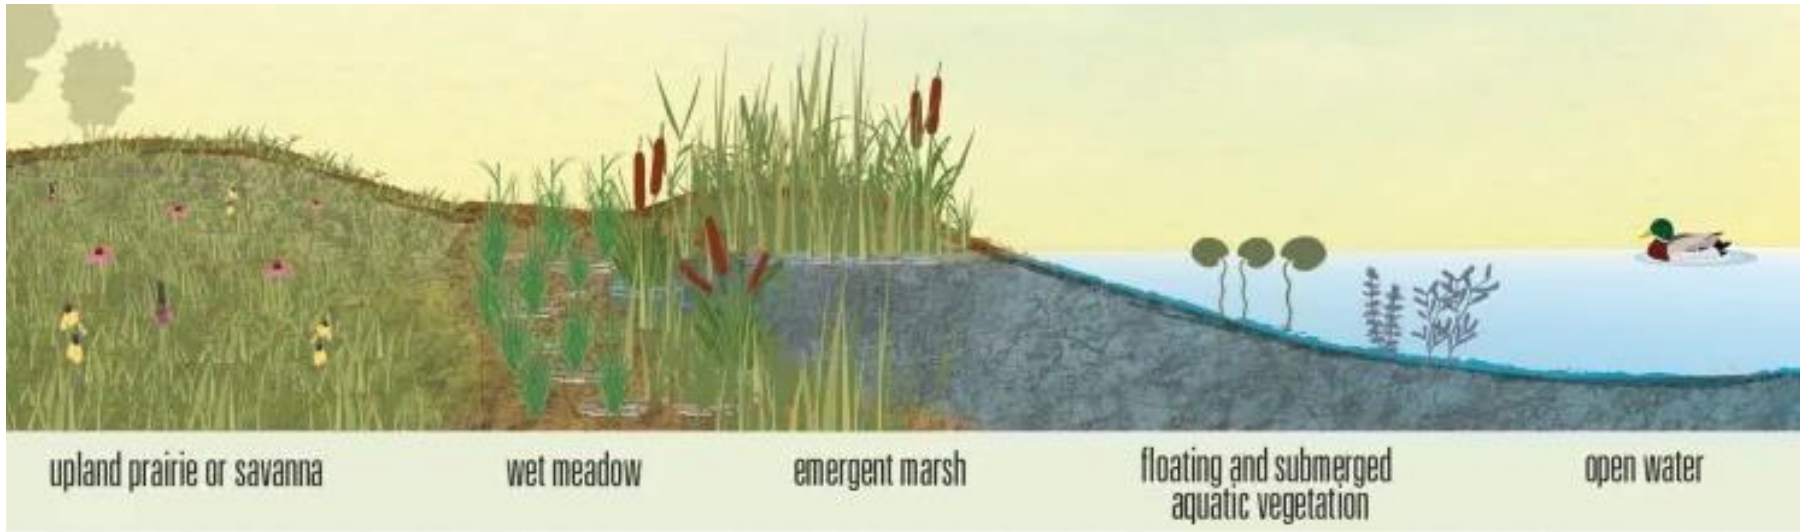

Water en oeverplanten

Schuilplaats

Nestplaats

Voedsel

In en uit water komen

Watervogels

Vissen

Amfibieën

Libellen



Meer zonlicht in water

Meerwaarde creëren

- Beleving
- Ontspanning
- Ommetje
- Klimaat



Planning en vervolg

April – mei '26

Uitwerken definitief ontwerp en uitvoeringstekeningen

Juni – juli '26

Aannemersselectie

September – november '26

Uitvoering

December '26

Oplevering

Vragen



LEGENDA

- 1 tuinwal
 - 2 kruidenrijk gras
 - 3 maaipad ommetje
 - 4 blijvende brede houtsingel
 - 5 blijvende enkele houtsingel
 - 6 nieuwe houtsingel
 - 7 nieuwe houtsingel
 - 8 bestaand water
 - 9 verbreding met smalle oever 1:2
 - 10 verbreding met natuurvriendelijke oever
 - 11 schouwpad
 - 12 bergbezinkbassin
 - 13 uitzicht/recreatiepunt
 - 14 duiker lange reed
- } 9+10=800m² extra waterberging

Afsluiting



Gearchiveerd: donderdag 2 juli 2026 11:11:28

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 9 juni 2026 16:07:06

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: DTM meting watercompensatie Vogelsang

Urgentie: Normal

Precisie: None

Hallo [REDACTED],

We hebben maandag 22 juni een meedenksessie met bewoners die zich aangemeld hebben voor een werkgroepje. Na deze bijeenkomst praat ik je graag bij. Met input van deze bijeenkomst kan vervolgens een natuurinclusief DO met raming opgesteld worden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Beleidsmedewerker Groen
Team Openbare Werken

✉ [REDACTED]@dantumadiel.frl

👤 werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



Hynstebloem 4, 9104 BR Damwâld
(0511) 71 70 00
(06) 398 27 903 | WhatsApp
info@dantumadiel.frl
www.dantumadiel.frl

Van: [REDACTED]@frisiagroep.nl>

Verzonden: dinsdag 2 juni 2026 16:12

Aan: [REDACTED]@dantumadiel.frl>

Onderwerp: Re: DTM meting watercompensatie Vogelsang

Hallo [REDACTED],

Ik was even benieuwd hoe de voortgang is.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Natuurtechnisch Adviseur

☎ 06 [REDACTED]



**GROEN-
SPECIALISTEN
SINDS 1696**



RANOX
natuuraannemer

Van: [redacted] <[\[redacted\]@dantumadiel.frl](mailto:[redacted]@dantumadiel.frl)>

Verzonden: donderdag 30 april 2026 14:46

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@frisiagroep.nl](mailto:[redacted]@frisiagroep.nl)>

Onderwerp: FW: DTM meting watercompensatie Vogelsang

Hallo [redacted],

Hierbij de DTM meting van het watercompensatie project. Zou je willen beoordelen of jullie hiermee een voldoende compleet beeld van de huidige situatie hebben?

Verder vooralsnog geen acties tot de werkgroep meedenk sessie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsmedewerker Groen
Team Openbare Werken



[redacted] <[\[redacted\]@dantumadiel.frl](mailto:[redacted]@dantumadiel.frl)>

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



Hynstebloem 4, 9104 BR Damwâld
(0511) 71 70 00
(06) 398 27 903 | WhatsApp
info@dantumadiel.frl
www.dantumadiel.frl

Van: [redacted] <[\[redacted\]@dantumadiel.frl](mailto:[redacted]@dantumadiel.frl)>

Verzonden: donderdag 30 april 2026 14:31

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@dantumadiel.frl](mailto:[redacted]@dantumadiel.frl)>

Onderwerp: FW: DTM meting watercompensatie Vogelsang

[redacted],

Bij deze de DTM meting. Kun je hiermee uit de voeten?

Met vriendelijke groet / met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker ontwerp en besteksvorming
Team Openbare Werken

✉ [redacted]@dantumadiel.frl

👤 werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend



Hynstebloem 4, 9104 BR Damwâld
(0511) 71 70 00
(06) 398 27 903 | WhatsApp
info@dantumadiel.frl
www.dantumadiel.frl

Van: [redacted]@wmr.nl>

Verzonden: donderdag 30 april 2026 14:25

Aan: [redacted]@dantumadiel.frl>

CC: [redacted]@wmr.nl>

Onderwerp: RE: DTM meting watercompensatie Vogelsang

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@wmr.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag,

Hierbij de tekeningen met meetgegevens waar dit mogelijk was.

De insteek van de watergang heb ik op een paar punten wel goed kunnen meten, de waterlijn is schetsmatig ingetekend a.d.v. een paar ingemeten punten. Het waterpeil is -0.86

Als er vragen zijn of extra metingen moeten worden gedaan dan hoor ik het wel.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Tekenaar / Landmeter | [redacted]@wmr.nl | 06 - [redacted]



Van: [redacted]@wmr.nl>
Verzonden: woensdag 29 april 2026 15:31
Aan: [redacted]@dantumadiel.fr!>
CC: [redacted]@wmr.nl>
Onderwerp: RE: DTM meting watercompensatie Vogelsang

Hallo [redacted],

[redacted] heeft dit gisteren ingemeten.
Hij zal je de gegevens wel sturen zodra verwerkt.
Indien er daar vragen over zijn kun je het beste [redacted] ff bellen: 06-[redacted]

[redacted]
Projectleider | [redacted]@wmr.nl | 06-[redacted]



Van: [redacted]@dantumadiel.fr!>
Verzonden: donderdag 23 april 2026 13:00
Aan: [redacted]@wmr.nl>
Onderwerp: DTM meting watercompensatie Vogelsang

Midje [redacted],

Zoals zojuist besproken zouden wij graag een dtm meting ontvangen van het rood gearceerde gebied. Betreft een meting om de terreinhoogte te bepalen. De insteek rondom de bestaande waterpartij zit vrij dicht in de begroeiing. De insteek graag inmeten waar mogelijk.

Ik hoor graag wanneer je dit voor ons kunt uitvoeren.

Mochten er vragen zijn hoor ik het wel!

Met vriendelijke groetnis / met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker ontwerp en besteksvorming
Team Openbare Werken

✉ [redacted]@dantumadiel.fr
👤 werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend



Hynstebloem 4, 9104 BR Damwâld
(0511) 71 70 00
(06) 398 27 903 | WhatsApp
info@dantumadiel.frl
www.dantumadiel.frl





Lange Reed

Lange Reed

reed Dwarsreed Dwa

Fogelsang Fogelsang

Yndu

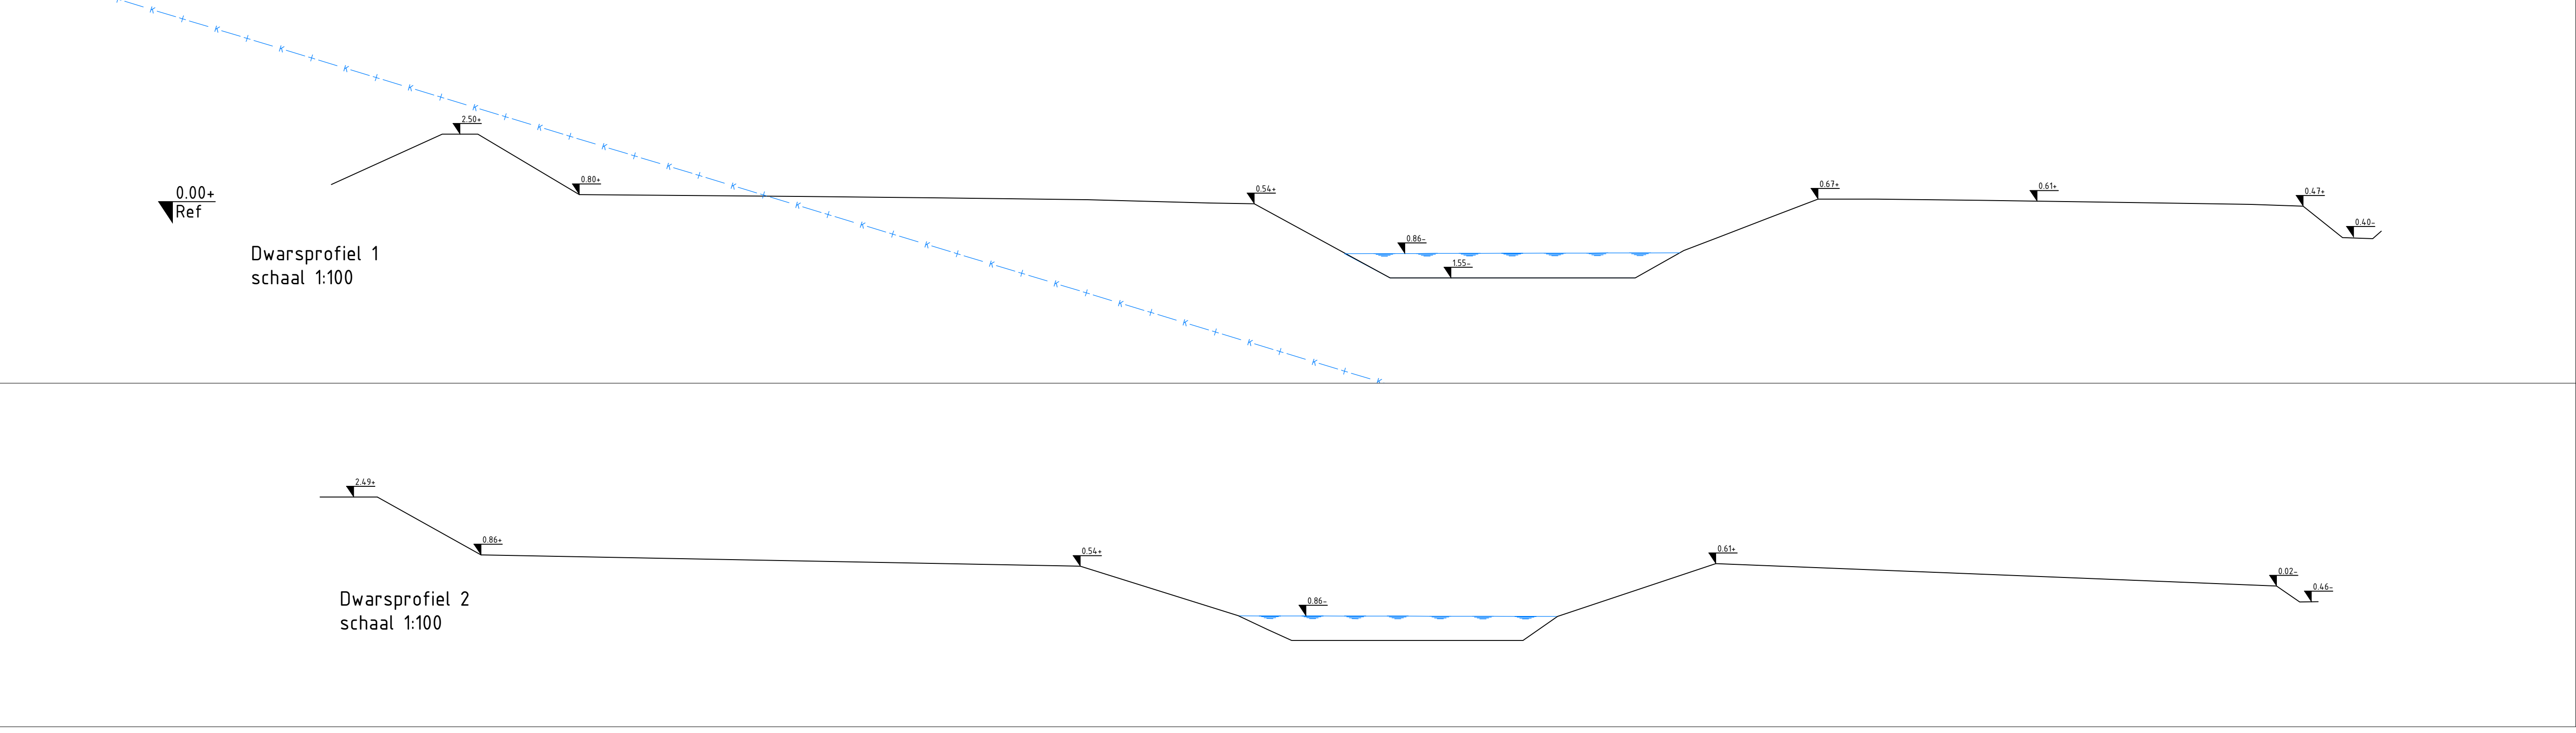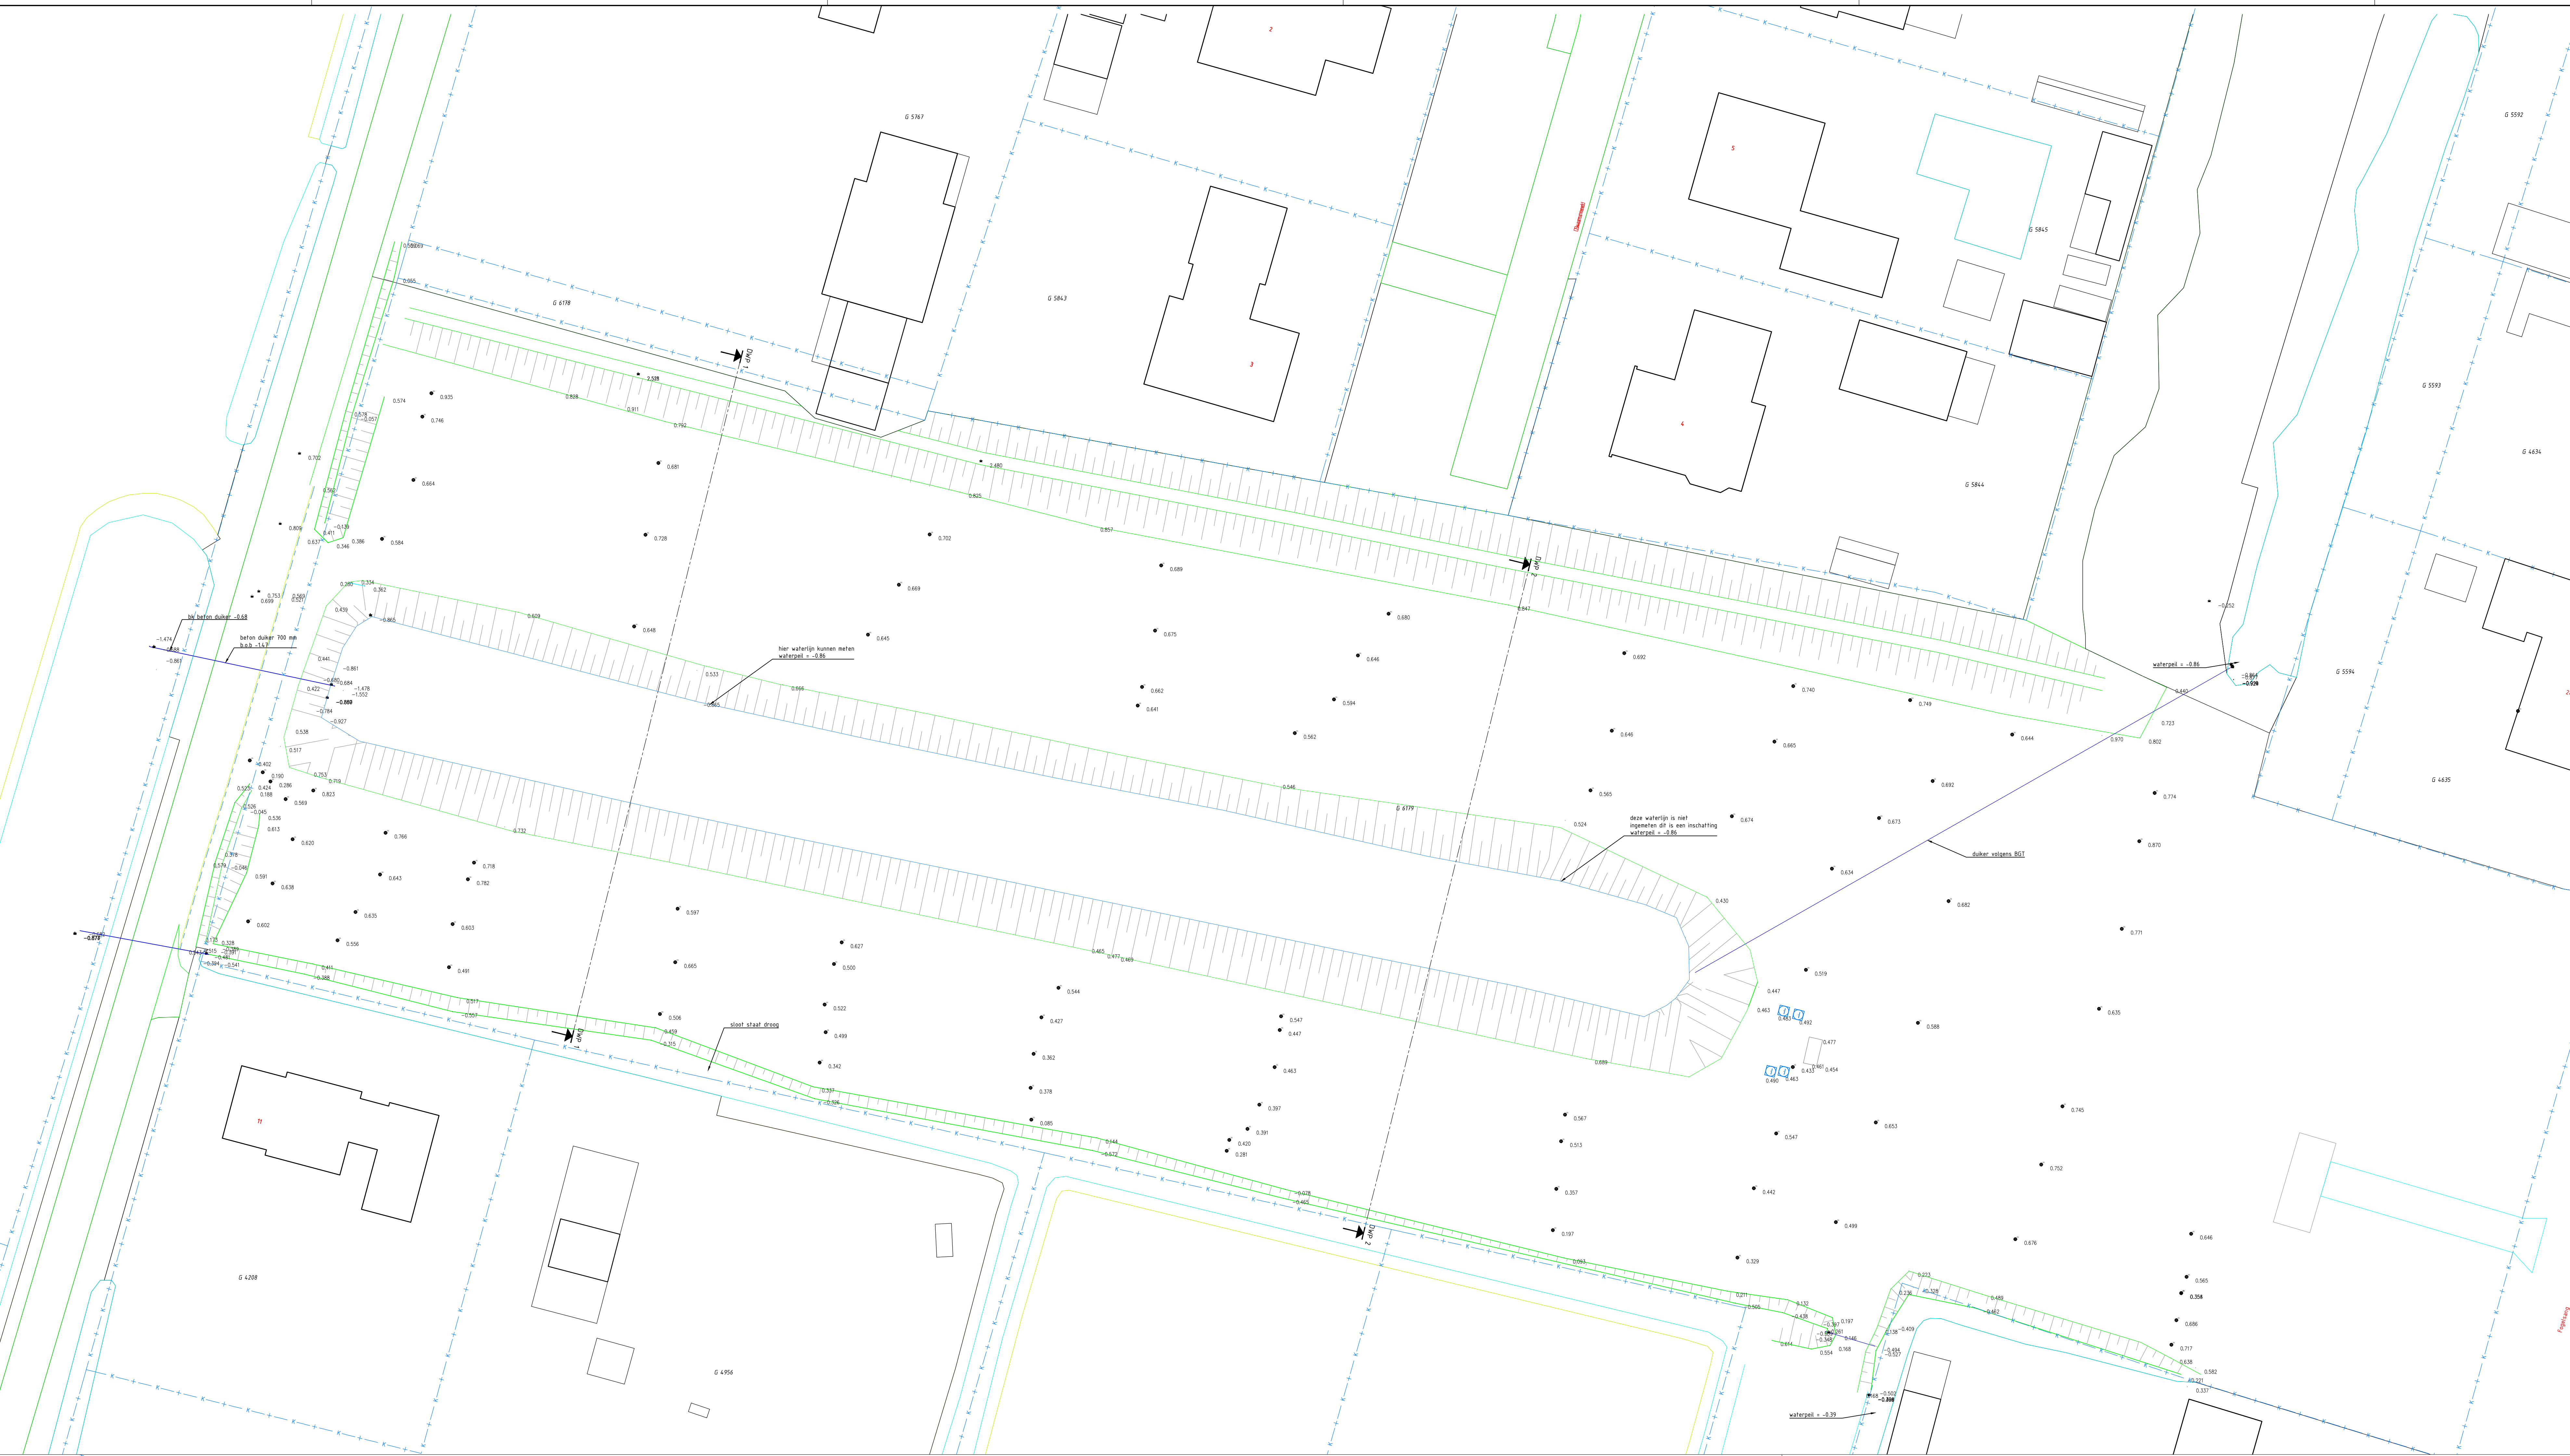

Legenda		
Geometrie	Omschrijving	Status
	Cultuurbeplanting besplantsoen	Bestaand
	Gras	Bestaand
	Houtwal	Bestaand
	Talud	Bestaand
	Bodem watergang	Bestaand
	Insteek watergang	Bestaand
	Waterlijn	Bestaand
	Kadastrale grens	Bestaand
	Duiker	Bestaand
	Beboewing	Bestaand
	Lufel	Bestaand
	Schuur	Bestaand
	Water	Bestaand
	Weg	Bestaand
	Overstortput beton	Bestaand
	Opsluitband 100x200 mm	Bestaand
	Onverhard	Bestaand
	Open verharding	Bestaand
Symbol	Omschrijving	Status
	Inspectieput	Bestaand
	Grondslag meting t.a.v. NAP	Bestaand

Project:
DTM meting watercompensatie Vogelsang

Opdrachtgever:
Gemeente Danfumadiel

Omschrijving:
DTM meting

Formaat: A0	Schaal: 1:100	Plan:	Project nummer: 30-L-2015	Leiding nummer:
Opn.:	Bevrijd:	Uitgave:	Datum:	Tekening:

WMR
WMR Rinsumageest b.v.

- Grond-Weg en Waterbouw
- Maatschappij
- Grond-Weg en Waterbouw
- Maatschappij

Van Apeldoorn 40 9100 KT Rinsumageest
T 0511 420000 E info@wmr.nl
